

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ชื่อลรายงาน ณ	30 กันยายน 2557
---------	---	---------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	โครงการพัฒนาจุดจับ-กุดหมากเห็บ บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง
------------------------------	--	--

ลักษณะโครงการ	ขุดลอกหนองน้ำ ทำนบดินหัวงานพร้อมขุดลอก อาคารรับน้ำ ท่อระบายน้ำ อาคารรับน้ำท่อสี่เหลี่ยม ขนาด 2.00*2.00 ม. ท่อรับน้ำและระบายน้ำ Ø 1.00 ม. และอาคารประกอบ
---------------	---


งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	ประเภทงาน
งบปกติ เหลื่อมปี <input type="checkbox"/> เหลื่อมปี <input type="checkbox"/>	ปี 2554			เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	งานจ้างเหมา งานจ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง
	-จ้างเหมา	32,880,000	33,221,000		
	ปี 2555		65,596,800		
	-จ้างเหมา	64,444,800	64,444,800		
	-ดำเนินการเอง		1,152,000		
	ปี 2556				
	- จ้างเหมา	67,075,200	67,075,200		
-ดำเนินการเอง		896,000			
รวม	164,400,000	164,741,000			

ความก้าวหน้าในการจัดหา <input type="checkbox"/> (ใบเบิกชื่อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง	2 ต.ค. 51	อนุมัติเงินงวด	3 พ.ย. 54
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	24-มี.ค.-54
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	4 พ.ค. 54
	อนุมัติประมาณการ	14 ต.ค. 53	ครบอายุสัญญา	22 พ. ค. 56
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		อายุสัญญา	750
	ประกาศ TOR		สัญญาเลขที่	กจ.6/2554(พสท.1)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	21 ต.ค. 52	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	3 มี.ค. 54	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		

เปรียบเทียบแผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	100.00%	(ปี 2557) แผน	100.00%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	100.00%	(ปี 2557) ผล	100.00%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
						- จ้างเหมา(กันเหลื่อมปี)	10,063,397.25
					- ดำเนินการเอง	896,000.00	894,710.90
					รวม (บาท)	10,959,397.25	9,715,791.46
					คิดเป็น (%)	100.00	88.65

ขั้นตอนการแก้ไขแบบ ผส.ขป.6 ได้อนุมัติแบบแล้วเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2556 และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างขอใช้มติ ครม. ต่อเวลาไปอีก 180 วัน และผู้รับจ้างขอหยุดการปฏิบัติงาน เนื่องจากรอการ แก้ไขสัญญาตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2556 ปัจจุบันกรมฯ ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาแล้ว และได้ลงนามในสัญญาเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และส่งงานทั้งสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2557

มีการประชุมเร่งรัดและติดตามการทำงานของผู้รับจ้างโดยตลอด และผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามแผนที่มีการประชุมเร่งรัด



สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2557
---------	---	----------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ บ้านหนองสีหนาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง
------------------------------	--	--

ลักษณะโครงการ	สถานีสูบน้ำ อัตราการสูบ 0.30 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 70 เมตร. จำนวน 4 เครื่อง ท่อเหล็กส่งน้ำ Ø 0.80 ม. ความยาว 7,774 ม. และอาคารประ...
---------------	---


งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	ประเภทงาน
งบปกติ เหลื่อมปี เหลื่อมปี เหลื่อมปี รวม	ปี 2554			-	งานจ้างเหมา งานจ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง
	-จ้างเหมา	6,240,400	7,810,067		
	ปี 2555				
	-จ้างเหมา	57,305,900	57,305,900		
	-ดำเนินการเอง	434,000	434,000		
	ปี 2556				
	- จ้างเหมา	31,010,800	31,010,800		
	-ดำเนินการเอง	355,000	355,000		
	ปี 2557				
	- จ้างเหมา	80,742,900	80,742,900		
	-ดำเนินการเอง	369,670	2,422,300		
	รวม	176,458,670	180,080,967		

ความก้าวหน้า ในการจัดหา (ใบเบิก ชื่อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง	17 ธ.ค. 52	อนุมัติเงินงวด	15 พ.ย.54
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 55
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	กิจการร่วมค้า ทีแอนด์ซีเน็ค คอนสตรัคชั่น
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	1 ก.พ. 55
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	21 พ.ค. 57
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	5 ส.ค. 52	อายุสัญญา	840
	ประกาศ TOR	3 มิ.ย. 54	สัญญาเลขที่	กจ.5/2555(พสก.1)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	7 มิ.ย. 54	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	8 ธ.ค. 54	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		

เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	80.350%	(ปี 2557) แผน	80.350%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	65.525%	(ปี 2557) ผล	65.525%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
					- จ้างเหมา	80,742,900.00	21,916,808.27
					- ดำเนินการเอง	2,422,300.00	2,374,218.66
					รวม (บาท)	83,165,200.00	24,291,026.93
					คิดเป็น (%)	100.00	29.208

มีความล่าช้าเนื่องจากฐานราคของโรงสูบน้ำพบชั้นดินอ่อนต้องทดสอบการรับน้ำหนักของดินฐานราก และได้ดำเนินการแก้ไขแบบโดยส่วนวิศวกรรม สขป.6 แล้ว และต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดที่ตั้งบ่อกระจายน้ำ เนื่องจากปัญหาที่ดินต้องมีการแก้ไขแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการและผู้รับจ้างขอหยุดการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เพื่อรอการแก้ไขสัญญาปัจจุบันกรมอนุมัติแก้ไขแบบแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 57

แผนการแก้ไขปัญหา
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแก้ไขแบบให้แล้วเสร็จเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการแก้ไขสัญญา



สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2557
----------------	---	-----------------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	ฝายบ้านใหม่สำราญ บ้านโนนกะบาก ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดเล็ก
-------------------------------------	--	--

ลักษณะโครงการ	- ประเภทฝายและท่อลอดถนน สันฝายยาว 40.00 เมตร สูง 3.50 เมตร จำนวน 2 แห่ง - ขุดดินลอกลำห้วยกันกว้างสุด 4.00 เมตร ยาว 3,187.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร พร้อมคันดินโอบสองข้าง
----------------------	---


งบประมาณ	งบประมาณ		อนุมัติงวด	ประเภทงาน
	ปี 2556	ตาม ปมก.		
งบปกติ	- จ้างเหมา	-	-	งานจ้างเหมา
	- ดำเนินการเอง	25,000,000	20,105,000	งานจ้างเหมาบางส่วน
เหลือปี				งานดำเนินการเอง
รวม		25,000,000	20,105,000	

ความก้าวหน้าการ จัดทำ (ใบเบิกซื้อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	27-ธ.ค.-55
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	25-ม.ค.-56
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย
	ส่งประมาณการ	24 ก.ค. 55	เริ่มอายุสัญญา	1 ก.พ. 56
	อนุมัติประมาณการ	6-ส.ค.-55	ครบอายุสัญญา	10 มิ.ย. 56
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ค. 55	อายุสัญญา	129 วัน
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	สกก.6 (ช.) 01/2556
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	19 ธ.ค. 55	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	28-ธ.ค.-56	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		

เปอร์เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม	100.00	%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		
	ผลงานสะสม	100.00	%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
				- จ้างเหมา	-	
				- ดำเนินการเอง	85,754.82	85,628.25
			รวม (บาท)	85,754.82	85,628.25	
			คิดเป็น (%)	100.00	99.85	

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า มีฝนตกหนักในพื้นที่ก่อสร้างทำให้การขนส่งวัสดุเป็นไปด้วยความลำบากทำให้งานก่อสร้างล่าช้าทำให้งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2556 เงินกันเหลือปี จำนวน 85,754.82 บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายหมดแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนส่งมอบโครงการให้กับองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น

แผนการแก้ไขปัญหา	
-------------------------	--

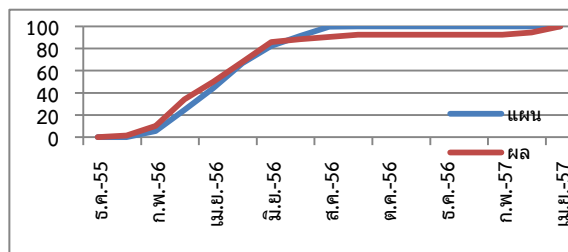

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2557
----------------	---	-----------------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	ส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ชลประทานขนาดกลาง
-------------------------------------	--	---	------------------

ลักษณะโครงการ	อาคารสำนักงาน ขนาด 6.00*20.00 ม. ถนนเข้าห้วยงาน อาคารโรงจอร์รถ อาคารบ้านพักชั่วคราว ระดับ 1-2 อาคารป้อมยาม
----------------------	--


งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2557				
	-จ้างเหมา	-	-	งานจ้างเหมาบางส่วน	
เหลือในปี	-ดำเนินการเอง	16,700,000.00	16,078,000.00	งานดำเนินการเอง	
	-ค่าควบคุมงาน	-	-		
		-	-		
	รวม	16,700,000.00	16,078,000.00		

ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกชื่อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	7-พ.ย.-56
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	21-ก.พ.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท ไทย พิพม์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
	ส่งประมาณการ	15-ส.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	22-ก.พ.-57
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	21-มิ.ย.-57
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	13-พ.ย.-56	อายุสัญญา	120
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	สกก.6 (ช.) 03/2557
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	8-ม.ค.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	10-ก.พ.-57	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		


เปอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	100.00%	(ปี 2557) แผน	100.00%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	100.00%	(ปี 2557) ผล	100.00%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
- ผลงาน					- จ้างเหมา	-	-
- เบิกจ่าย					- ดำเนินการเอง	16,078,000.00	16,044,174.92
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม (บาท)	16,078,000.00	16,044,174.92
					คิดเป็น (%)	100%	99.790%

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	ไม่มีอุปสรรคในการทำงานแล้วเสร็จทันปีงบประมาณ 2557
-------------------------------------	---

แผนการแก้ไขปัญหา	
-------------------------	--

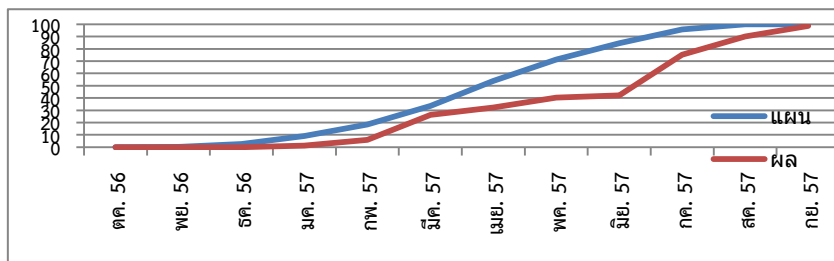


สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2557		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง		
ลักษณะโครงการ	สถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำชนิดหยดไฮดรอลิก Q = 0.40 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 100 เมตร จำนวน 5 เครื่อง Q = 0.30 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 25 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ระบบส่งน้ำสาย MP1 ท่อเหล็กเหนียว Ø 1,000 มม. กม.0+000 ถึง 0+400 Ø 800 มม. กม.0+400 ถึง 10+945สาย MP2 ท่อเหล็กเหนียว Ø 500 มม. กม. 0+000 ถึง 3+000 1R-MP2 ท่อ AC Ø 500 มม. กม. 0+000 ถึง 1+800 2R-MP2ท่อ AC Ø 500 มม. กม. 0+000 ถึง 1+190 และอาคารประกอบ						
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	ตาม พรบ.	อนุมัติงวด	ประเภทงาน		
งบปกติ เหลือมอบ	ปี 2556				เงินงวด - เบิกที่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	งานจ้างเหมา งานจ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
	- จ้างเหมา	72,100,000	72,100,000	72,100,000			
	- ดำเนินการเอง	1,176,000		2,163,000			
	ปี 2557						
	- จ้างเหมา	96,154,800	96,154,800	198,197,598			
	- ดำเนินการเอง	2,353,000		3,672,500			
	ปี 2558						
	- จ้างเหมา	192,245,200	192,245,200	-			
	- ดำเนินการเอง	2,290,000		-			
	รวม	366,319,000	360,500,000	276,133,098			
ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง		17-ธ.ค.-52	อนุมัติเงินงวด	21-พ.ค.-56		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	14-มิ.ย.-56		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด		
	ส่งประมาณการ		20-ธ.ค.-55	เริ่มอายุสัญญา	2-ก.ค.-56		
	อนุมัติประมาณการ		14 ม.ค. 56	ครบอายุสัญญา	19-ต.ค.-58		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		20-ธ.ค.-55	อายุสัญญา	840 วัน		
	ประกาศ TOR		17 ม.ค. 56	สัญญาเลขที่	กจ.11/2556 (กสพ.)		
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง		24-ม.ค.-56	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-		
	อนุมัติรับราคา		-	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-		
	ส่งผลจัดจ้าง		-				
เปอร์เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม	35.873%	(ปี 2557) แผน	94.740%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		
	ผลงานสะสม	87.250%	(ปี 2557) ผล	100.000%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
					- จ้างเหมา	198,197,598.00	198,197,598.00
					- ดำเนินการเอง	3,672,500.00	3,652,964.45
					รวม (บาท)	201,870,098.00	201,850,562.45
					คิดเป็น (%)	100.00	99.99
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	ฝนตกหนักทำให้เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างมากในช่วงเดือนสิงหาคม						
แผนการแก้ไขปัญหา	ผู้รับจ้างทำงานเร็วกว่าแผนต้องของงบประมาณมาเพิ่มเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง						



สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2557																		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาคำ ระยะที่1 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านหนองนาคำ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ชลประทานขนาดกลาง																		
ลักษณะโครงการ	ระบบส่งน้ำสาย MP (ท่อ AC) Ø 600 มม. กม.0+000 ถึง 1+625 พร้อมอาคารประกอบ งานขุดโค้ง จำนวน 5 แห่ง , อาคารจ่ายน้ำเข้านา ขนาด Ø 100 มม. จำนวน 2 แห่ง , อาคารระบายตะกอน จำนวน 1 แห่ง และ อาคารท่อลอดถนน จำนวน 1 แห่ง																				
งบประมาณ	<table border="1"> <tr> <th>งบประมาณ</th> <th>ตาม ปมก.</th> <th>อนุมัติงวด</th> </tr> <tr> <td>ปี 2556</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- จ้างเหมา</td> <td>7,496,800</td> <td>7,496,800</td> </tr> <tr> <td>- ดำเนินการเอง</td> <td>10,698,664</td> <td>10,698,664</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>18,195,464</td> <td>18,195,464</td> </tr> </table>	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	ปี 2556			- จ้างเหมา	7,496,800	7,496,800	- ดำเนินการเอง	10,698,664	10,698,664				รวม	18,195,464	18,195,464	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	ประเภทงาน
งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด																			
ปี 2556																					
- จ้างเหมา	7,496,800	7,496,800																			
- ดำเนินการเอง	10,698,664	10,698,664																			
รวม	18,195,464	18,195,464																			
งบ กปร.				งานจ้างเหมา																	
เหลือในปี				งานจ้างเหมาบางส่วน																	
				งานดำเนินการเอง																	
ความก้าวหน้า	วันประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	26-ต.ค.-56																	
บริหารจัดการ	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	30-ก.ย.-56																	
(ใบเบิก	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บ.พรอสเพอริโซลูชั่น จำกัด																	
ซื้อหรือจ้าง	ส่งประมาณการ	22-ส.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	15-ม.ค.-57																	
วงสูงสุด)	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	14-พ.ค.-57																	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	12 ก.ย. 56	อายุสัญญา	120																	
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-																	
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	18 ก.ย. 56	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-																	
	อนุมัติรับราคา	25-ก.ย.-56	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-																	
	ส่งผลจัดจ้าง	-																			
เปอร์เซ็นต์	แผนงานสะสม	100.00	%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557																	
แผน/ผล	ผลงาน สะสม	100.00	%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS															
- ผลงาน				- จ้างเหมา	7,436,361.33	7,436,361.33															
- เบิกจ่าย				- ดำเนินการเอง	10,698,664.00	10,698,663.92															
- กราฟผลงาน (สะสม)				รวม (บาท)	18,135,025.33	18,135,025.25															
				คิดเป็น (%)	100.00	100.00															
สภาพปัญหา																					
และสาเหตุ																					
ความล่าช้า																					
แผนการ																					
แก้ไขปัญหา																					

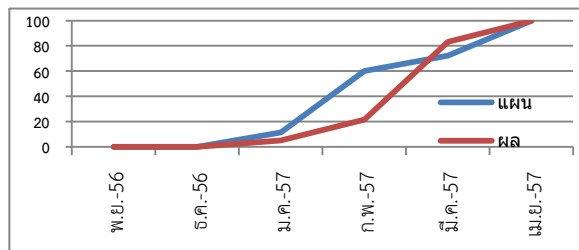

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2557
----------------	---	-----------------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	ผลผลิตที่ 4 : ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ชลประทานขนาดกลาง
-------------------------------------	--	--

ลักษณะโครงการ	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำหินลับมีดและอ่างหนองกุดโดนพร้อมคันดินโอบ ท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำหินลับมีด - หนองกุดโดน โดยใช้ท่อ AC Ø 0.60 ม. ความยาว 3,945 เมตร
----------------------	--


งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2557				
เหลือปี	-จ้างเหมา	-	-		งานจ้างเหมาบางส่วน
	-ดำเนินการเอง	39,996,200.00	39,356,200.00		งานดำเนินการเอง
	-ค่าควบคุมงาน	-	-		
	รวม	39,996,200.00	39,356,200.00		

ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	5-พ.ย.-56
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ลงนามในสัญญา	21-ก.พ.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย
	ส่งประมาณการ	9-ส.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	22-ก.พ.-57
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	22-เม.ย.-57
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	13-พ.ย.-56	อายุสัญญา	60
	ประกาศ TOR		สัญญาเลขที่	สกก.6 (ช.) 02/2557
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	8-ม.ค.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	11-ก.พ.-57	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง			

เปอร์เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	99.760%	(ปี 2557) แผน	99.76%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	90.000%	(ปี 2557) ผล	90.00%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	39,356,200.00	39,047,931.45
					รวม (บาท)	39,356,200.00	39,047,931.45
					คิดเป็น (%)	100%	99.22%

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	ผลงานช้ากว่าแผนเนื่องจากงานชุดลอกของฝายเครื่องจักรกล เจอชั้นดินแข็งทำให้งานมีความล่าช้า ส่วนงานก่อสร้างอาคารขณะเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว และมีการแก้ไขแบบเพิ่มระดับคันดินให้สูงขึ้น เพื่อเก็บกักน้ำให้มากขึ้น
-------------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	จัดทำงบประมาณฉบับ Revise และจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างงานในส่วนที่แก้ไขแบบ ปัจจุบันกำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557
-------------------------	--

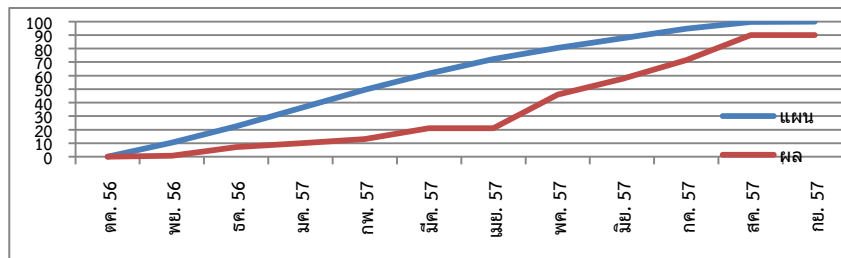

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2557
----------------	---	-----------------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเป็ย-ห้วยไทร บ้านดงป่าเป็ย ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง
-------------------------------------	---	---

ลักษณะโครงการ
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที H= 50 ม. จำนวน 2 เครื่อง งานระบบส่งน้ำ MP พร้อมอาคารประกอบ งานระบบส่งน้ำ MP พร้อมอาคารประกอบ งานท่อส่งน้ำ ขนาด Ø 800 มม. ยาว 1,850.00 ม. ขนาด Ø 700 มม. ยาว 60.00 ม. ขนาด Ø 600 มม. ยาว 360.00 ม. งานระบบส่งน้ำสาย 3R-MP พร้อมอาคารประกอบ งานท่อส่งน้ำ ขนาด Ø 800 มม. ยาว 700.00 ม. ขนาด Ø 700 มม. ยาว 1,000.00 ม. ขนาด Ø 600 มม. ยาว 475.00 ม.


งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2557				
เหลือในปี	- จ้างเหมา	22,500,000	44,081,423		งานจ้างเหมาบางส่วน
	- ดำเนินการเอง	471,000	900,000		งานดำเนินการเอง
ปี 2558					
- จ้างเหมา	60,000,000	-			
- ดำเนินการเอง	18,000,000	-			
ปี 2559					
- จ้างเหมา	67,500,000	-			
- ดำเนินการเอง	20,250,000	-			
รวม	188,721,000	44,981,423			

ความก้าวหน้าในการจัดทํา (ใบเบิกชื่อหรือจ้างวงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง	17-ธ.ค.-52	อนุมัติเงินงวด	19-พ.ย.-56
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	27-ก.พ.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	วรายุทธ(เสียงชะ)การปิโตรเลียม
	ส่งประมาณการ	15-ส.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	25-มี.ค.-57
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	14-พ.ย.-58
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	18-ต.ค.-56	อายุสัญญา	600 วัน
	ประกาศ TOR	13-ก.ย.-56	สัญญาเลขที่	กจ.9/2557(กสพ.)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	16-ต.ค.-56	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	18-พ.ย.-56	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		

เปอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม	29.557%	(ปี 2557) แผน	79.950%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		
	ผลงานสะสม	55.120%	(ปี 2557) ผล	100.000%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
- ผลงาน					- จ้างเหมา	44,081,423.00	22,500,000.00
- เบิกจ่าย					- ดำเนินการเอง	900,000.00	899,990.80
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม (บาท)	44,981,423.00	23,399,990.80
					คิดเป็น (%)	100.00	52.02

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า

แผนการแก้ไขปัญหา



สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2557
----------------	---	-----------------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาคำ ระยะที่2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านหนองนาคำ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ชลประทานขนาดกลาง
-------------------------------------	---	---	------------------

ลักษณะโครงการ	ระบบส่งน้ำสาย MP (ท่อ AC) Ø 600 มม. กม.1+625 ถึง กม.3+800 พร้อมอาคารประกอบงานซื้อโค้ง จำนวน 2 แห่ง , อาคารจ่ายน้ำ-เข้าน้ำ ขนาด Ø 100 มม. จำนวน 7 แห่ง , อาคารระบายตะกอน จำนวน 1 แห่ง และ อาคารท่อลอดถนน จำนวน 1 แห่ง
----------------------	--


งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2557				
เหลือในปี	-จ้างเหมา				งานจ้างเหมาบางส่วน
	-ดำเนินการเอง	21,461,300	21,461,300		งานดำเนินการเอง
งบ กปร.	-ค่าควบคุมงาน	-	-		
	รวม	21,461,300.00	21,461,300.00		

ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกชื่อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	19-มี.ค.-57
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	12-มิ.ย.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย
	ส่งประมาณการ	6-ก.ย.-56	เริ่มอายุสัญญา	13-มิ.ย.-57
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	10-ก.ย.-57
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	21-มี.ค.-57	อายุสัญญา	90
	ประกาศ TOR	4-เม.ย.-57	สัญญาเลขที่	สกก.6 (ข.) 05/2557
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	22-เม.ย.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	21-พ.ค.-57	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		

เปอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	71.74%	(ปี 2557) แผน	71.74%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	65.58%	(ปี 2557) ผล	65.58%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
- ผลงาน				- ดำเนินการเอง	21,461,300.00	20,350,129.84	
- เบิกจ่าย				รวม (บาท)	21,461,300.00	20,350,129.84	
- กราฟผลงาน (สะสม)				คิดเป็น (%)	100.00	94.82	

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	มีอุปสรรคในพื้นที่ เนื่องจากฝนตก ทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนอีกทั้งได้งบประมาณล่าช้างานไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557
-------------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุดและกันเงินเหลือปีให้น้อยที่สุด
-------------------------	---

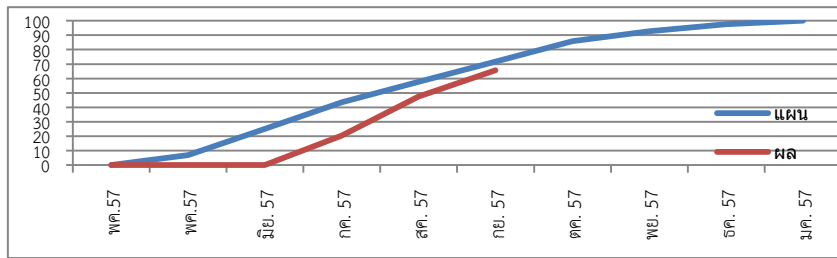

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2557
---------	---	----------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	ส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	ผลิตภัณฑ์ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง
------------------------------	--	--

ลักษณะโครงการ	อาคารสำนักงาน ขนาด 6.00*20.00 ม. ถนนเข้าหัวงาน อาคารโรงจอดรถ อาคารบ้านพักชั่วคราว ระดับ 1-2 อาคารป้อมยาม
---------------	--


งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2557			
เหลี่ยมปี	-จ้างเหมา	3,359,000.00	3,359,000.00	งานจ้างเหมา
<input type="checkbox"/> งบ กปร.	-ดำเนินการเอง	6,617,000.00	6,617,000.00	งานจ้างเหมาบางส่วน
	-ค่าควบคุมงาน	-	-	
<input type="checkbox"/>	รวม	9,976,000.00	9,976,000.00	

ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	11-เม.ย.-57
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	10-ก.ค.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บ.พิมายอาร์ เอ็นจิเนียริง
	ส่งประมาณการ	21-ต.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	1-พ.ค.-57	อายุสัญญา	60
	ประกาศ TOR	20-พ.ค.-57	สัญญาเลขที่	สกท.6 (จ) 02 / 2557
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	26-พ.ค.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	27-มิ.ย.-57	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		

เปอร์เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	57.640%	(ปี 2557) แผน	57.640%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	72.900%	(ปี 2557) ผล	72.900%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
					- จ้างเหมา	3,359,000.00	581,838.39
					- ดำเนินการเอง	6,617,000.00	4,615,684.49
					รวม (บาท)	9,976,000.00	5,197,522.88
					คิดเป็น (%)	100%	52.100%

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	งานล่าช้าต้องรอผู้รับจ้างตอกเสาเข็มก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคาร และปัจจุบันฝนตกทำให้งานก่อสร้างมีอุปสรรค อีกทั้งได้งบประมาณล่าช้างานไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557
------------------------------	---

แผนการแก้ไขปัญหา	เร่งรัดงานตอกเสาเข็มและจัดหาแรงงานให้ทันกับงานก่อสร้างและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุดและกันเงินเหลี่ยมปีให้น้อยที่สุด
------------------	--

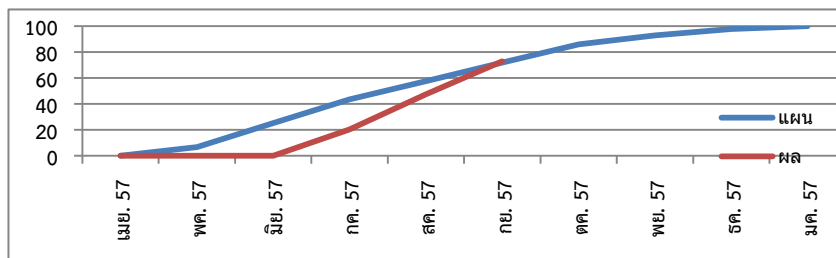

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2557
---------	---	----------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไทรงาม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านไทรงาม ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง
---------------------------------	---	--

ลักษณะโครงการ	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อัตราการสูบ 0.28 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 60 เมตร จำนวน 1 แห่ง ท่อเหล็กส่งน้ำ Ø 0.30 ม. ยาวรวม 5,270 ม.
---------------	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2557				
	-จ้างเหมา	24,099,000.00	24,099,000.00	งานจ้างเหมาบางส่วน	
เหลือปี	-ดำเนินการเอง	-		งานดำเนินการเอง	
	-ค่าควบคุมงาน		-		
<input type="checkbox"/> งบ กปร.					
	-				
<input type="checkbox"/>	รวม	24,099,000.00	24,099,000.00		

ความก้าวหน้า ในการจัดหา (ใบเบิก ซื้อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	-
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	30-ก.ย.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท จันทรณี (2549) จำกัด
	ส่งประมาณการ	16-พ.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	19-พ.ย.-56	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	16-21 ม.ค.57	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	21-เม.ย.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	20-พ.ค.-57	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		

เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	0.000%	(ปี 2557) แผน	0.00%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	13.800%	(ปี 2557) ผล	13.80%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
					- จ้างเหมา	24,099,000.00	2,733,273.43
				- จ้างเหมา	3,537,971.00	-	
				รวม (บาท)	27,636,971.00	2,733,273.43	
				คิดเป็น (%)	100.00	9.89	

สภาพปัญหา และสาเหตุ ความล่าช้า	คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ 30 ก.ย. 57 และเร่งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
--------------------------------------	---

แผนการ แก้ไขปัญหา	ประกาศ TOR แล้วเมื่อวันที่ 16-21 ม.ค. 2557 ได้ประกาศประกวดราคาใหม่แล้ว และเคาะราคาวันที่ 16 พ.ค.2557 24,600,000 บาท อนุมัติรับราคาแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากต้องรองบประมาณเพิ่มเติม
----------------------	---
