



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๒๓๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖) + ๒๓๒๗

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี จำนวน ๑,๐๑๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๑๖ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓๙๗ รายการ และยกเลิก ๒ รายการ คือ ประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด ๖.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๑๖๑.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๓ งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ ๔.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๔,๘๔๓.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓ โดยมีสำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ จำนวน ๘ สำนัก/กอง ได้แก่ สขป.๓ สขป.๑๑ สขป.๑๒ ลบก. สบอ. กพด. สลก. และ สอส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวราภรณ์ หัตพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. นำมาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผว.ผง.

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจนวัฒน์ อินทร์หุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖

-ทราบ

๒๕๖๖ ผอ.ธชช., ผอ.ธ.ทท., ทน.๑-๗ ผอ.

|| สข. ผ.ท. ผอ.(ม.ผอ., ผอ.ผอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายคณิต โชติกะ)


ผชน.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.

๓ พ.ค. ๒๕๖๖



งบประมาณเงินต้นไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

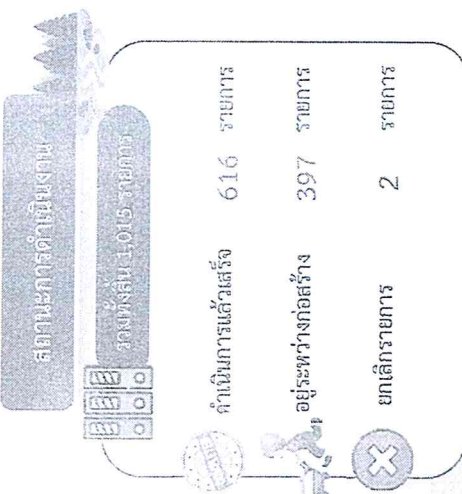

1. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เข้าไปตามแผนที่กำหนด หรือที่จ้างงานทำให้กรมต้องบอกเลิกสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
2. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
3. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายละเอียด)	ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม											
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ยอดรวม 9 เดือน
รวม	656.81	1,620.80	2,068.76	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	552.64	189.45	167.01	461.22	51.66
แผน	12,009.81											
ผลต่าง	7,161.73	1,358.74	1,408.54	752.79	1,520.36	601.61						
ผลต่าง	4,848.08	-262.06	-608.16	-552.27	-618.37	-310.93						



สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2565 (จบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,015 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 616 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 397 รายการ และยกเลิก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7,161.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.63 งบประมาณเหลือจ่าย จากงานแล้วเสร็จ 4.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 4,843.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.33

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 616 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี 2,985.59 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 3,032.86 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,028.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 4.80 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 397 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี 8,987.95 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 8,976.95 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,133.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.05 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 4,843.28 ล้านบาท

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 2 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี 36.27 ล้านบาท คือ ประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		งบเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี 2565	งบเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ	งบที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	12,009.81	12,009.81	7,161.73	59.63	4.80	4,843.28
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	616	2,985.59	3,032.86	3,028.06	99.84	4.80	
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	397	8,987.95	8,976.95	4,133.67	46.05		4,843.28
3. ยกเลิกรายการ	2	36.27					

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 30 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 95 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 56 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2,481.86 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,480.45 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,285.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.81 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 0.002 ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,195.28 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 99 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 60 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,745.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,744.97 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,034.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.31 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 0.63 ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 709.39 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 132 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 67 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 65 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,071.44 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,068.05 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 608.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.00 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 0.67 ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 458.63 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	งบรวม ล้านบาท	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2565	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	616	397	2	12,009.81	12,009.81	7,161.73	59.63	4.80	4,843.28
สงป.1	13	7	6		147.89	147.89	90.64	61.29	0.03	57.23
สงป.2	35	27	8		143.13	141.33	118.15	83.58	0.01	23.19
สงป.3	13	6	7		208.41	208.41	81.85	39.28	0.005	126.55
สงป.4	11	6	5		36.03	35.80	28.99	80.99	0.01	6.79
สงป.5	22	14	8		372.59	372.11	262.84	70.64	0.002	109.26
สงป.6	40	17	23		498.67	498.66	257.94	51.73	0.04	240.68
สงป.7	72	55	17		319.01	319.01	260.83	81.76	0.03	58.15
3 สงป.8	132	67	65		1,071.44	1,068.05	608.75	57.00	0.67	458.63
สงป.9	30	16	14		531.87	531.86	271.54	51.06	0.002	260.32

ลำดับโครงการ	จำนวน สัญญา	จำนวนสัญญาที่ดำเนินการ			งบรวมตามมติสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกู้ ใช้เบิกเหลือปี 2565	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย จากงาน แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ
สจป.10	32	25	9		179.34	176.05	101.69	57.76	0.003	74.36
สจป.11	42	21	19	2	559.83	514.08	225.03	43.77	0.002	289.05
สจป.12	20	14	6		327.28	326.84	161.47	49.40	1.35	164.02
สจป.13	35	18	17		330.26	328.10	264.13	80.50	0.01	63.97
สจป.14	40	14	26		564.75	564.75	351.36	62.21	0.07	213.32
สจป.15	106	86	20		687.46	687.22	543.10	79.03	0.09	144.03
สจป.16	30	35	15		770.05	769.98	558.75	72.57		211.23
สจป.17	21	12	9		152.41	152.41	112.11	73.55	1.09	39.22
สนบ.	24	13	11		127.47	127.47	40.54	31.80	0.68	86.25
สนอ.	47	34	13		311.74	311.58	153.89	49.39	0.06	157.62
1 สจญ.	95	56	39		2,481.86	2,480.45	1,285.16	51.81	0.002	1,195.28
2 กทค.	99	60	39		1,745.31	1,744.97	1,034.95	59.31	0.63	709.39
กมด.	1		1		0.74	0.74	0.32	42.86		0.42
สนด.	8	3	5		9.95	9.95	8.57	86.06		1.39
สกค.	8	2	6		106.49	106.49	34.62	32.51		71.87
สส.	1	1			13.94	13.94	13.94	100.00		
สอส.	6	3	3		84.39	84.39	37.37	44.28		47.02
สทส.	2	2			10.26	10.26	10.26	100.00		
สกค.	2	2			26.31	26.39	26.39	99.99	0.002	
สจล.	4	1	3		19.03	19.03	13.92	73.16	0.0003	5.11
Lump Sum	4	1	3		166.92	231.61	202.66	87.50	0.0002	28.95

อุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก๊วแบบ แก๊วสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
