



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๒๕๖๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖) รช ๖๓๔๔

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี จำนวน ๑,๐๑๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๔๑๐ รายการ และยกเลิก ๒ รายการ คือ ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางทวาย (ขนาด ๖.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๘๓๙.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๕ งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ ๔.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๕,๑๖๕.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๑ โดยมีสำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ จำนวน ๑๐ สำนัก/กอง ได้แก่ สขป.๓ สขป.๖ สขป.๙ สขป.๑๑ สขป.๑๒ สขป.๑๖ สขป. สบอ. กพด. สลก. และ สอศ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผว.ผง.

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖

-ทราบ

เรียน ผอ.ผง., ผอ.ท.ทอ., ทน.๑-๙ ผอ.

และ ผทท.ผอ. (ผ.ผอ., ผอ.ผอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายทเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖


งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2566

ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565

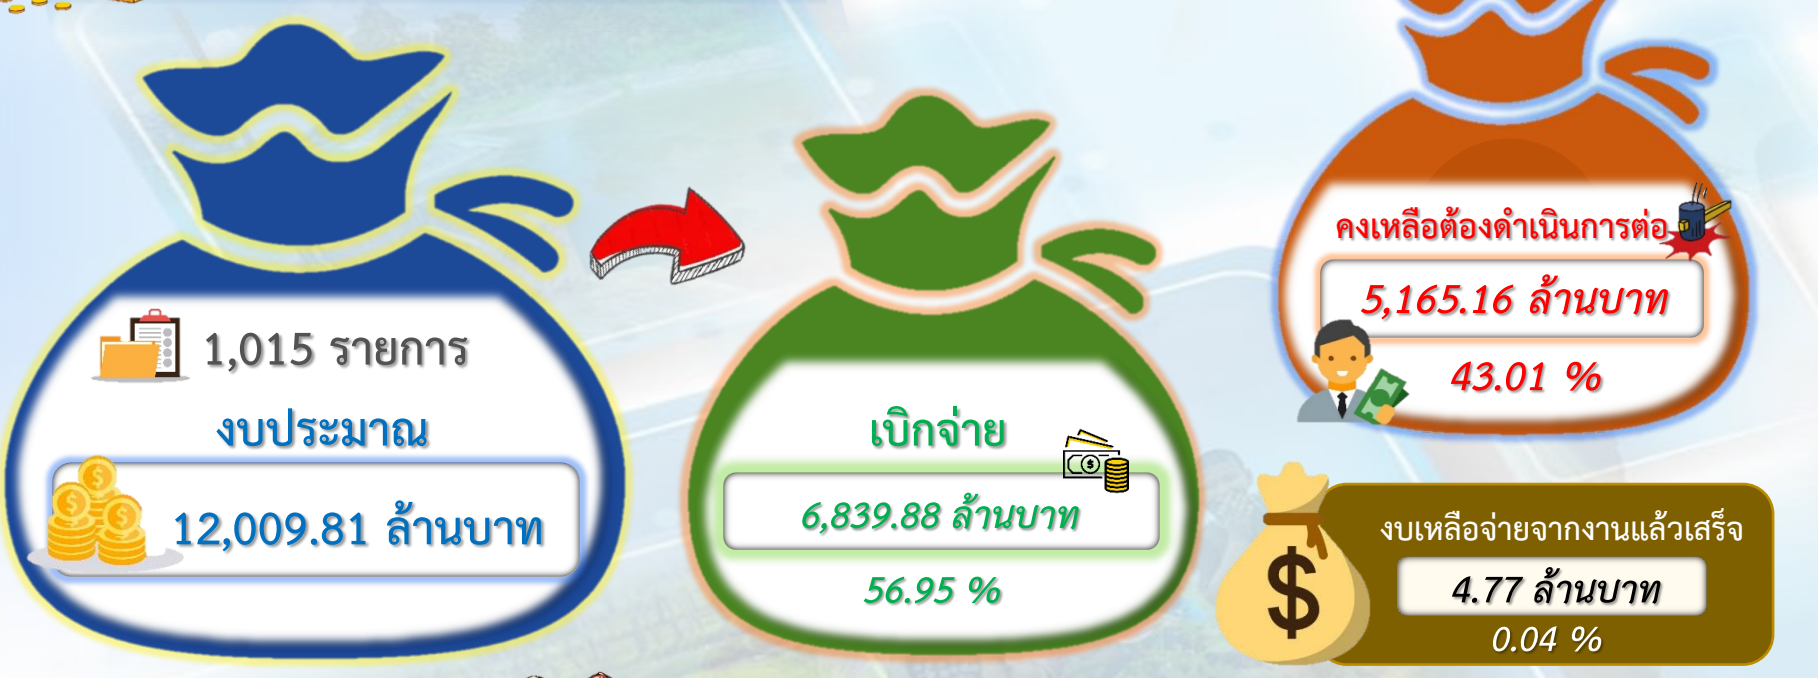

สถานะการดำเนินงาน



ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือทำงานทำให้กรมต้องบอกเลิกสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

รวม	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวมความเป็น	
แผน	12,009.81	656.81	1,620.80	2,068.76	1,471.04	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01	461.22	51.66
ผล	6,839.88	656.81	1,358.74	1,408.54	862.88	752.79	1,520.36	279.76						
ผลต่าง	5,169.93	-	-262.06	-660.22	-608.16	-552.27	-618.37	-632.78						



สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2566

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,015 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 594 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง 419 รายการ และยกเลิก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,839.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.95 งบประมาณเหลือจ่าย จากงานแล้วเสร็จ 4.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 5,165.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.01**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 603 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2,758.16 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,805.34 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,800.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง **และงบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 4.77 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 410 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 9,215.38 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 9,204.47 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,039.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.88 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 5,165.16 ล้านบาท**

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 2 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 36.27 ล้านบาท คือ ประตุน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตุน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		งบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	งบเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ	งบที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	12,009.81	12,009.81	6,839.88	56.95	4.77	5,165.16
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	603	2,758.16	2,805.34	2,800.57	99.83	4.77	
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	410	9,215.38	9,204.47	4,039.31	43.88		5,165.16
3. ยกเลิกรายการ	2	36.27					

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 30 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 95 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 56 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2,481.86 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,480.45 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,274.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.37 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 0.002 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,206.24 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 99 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 60 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,745.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,744.97 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 960.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.05 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 0.63 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 783.66 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 132 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 66 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 66 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,071.44 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,068.05 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 583.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.60 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 0.67 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 484.23 ล้านบาท**

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี 2565	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	603	410	2	12,009.81	12,009.81	6,839.88	56.95	4.77	5,165.16
สขป.1	13	7	6		147.89	147.89	90.64	61.29	0.03	57.23
สขป.2	35	27	8		148.13	141.33	118.13	83.58	0.01	23.19
สขป.3	13	5	8		208.41	208.41	81.85	39.28		126.55
สขป.4	11	6	5		36.03	35.80	28.66	80.06	0.01	7.13
สขป.5	22	14	8		372.59	372.11	262.84	70.64	0.002	109.26
สขป.6	40	17	23		498.67	498.66	232.89	46.70	0.04	265.73
สขป.7	72	54	18		319.01	319.01	255.44	80.07	0.03	63.54
3 สขป.8	132	66	66		1,071.44	1,068.05	583.15	54.60	0.67	484.23
สขป.9	30	16	14		531.87	531.86	222.13	41.77	0.002	309.73

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกัน ไว้เบิกเหลือมปี 2565	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย จากงาน แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ
สขป.10	32	23	9		179.34	176.05	99.92	56.76	0.003	76.13
สขป.11	42	20	20	2	559.83	514.08	223.66	43.51		290.42
สขป.12	20	14	6		327.28	326.84	104.69	32.03	1.35	220.80
สขป.13	35	17	18		330.26	328.10	261.92	79.83	0.01	66.17
สขป.14	40	14	26		564.75	564.75	345.12	61.11	0.07	219.56
สขป.15	106	81	25		687.46	687.22	525.87	76.52	0.08	161.27
สขป.16	50	33	17		770.05	769.98	537.46	69.80		232.52
สขป.17	21	11	10		152.41	152.41	108.55	71.22	1.08	42.78
สบก.	24	13	11		127.47	127.47	38.80	30.44	0.68	88.00
สบอ.	47	34	13		311.74	311.58	150.08	48.17	0.06	161.44
1 สพญ.	95	56	39		2,481.86	2,480.45	1,274.20	51.37	0.002	1,206.24
2 กพก.	99	60	39		1,745.31	1,744.97	960.68	55.05	0.63	783.66
กพด.	1		1		0.74	0.74	0.32	42.86		0.42
สมด.	8	3	5		9.95	9.95	8.57	86.06		1.39
สลก.	8	2	6		106.49	106.49	33.46	31.42		73.03
สสธ.	1	1			13.94	13.94	13.94	100.00		
สอศ.	6	3	3		84.39	84.39	30.65	36.32		53.74
ศทส.	2	2			10.26	10.26	10.26	100.00		
สคก.	2	2			26.31	26.31	21.59	82.06	0.002	4.72
สจต.	4	1	3		19.03	19.03	13.92	73.16	0.0003	5.11
Lump Sum	4	1	3		166.92	231.69	200.48	86.53	0.0002	31.20

อุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
