



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๓๗๕/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑/ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) 421188

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี จำนวน ๑,๐๑๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๑๘ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๙๕ รายการ และยกเลิก ๒ รายการ คือ ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด ๖.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘,๙๑๖.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๔ งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/ งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด ๑๔๐.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๗ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๒,๙๕๒.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๙ โดยมีสำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐.๐๐ จำนวน ๔ สำนัก/กอง ได้แก่ สขป.๓ สขป.๑๑ สบก. และ กพต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขออนุมัติเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

ปรารภณ สุณี

(นางสาวปรารภณ สุณี)

ตป.๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖

-ทราบ

โดยน พอ.สงน., พอ.ภค., พน.จ.-ร.พ.อ.

และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อโปรดทราบ

(นายสมคิด สะเกดคำ)

ผอ.ท.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖


๓๑/ ๖/๔

งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกหลอมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566

ภาพรวม
งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกหลอมปี พ.ศ. 2565

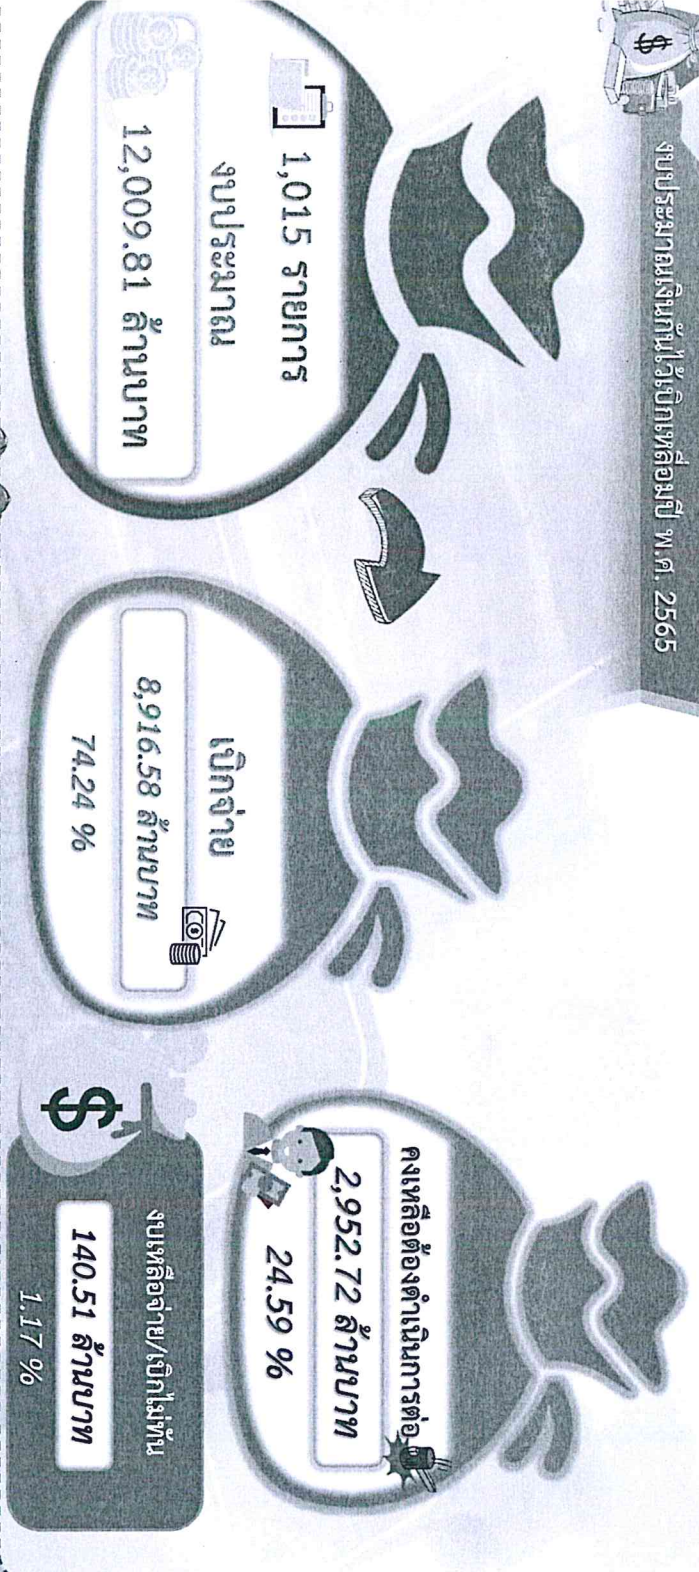

สถานะการดำเนินงาน


รวมทั้งสิ้น 1,015 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ	718 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง	295 รายการ
ยกเลิกรายการ	2 รายการ

- ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม
1. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือทิ้งงานทำให้กรมต้องยกเลิกสัญญา และพาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
 2. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้หน้าทิวร่วมชั้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
 3. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

แผน/โครงการเบิกจ่าย (รายเดือน)

รวม	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวมตามสภาพ
12,009.81	656.81	1,620.80	2,068.76	1,471.04	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01	461.22	51.66
8,499.66	656.81	1,358.74	1,408.54	862.88	752.79	1,520.36	601.61	928.38	826.47				
3,510.15	-	-262.06	-660.22	-608.16	-552.27	-618.37	-310.93	494.29	293.83				



สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,015 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 718 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง 295 รายการ และยกเลิก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8,916.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.24 งบประมาณเหลือจ่าย จากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 140.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.17 **และงบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ 2,952.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.59**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 718 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 4,340.54 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,386.68 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,375.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง **และงบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 10.71 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 295 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 7,633.00 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 7,623.13 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,540.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.56 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 129.80 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 2,952.72 ล้านบาท**

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 2 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 36.27 ล้านบาท คือ ประตุน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตุน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		งบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	งบเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	12,009.81	12,009.81	8,916.58	74.24	140.51	2,952.72
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	718	4,340.54	4,386.68	4,375.97	99.76	10.71	
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	295	7,633.00	7,623.13	4,540.61	59.56	129.80	2,952.72
3. ยกเลิกรายการ	2	36.27					

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 30 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 95 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 62 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2,481.86 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,480.45 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,599.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.47 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 0.002 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 881.41 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 99 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 72 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,745.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,744.97 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,190.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.20 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 130.27 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 424.68 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 42 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ และยกเลิก จำนวน 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 559.83 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 514.08 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 241.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.07 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 0.002 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 272.12 ล้านบาท**

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2565	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	718	295	2	12,009.81	12,009.81	8,916.58	74.24	140.51	2,952.72
สขป.1	13	7	6		147.89	147.89	94.34	63.79	0.03	53.52
สขป.2	35	28	7		148.13	141.33	136.11	96.30	0.02	5.21
สขป.3	13	7	6		208.41	208.41	92.28	44.28	0.007	116.12
สขป.4	11	8	3		36.03	35.80	33.68	94.08	0.03	2.09
สขป.5	22	14	8		372.59	372.11	361.06	97.03	0.002	11.05
สขป.6	40	22	18		498.67	498.66	430.42	86.31	0.05	68.19
สขป.7	72	62	10		319.01	319.01	308.74	96.78	0.05	10.23
สขป.8	132	95	37		1,071.44	1,068.05	789.87	73.95	6.13	272.05
สขป.9	30	17	13		531.87	531.86	340.20	63.96	0.003	191.66

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี 2565	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/ เบิกไม่ทัน	งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ
สขป.10	32	27	5		179.34	176.05	141.85	80.58	0.011	34.18
3 สขป.11	42	22	18	2	559.83	514.08	241.97	47.07	0.002	272.12
สขป.12	20	15	5		327.28	326.84	180.09	55.10	1.41	145.34
สขป.13	35	19	16		330.26	328.10	303.67	92.55	0.01	24.42
สขป.14	40	17	23		564.75	564.75	535.35	94.79	0.08	29.32
สขป.15	106	88	18		687.46	687.22	628.59	91.47	0.10	58.53
สขป.16	50	40	10		770.05	769.98	664.36	86.28	0.013	105.60
สขป.17	21	19	2		152.41	152.41	150.57	98.79	1.35	0.50
สบก.	24	15	9		127.47	127.47	54.53	42.78	0.68	72.26
สบอ.	47	44	3		311.74	311.58	208.17	66.81	0.06	103.34
1 สพญ.	95	62	33		2,481.86	2,480.45	1,599.03	64.47	0.002	881.41
2 กพก.	99	72	27		1,745.31	1,744.97	1,190.02	68.20	130.27	424.68
กพด.	1		1		0.74	0.74	0.32	42.86		0.42
สมต.	8	3	5		9.95	9.95	8.60	86.39		1.35
สลก.	8	3	5		106.49	106.49	54.09	50.79	0.22	52.18
สสธ.	1	1			13.94	13.94	13.94	100.00		
สอศ.	6	5	1		84.39	84.39	79.05	93.67		5.34
ศทส.	2	2			10.26	10.26	10.26	100.00		
สคก.	2	2			26.31	26.39	26.39	99.99	0.002	
สจต.	4	1	3		19.03	19.03	18.01	94.67	0.0003	1.01
Lump Sum	4	1	3		166.92	231.60	221.05	95.44	0.0002	10.55

อุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่

2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
