



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๔๓๕/๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.๒๑๑ 6361/11๕.๑.๐6

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

งย1518

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๑๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๓๕ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๗๘ รายการ และยกเลิก ๒ รายการ คือ ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด ๖.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙,๓๑๖.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๗ งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/ งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด ๒๖๙.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๒,๔๒๓.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๘ โดยมีสำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐.๐๐ จำนวน ๓ สำนัก/กอง ได้แก่ สขบ.๑๑ สบก. และ กพด.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตบ.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖

- ทราบ

5 โยณ ผอ.ส.บ., ผอ.ค.ทต., ทน.๑-๓๗ นอ.

และ ผพท.นอ.(จ.ม.นอ., ผต.นอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรุณา เพ็ญคุณมา)

ผยศ.บอ.รักษาราชการแทน ผส.บอ.

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖


งบประมาณเงินกู้ยืมใช้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้ยืมใช้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

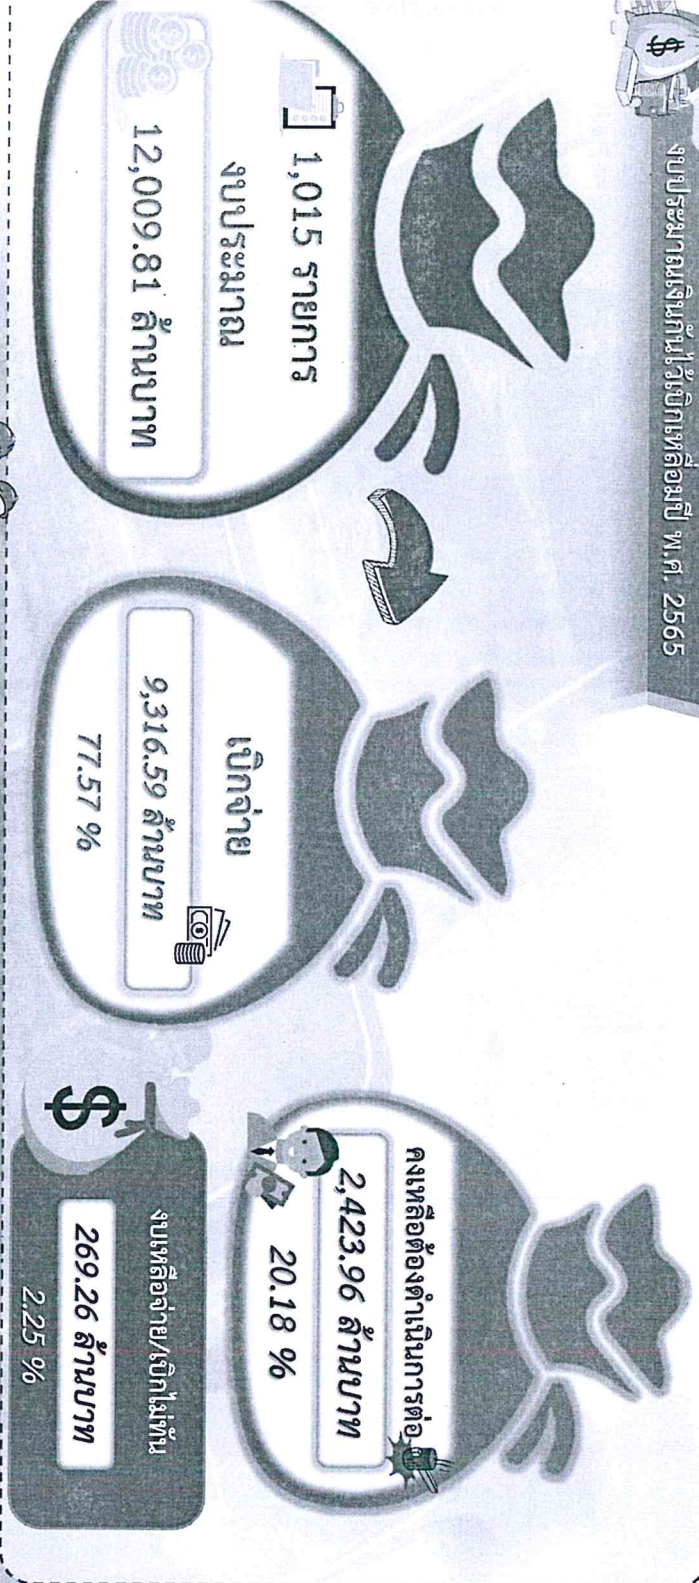

สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,015 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ	735 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง	278 รายการ
ยกเลิกรายการ	2 รายการ

1. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือทำงานทำให้กรมต้องยกเลิกสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
2. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

แผน/โครงการเบิกจ่าย (รายเดือน)

รวม	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ยอดรวม จำนวน	เบิก 100%
12,009.81	656.81	1,620.80	2,068.76	1,471.04	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01	461.22	51.66	
9,316.59	656.81	1,358.74	1,408.54	862.88	752.79	1,520.36	601.61	928.38	826.47	400.01				
2,693.22	-	-262.06	-660.22	-608.16	-552.27	-618.37	-310.93	494.29	293.83	210.56				



สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,015 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 735 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง 278 รายการ และยกเลิก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 9,316.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.57 งบประมาณเหลือจ่าย จากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 269.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.25 **และงบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ 2,423.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.18**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 735 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 4,574.14 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,620.27 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,608.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.74 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง **และงบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 12.03 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 278 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 7,399.40 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 7,389.54 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,708.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.72 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 257.23 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 2,423.96 ล้านบาท**

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 2 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 36.27 ล้านบาท คือ ประตุน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตุน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		งบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	งบเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	12,009.81	12,009.81	9,316.59	77.57	269.26	2,423.96
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	735	4,574.14	4,620.27	4,608.24	99.74	12.03	
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	278	7,399.40	7,389.54	4,708.35	63.72	257.23	2,423.96
3. ยกเลิกรายการ	2	36.27					

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 30 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 95 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 64 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2,481.86 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,480.45 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,718.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.27 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 63.29 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 699.01 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 99 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 74 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,745.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,744.97 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,204.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.01 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 172.60 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 368.20 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 42 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ และยกเลิก จำนวน 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 559.83 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 514.08 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 254.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.56 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 0.006 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 259.32 ล้านบาท**

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2565	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	735	278	2	12,009.81	12,009.81	9,316.59	77.57	269.26	2,423.96
สขป.1	13	7	6		147.89	147.89	104.66	70.77	0.03	43.20
สขป.2	35	28	7		148.13	141.33	136.11	96.30	0.02	5.21
สขป.3	13	7	6		208.41	208.41	116.28	55.80	0.007	92.12
สขป.4	11	8	3		36.03	35.80	34.08	95.20	0.03	1.69
สขป.5	22	14	8		372.59	372.11	361.45	97.14	0.002	10.66
สขป.6	40	22	18		498.67	498.66	453.69	90.98	0.05	44.92
สขป.7	72	63	9		319.01	319.01	309.25	96.94	0.05	9.72
สขป.8	132	99	33		1,071.44	1,068.05	821.58	76.92	7.40	239.08
สขป.9	30	17	13		531.87	531.86	404.31	76.02	0.003	127.55

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกัน ไว้เบิกเหลือเมื่อปี 2565	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/ เบิกไม่ทัน	งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ
สขป.10	32	27	5		179.34	176.05	141.85	80.58	0.01	34.18
3 สขป.11	42	23	17	2	559.83	514.08	254.76	49.56	0.006	259.32
สขป.12	20	16	4		327.28	326.84	220.07	67.33	1.41	105.37
สขป.13	35	19	16		330.26	328.10	306.61	93.45	0.01	21.48
สขป.14	40	17	23		564.75	564.75	537.56	95.19	0.08	27.10
สขป.15	106	88	18		687.46	687.22	638.67	92.94	0.10	48.45
สขป.16	50	42	8		770.05	769.98	697.86	90.63	0.01	72.10
สขป.17	21	19	2		152.41	152.41	150.57	98.79	1.35	0.50
สบก.	24	16	8		127.47	127.47	63.52	49.83	22.53	41.42
* สบอ.	47	44	3		311.74	311.58	209.12	67.12	0.06	102.39
1 สพญ.	95	64	31		2,481.86	2,480.45	1,718.14	69.27	63.29	699.01
2 กพท.	99	74	25		1,745.31	1,744.97	1,204.17	69.01	172.60	368.20
กพด.	1		1		0.74	0.74	0.32	42.86		0.42
สมด.	8	4	4		9.95	9.95	8.85	88.95		1.10
สลก.	8	3	5		106.49	106.49	54.15	50.85	0.22	52.12
สสธ.	1	1			13.94	13.94	13.94	100.00		
สอศ.	6	5	1		84.39	84.39	79.05	93.67		5.34
ศทศ.	2	2			10.26	10.26	10.26	100.00		
สคก.	2	2			26.31	26.39	26.39	99.99	0.002	
สจค.	4	3	1		19.03	19.03	18.26	95.95	0.0003	0.77
Lump Sum	4	1	3		166.92	231.60	221.06	95.45	0.0002	10.54

อุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่

2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
