



ศ.บ. 130460



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖  
ที่ ๕๓๒๒.๒๖๖๖ /๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง สรุปรายงานก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

จ.ว. 19/17

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปรายงานก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อช. ทราบ

(นางธราภรณ์ จิรานิตศาสตร์)  
ต.บ.๒ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตบ.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง  
เพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)  
ผอ.ผง.  
๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐

- ทราบ  
- เวียง ผอ.ส่งน., ผอช.เขต  
เพื่อททพ.

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)  
ผส.บอ. 113 ส.ค ๗๕๕๐

## สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

### กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 6 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 66,321.04 ล้านบาท ปริมาณงาน 12,230 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)** ปริมาณงาน 6,626 รายการ งบประมาณ 38,260.51 ล้านบาท เบิกจ่าย 11,026.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.82
  - อยู่ระหว่างเตรียมการ 123 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.86 ( ส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง )
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 364 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.49
  - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 3,605 รายการ คิดเป็นร้อยละ 54.41
  - แล้วเสร็จ 2,534 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.24
- 2. งบกลาง** ปริมาณงาน 4,046 รายการ งบประมาณ 10,481.08 ล้านบาท เบิกจ่าย 6,123.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.43
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 13 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.32
  - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 582 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.38
  - แล้วเสร็จ 3,451 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.29
- 3. เงินกู้** ปริมาณงาน 151 รายการ งบประมาณ 9,976.72 ล้านบาท เบิกจ่าย 4,112.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.22
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.95
  - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 139 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.05
- 4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559** ปริมาณงาน 496 รายการ งบประมาณ 5,648.80 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,724.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.52
  - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 318 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.11
  - แล้วเสร็จ 178 รายการ คิดเป็นร้อยละ 35.89
- 5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560** ปริมาณงาน 853 รายการ งบประมาณ 139.06 ล้านบาท เบิกจ่าย 48.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.96
  - อยู่ระหว่างเตรียมการ 144 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.88
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 129 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.12
  - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 120 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.07
  - แล้วเสร็จ 460 รายการ คิดเป็นร้อยละ 53.93
- 6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560** ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 729.83 ล้านบาท เบิกจ่าย 275.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.80
  - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 57 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.28
  - แล้วเสร็จ 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.72

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560


กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,230</b>	<b>267</b>	<b>518</b>	<b>4,821</b>	<b>6,624</b>	<b>65,236.00</b>	<b>23,311.15</b>	<b>35.73</b>	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)	6,626	123	364	3,605	2,534	38,260.51	11,026.09	28.82	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน
2. งบกลาง	4,046	-	13	582	3,451	10,481.08	6,123.89	58.43	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	3	2	583.00	42.56	7.30	ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้วเสร็จ 84 รายการ เบิกจ่าย 1,619.50 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 583.00 ล้านบาท
2.2 งบกลาง กปร.58	10	-	-	4	6	252.91	189.09	74.77	ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.87 ล้านบาท แล้วเสร็จ 91 รายการ เบิกจ่าย 147.01 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.59	66	-	-	24	42	1,312.05	1,007.56	76.79	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้วเสร็จ 39 รายการ เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05 ล้านบาท
2.4 งบกลาง กปร.60	11	-	7	4	0	162.72	0.34	0.21	ปริมาณงาน 17 รายการ งบประมาณ 315.41 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 11 รายการ เป็นเงิน 162.72 ล้านบาท
2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหายั่งยืน และอุทกภัย	999	-	6	330	663	5,736.18	2,636.90	45.97	ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 2 รายการ งบประมาณ 8.10 ล้านบาท คงเหลือ 1,048 รายการ งบประมาณ 5,757.43 ล้านบาท แล้วเสร็จ 49 รายการ ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 999 รายการ งบประมาณ 5,736.18 ล้านบาท
2.6 งบกลาง โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กรัฐบาล ปี 2559	2,672	-	-	211	2,461	2,376.53	2,193.04	92.28	ปริมาณงาน 2,677 รายการ งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท ยกเลิก 5 รายการ งบประมาณ 7.07 ล้านบาท คงเหลือ 2,672 รายการ งบประมาณ 2,376.53 ล้านบาท
2.7 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ(ฝักคบขวา)	283	-	-	6	277	57.69	54.40	94.30	ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท ยกเลิก 12 รายการ งบประมาณ 3.21 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเข้าขึ้นกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 283 รายการ งบประมาณ 57.69 ล้านบาท
<b>3. เงินกู้</b>	<b>151</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>139</b>	<b>-</b>	<b>9,976.72</b>	<b>4,112.71</b>	<b>41.22</b>	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	116	-	7	109	-	8,599.25	3,856.57	44.85	ปริมาณงาน 723 รายการ ยอดจัดสรร 22,426.36 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้จริง 21,614.47 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 607 รายการ คงเหลือ 116 รายการ งบประมาณ 8,599.25 ล้านบาท
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	35	-	5	30	-	1,377.47	256.13	18.59	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอนจัดสรร 1,377.47 ล้านบาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง 30 รายการ ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ
4. เงินกู้เพื่อหมุนเวียนปี พ.ศ. 2554-2559	496	-	-	318	178	5,648.80	1,724.01	30.52	ปริมาณงาน 570 รายการ งบประมาณ 5,648.80 ล้านบาท เงินพัน/หมื่นความจำเป็น จำนวน 74 รายการ งบประมาณ 85.48 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 496 รายการ งบประมาณ 5,555.38 ล้านบาท
5. เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560	853	144	129	120	460	139.06	48.62	34.96	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 0.08 ล้านบาท เนื่องจากรายการซ้ำ
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	58	-	-	57	1.00	729.83	275.84	37.80	

กองแผนงาน

## 1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

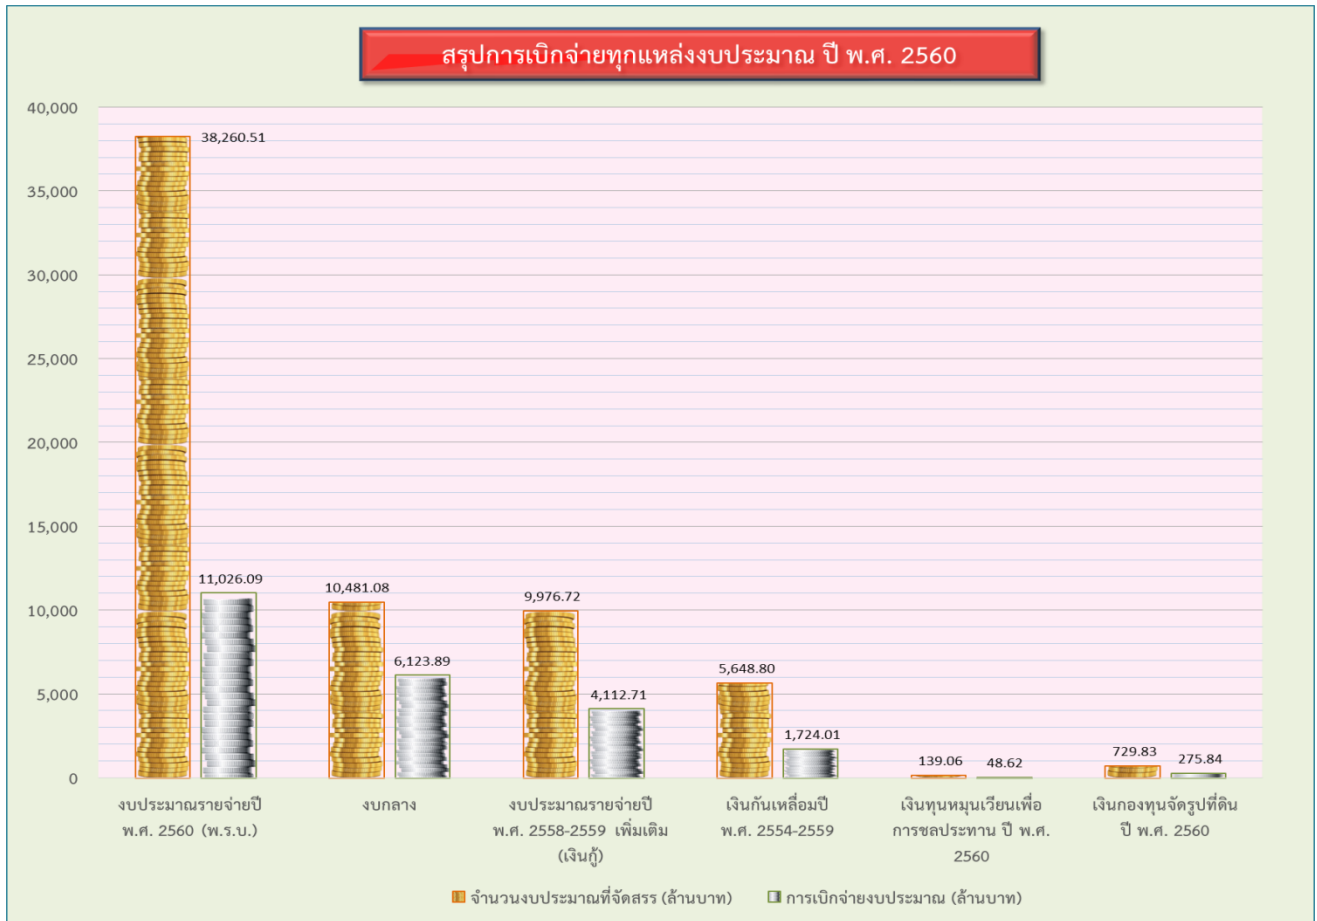

## 2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

