



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๒๕๖๑/๒๐

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ๕ ผตป.ผง. ๖๘๘ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

ร.บ. ๓๕๙๗

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อช. ทราบ

(นางสาวนันทนา พึ่งคำ)  
ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เพื่อโปรดทราบ

- ททท

- สืบ น. ออ. กว. และ ออ. พ.จ.

ที่ ททท

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)  
ผส.บอ.

(นายวิทักดิ์ ธนเดโชพล)  
รชว. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐

## สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

### กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 7 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 86,830.40 ล้านบาท ปริมาณงาน 14,153 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

**1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)** ปริมาณงาน 6,621 รายการ งบประมาณ 37,958.86 ล้านบาท เบิกจ่าย 19,018.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.10

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.65 ( ส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง )
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 190 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.87
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2,712 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.96
- แล้วเสร็จ 3,676 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.52

**2. งบกลาง** ปริมาณงาน 4,608 รายการ งบประมาณ 11,381.15 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,756.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.15

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.19
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 638 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.85
- แล้วเสร็จ 3,961 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.96

**3. เงินกู้** ปริมาณงาน 757 รายการ งบประมาณ 22,769.59 ล้านบาท เบิกจ่าย 17,683.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.66

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 131 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.31
- แล้วเสร็จ 625 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.56

**4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559** ปริมาณงาน 545 รายการ งบประมาณ 6,027.04 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,822.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.84

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 302 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.41
- แล้วเสร็จ 243 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.58

**5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560** ปริมาณงาน 853 รายการ งบประมาณ 208.93 ล้านบาท เบิกจ่าย 83.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.82

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 125 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.66
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 97 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.37
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 94 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.02
- แล้วเสร็จ 537 รายการ คิดเป็นร้อยละ 62.95

**6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560** ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 716.76 ล้านบาท เบิกจ่าย 506.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.63

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 55 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.83
- แล้วเสร็จ 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.17

**7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(60 เพิ่มเติม)** ปริมาณงาน 711 รายการ (ยกเลิก 1 รายการ) งบประมาณ 7,768.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 46.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.60

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 92 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.94
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 271 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.12
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 348 รายการ คิดเป็นร้อยละ 48.94

\*\*\*\*\*


ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>14,153</b>	<b>260</b>	<b>568</b>	<b>4,280</b>	<b>9,045</b>	<b>86,830.40</b>	<b>47,917.04</b>	<b>55.18</b>	
<b>1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)</b>	6,621	43	190	2,712	3,676	37,958.86	19,018.25	50.10	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 รายจ่ายลงทุน วงเงินรวมทั้งสิ้น 288,846,300 บาท
<b>2. งบกลาง</b>	<b>4,608</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>638</b>	<b>3,961</b>	<b>11,381.15</b>	<b>7,756.00</b>	<b>68.15</b>	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	3	2	583.00	80.42	13.79	ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้ว เสร็จ 84 รายการ เบิกจ่าย 1,619.50 ล้านบาท ดำเนินการที่ยัง ไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 583.00 ล้านบาท
2.2 งบกลาง กปร.58	10	-	-	2	8	252.91	193.29	76.43	ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.87 ล้านบาท แล้วเสร็จ 91 รายการ เบิกจ่าย 147.01 ล้านบาท ดำเนินการที่ยัง ไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.59	66	-	-	16	50	1,312.05	1,064.69	81.15	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้วเสร็จ 39 รายการ เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท ดำเนินการที่ยัง ไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05 ล้านบาท
2.4 งบกลาง กปร.60	16	-	4	12	0	253.63	46.93	18.50	ปริมาณงาน 51 รายการ งบประมาณ 1,058.03 ล้านบาท ได้รับ จัดสรร 16 รายการ เป็นเงิน 253.63 ล้านบาท
2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตาม แนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไข ปัญหายั่งยืนและอุทกภัย	998	-	4	132	862	5,736.18	3,813.75	66.49	ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 3 รายการ งบประมาณ 8.94 ล้านบาท คงเหลือ 1,047 รายการ งบประมาณ 5,765.53 ล้านบาท แล้วเสร็จ 49 รายการ ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 998 รายการ งบประมาณ 5,736.18 ล้านบาท
2.6 งบกลาง โครงการตามมาตรการกระตุ้น การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี 2559	2,672	-	-	10	2,662	2,345.76	2,309.94	98.47	ปริมาณงาน 2,677 รายการ งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท ยกเลิก 5 รายการ งบประมาณ 7.07 ล้านบาท คงเหลือ 2,672 รายการ งบประมาณ 2,376.53 ล้านบาท เงิน เหลือจ่าย 37.85
2.7 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำ(ฝักตบขวา)	283	-	-	-	283	57.69	56.62	98.15	ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท ยกเลิก 12 รายการ งบประมาณ 3.21 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ ดำเนินการซ้ำซ้อนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 283 รายการ งบประมาณ 57.69 ล้านบาท
2.8 งบกลาง แผนการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกร ที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/2560	558	-	1	463	94	839.94	190.35	22.66	
<b>3. เงินกู้</b>	<b>757</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>131</b>	<b>625</b>	<b>22,769.59</b>	<b>17,683.92</b>	<b>77.66</b>	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	722	-	1	98	623	21,392.12	17,164.50	80.24	ปริมาณงาน 722 รายการ ยอดจัดสรร 22,416.82 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้จริง 21,392.12 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 623 รายการ คงเหลือ 99 รายการ ยกเลิก 3 รายการ
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	35	-	-	33	2	1,377.47	519.42	37.71	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอน จัดสรร 1,377.47 ล้านบาท
<b>4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559</b>	<b>545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>302</b>	<b>243</b>	<b>6,027.04</b>	<b>2,822.86</b>	<b>46.84</b>	ปริมาณงาน 621 รายการ งบประมาณ 6,112.93 ล้านบาท เงินทับ/หมดความจำเป็น จำนวน 76 รายการ งบประมาณ 85.89 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 545 รายการ งบประมาณ 6,027.04 ล้านบาท
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560	853	125	97	94	537	208.93	83.20	39.82	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 0.08 ล้านบาท เนื่องจากรายการซ้ำ
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	58	-	-	55	3	716.76	506.26	70.63	
7 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ (60 เพิ่มเติม)	711	92	271	348	-	7,768.07	46.55	0.60	
ส่วนราชการ	239	-	65	174	-	5,827.99	45.09	0.77	ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 40 รายการ
กลุ่มจังหวัด	472	92	206	174	-	1,940.08	1.45	0.07	ปริมาณงาน 473 รายการ ยกเลิก 1 รายการเนื่องจากติดปัญหา ที่ดิน

## 1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

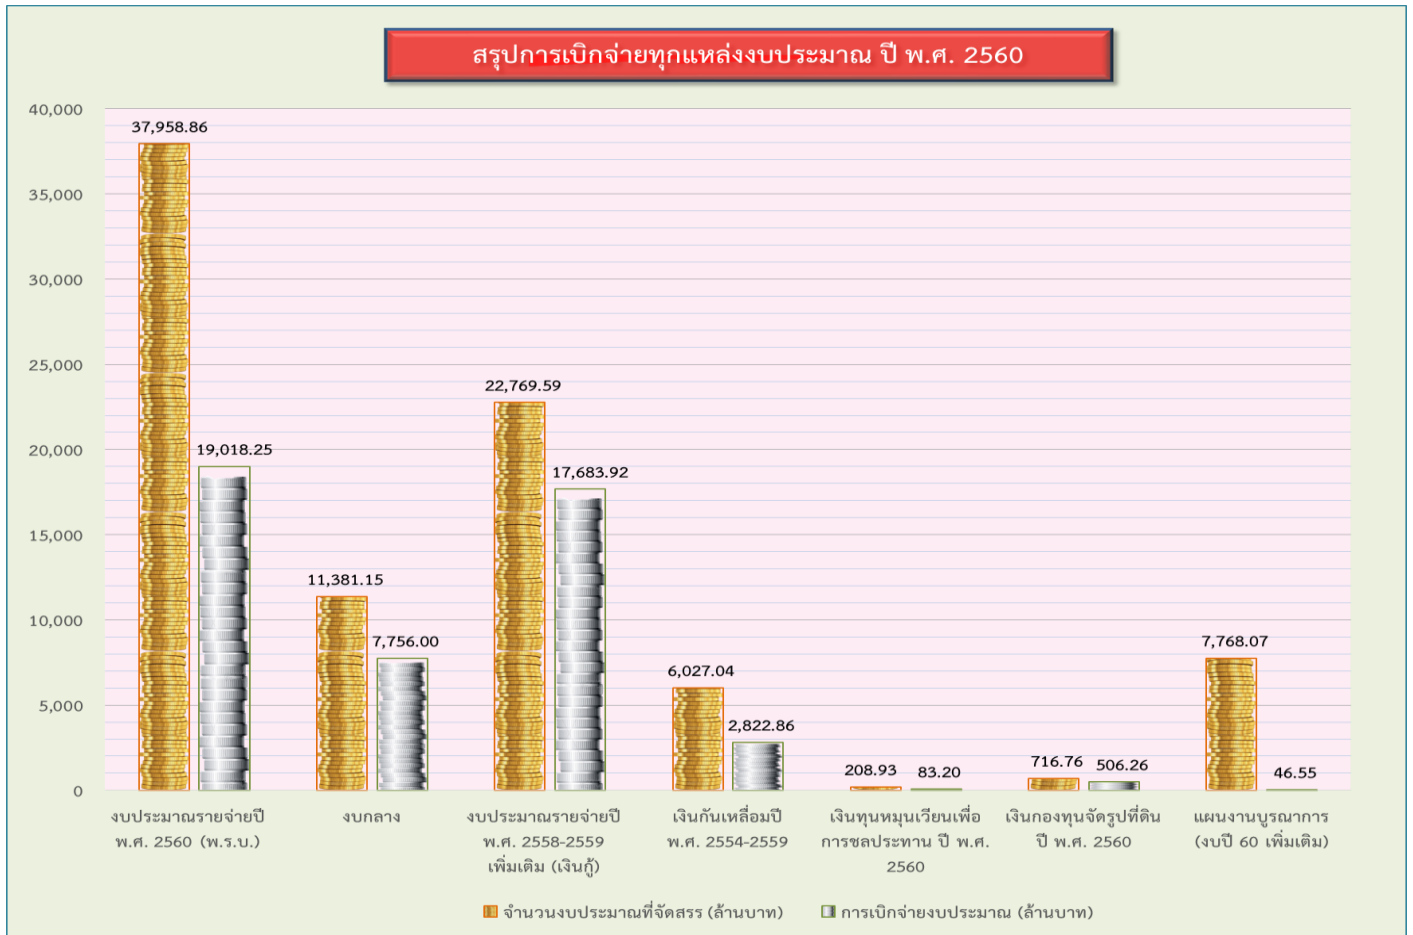

## 2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

