



# ด่วนที่สุด      บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖  
 ที่ ผตป.ผง. ศธ ๒๕๖๐      วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐  
 เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

งพ. 574

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้  
 ใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อ  
 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อธช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)  
 ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รสบ. รรส. รธว. รธร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง  
 เพื่อโปรดทราบ

  
 (นายนัทศักดิ์ ชนเดโชพล)  
 ผอ.ผง.

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๐

- ทพ.  
 - เจ้าช. ผอ. อ้วน  
 เพื่อทราบ

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.

26 ส.ค. 2560

## สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

### กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2560)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 6 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 63,208.70 ล้านบาท ปริมาณงาน 12,179 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

**1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)** ปริมาณงาน 6,591 รายการ งบประมาณ 38,933.20 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,630.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.60

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 159 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.41
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 641 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.73
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 4,096 รายการ คิดเป็นร้อยละ 62.15
- แล้วเสร็จ 1,695 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.71

**2. งบกลาง** ปริมาณงาน 4,038 รายการ งบประมาณ 10,318.41 ล้านบาท เบิกจ่าย 5,161.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.02

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 22 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.54
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 741 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.36
- แล้วเสร็จ 3,275 รายการ คิดเป็นร้อยละ 81.10

**3. เงินกู้** ปริมาณงาน 145 รายการ งบประมาณ 7,924.23 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,883.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.39

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.21
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 136 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.79

**4. เงินกันเหลือมปี พ.ศ. 2554-2559** ปริมาณงาน 494 รายการ งบประมาณ 5,183.67 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,361.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.26

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 358 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.47
- แล้วเสร็จ 136 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.53

**5. เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560** ปริมาณงาน 853 รายการ งบประมาณ 115.86 ล้านบาท เบิกจ่าย 25.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.29

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 172 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.16
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 193 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.63
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 158 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.52
- แล้วเสร็จ 330 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.69

**6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560** ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 733.33 ล้านบาท เบิกจ่าย 157.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.43

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.72
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 57 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.28

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560


กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2560

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,179</b>	<b>331</b>	<b>866</b>	<b>5,546</b>	<b>5,436</b>	<b>63,208.70</b>	<b>17,219.98</b>	<b>27.24</b>	
<b>1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)</b>	<b>6,591</b>	<b>159</b>	<b>641</b>	<b>4,096</b>	<b>1,695</b>	<b>38,933.20</b>	<b>7,630.57</b>	<b>19.60</b>	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน
1.1 งบประมาณต่ำกว่า 2 ล้านบาท	4,662	70	387	2,597	1,608	3,399.99	2,108.07	62.00	
1.2 งบประมาณตั้งแต่ 2 - 1,000 ล้านบาท	1,915	89	251	1,489	86	32,879.80	5,193.14	15.79	
1.3 งบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาท	14	-	3	10	1	2,653.41	329.36	12.41	
<b>2. งบกลาง</b>	<b>4,038</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>741</b>	<b>3,275</b>	<b>10,318.41</b>	<b>5,161.31</b>	<b>50.02</b>	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	3	2	583.00	41.54	7.13	ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้วเสร็จ 84 รายการ เบิกจ่าย 1,619.50 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 583.00 ล้านบาท
2.2 งบกลาง กปร.58	10	-	-	4	6	252.91	175.76	69.50	ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.87 ล้านบาท แล้วเสร็จ 91 รายการ เบิกจ่าย 147.01 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.59	66	-	1	42	23	1,312.05	880.54	67.11	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้วเสร็จ 39 รายการ เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05 ล้านบาท
2.4 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหายั่งยืน และอุทกภัย	999	-	17	419	563	5,736.18	1,859.19	32.41	ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 2 รายการ งบประมาณ 8.10 ล้านบาท คงเหลือ 1,048 รายการ งบประมาณ 5,757.43 ล้านบาท แล้วเสร็จ 49 รายการ ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 999 รายการ งบประมาณ 5,736.18 ล้านบาท
2.5 งบกลาง โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี 2559	2,672	-	4	245	2,423	2,376.53	2,151.29	90.52	ปริมาณงาน 2,677 รายการ งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท ยกเลิก 5 รายการ งบประมาณ 7.07 ล้านบาท คงเหลือ 2,672 รายการ งบประมาณ 2,376.53 ล้านบาท
2.6 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ(ฝักตบขวา)	286	-	-	28	258	57.74	52.99	91.77	ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท ยกเลิก 9 รายการ งบประมาณ 3.21 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเข้าซ้อนทับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 286 รายการ งบประมาณ 57.74 ล้านบาท
<b>3. เงินกู้</b>	<b>145</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>7,924.23</b>	<b>2,883.72</b>	<b>36.39</b>	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	114	-	7	107	-	6,717.83	2,755.19	41.01	ปริมาณงาน 723 รายการ ยอดจัดสรร 22,426.36 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้จริง 21,671.09 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 609 รายการ คงเหลือ 114 รายการ งบประมาณ 6,717.83 ล้านบาท
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	31	-	2	29	-	1,206.40	128.53	10.65	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอนจัดสรรแล้ว 31 รายการ งบประมาณ 1,206.40 ล้านบาท มีการแก้ไขชื่อ และอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณโอนจัดสรร จำนวน 4 รายการ
<b>4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559</b>	<b>494</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>358</b>	<b>136</b>	<b>5,183.67</b>	<b>1,361.39</b>	<b>26.26</b>	
4.1 เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559	494	-	-	358	136	5,183.67	1,361.39	26.26	ปริมาณงาน 606 รายการ งบประมาณ 5,269.15 ล้านบาท เงินทับ/หมดความจำเป็น จำนวน 112 รายการ งบประมาณ 85.48 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 494 รายการ งบประมาณ 5,183.67 ล้านบาท
<b>5. เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560</b>	<b>853</b>	<b>172</b>	<b>193</b>	<b>158</b>	<b>330</b>	<b>115.86</b>	<b>25.82</b>	<b>22.29</b>	
5.1 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560	853	172	193	158	330	115.86	25.82	22.29	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 0.08 ล้านบาท เนื่องจากรายการซ้ำ
<b>6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>733.33</b>	<b>157.17</b>	<b>21.43</b>	

กองแผนงาน

## 1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

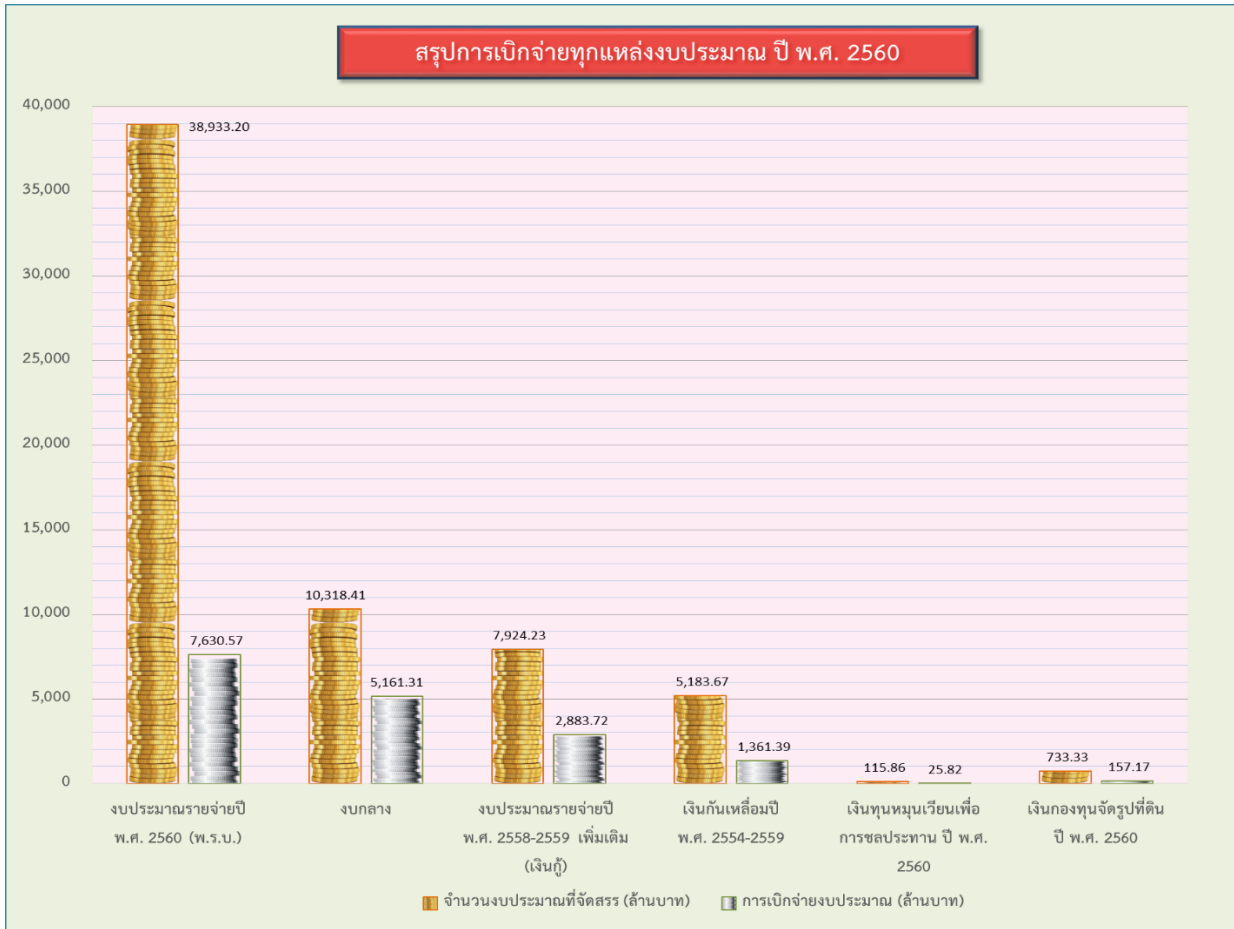

## 2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

