



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖
 ที่ ผตป.ผง. ๑๓๗ /๒๕๖๐ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

รพ. ๙๔๗

เรียน ผอ.ผง.


ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้
 งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อ
 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เฟิ่งคำ)

ผตป.ผง.


เรียน อช. สำเนาเรียน รชบ. รรส. รรช. รรธ. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
 เพื่อโปรดทราบ



(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)
 ผอ.ผง.
 ๕๗ ก.พ. ๒๕๖๐

- ททบ

- เรียน ผอ.สอผ



เพื่อกทมน

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 6 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 63,432.13 ล้านบาท ปริมาณงาน 12,168 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ปริมาณงาน 6,583 รายการ งบประมาณ 38,933.20 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,318.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.37

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 128 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.94
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 498 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.56
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 3,901 รายการ คิดเป็นร้อยละ 59.26
- แล้วเสร็จ 2,056 รายการ คิดเป็นร้อยละ 31.23

2. งบกลาง ปริมาณงาน 4,035 รายการ งบประมาณ 10,318.36 ล้านบาท เบิกจ่าย 5,554.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.83

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.25
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 667 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.53
- แล้วเสร็จ 3,358 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.22

3. เงินกู้ ปริมาณงาน 143 รายการ งบประมาณ 7,967.49 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,011.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.80

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.59
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 135 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.41

4. เงินกันเหลือมปี พ.ศ. 2554-2559 ปริมาณงาน 496 รายการ งบประมาณ 5,350.01 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,462.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.33

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 354 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.37
- แล้วเสร็จ 142 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.63

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 853 รายการ งบประมาณ 126.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 36.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.65

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 167 รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.58
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 181 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.22
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 151 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.70
- แล้วเสร็จ 354 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.50

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 737 ล้านบาท เบิกจ่าย 193.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.32

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.72
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 57 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.28

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560


กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งหมด	12,168	295	698	5,265	5,910	63,432.13	18,577.37	29.29	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)	6,583	128	498	3,901	2,056	38,933.20	8,318.96	21.37	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน
1.1 งบประมาณต่ำกว่า 2 ล้านบาท	4,658	54	305	2,356	1,943	3,399.99	2,242.80	65.96	
1.2 งบประมาณตั้งแต่ 2 - 1,000 ล้านบาท	1,911	74	190	1,535	112	32,879.80	5,746.80	17.48	
1.3 งบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาท	14	-	3	10	1	2,653.41	329.37	12.41	
2. งบกลาง	4,035	-	10	667	3,358	10,318.36	5,554.66	53.83	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	3	2	583.00	41.54	7.12	ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้วเสร็จ 84 รายการ เบิกจ่าย 1,619.50 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 583.00 ล้านบาท
2.2 งบกลาง กปร.58	10	-	-	4	6	252.91	175.76	69.50	ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.87 ล้านบาท แล้วเสร็จ 91 รายการ เบิกจ่าย 147.01 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.59	66	-	1	35	30	1,312.05	980.14	74.70	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้วเสร็จ 39 รายการ เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05 ล้านบาท
2.4 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหายั่งยืน และอุทกภัย	999	-	9	371	619	5,736.18	2,132.38	37.17	ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 2 รายการ งบประมาณ 8.10 ล้านบาท คงเหลือ 1,048 รายการ งบประมาณ 5,757.43 ล้านบาท แล้วเสร็จ 49 รายการ ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 999 รายการ งบประมาณ 5,736.18 ล้านบาท
2.5 งบกลาง โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี 2559	2,672	-	-	244	2,428	2,376.53	2,170.99	91.35	ปริมาณงาน 2,677 รายการ งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท ยกเลิก 5 รายการ งบประมาณ 7.07 ล้านบาท คงเหลือ 2,672 รายการ งบประมาณ 2,376.53 ล้านบาท
2.6 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ(ฝักคบขวา)	283	-	-	10	273	57.69	53.85	93.34	ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท ยกเลิก 12 รายการ งบประมาณ 3.21 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 283 รายการ งบประมาณ 57.69 ล้านบาท
3. เงินกู้	143	-	8	135	-	7,967.49	3,011.42	37.80	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	112	-	7	105	-	6,761.09	2,853.16	42.20	ปริมาณงาน 723 รายการ ยอดจัดสรร 22,426.36 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้จริง 21,671.09 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 611 รายการ คงเหลือ 112 รายการ งบประมาณ 6,761.09 ล้านบาท
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	31	-	1	30	-	1,206.40	158.27	13.12	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอนจัดสรรแล้ว 31 รายการ งบประมาณ 1,206.40 ล้านบาท มีการแก้ไขชื่อ และอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณโอนจัดสรร จำนวน 4 รายการ
4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559	496	-	-	354	142	5,350.01	1,462.25	27.33	ปริมาณงาน 606 รายการ งบประมาณ 5,350.01 ล้านบาท เงินพัน/หมื่นความจำเป็น จำนวน 110 รายการ งบประมาณ 85.48 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 496 รายการ งบประมาณ 5,264.53 ล้านบาท
5. เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560	853	167	181	151	354	126.07	36.12	28.65	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 0.08 ล้านบาท เนื่องจากรายการซ้ำ
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	58	-	1	57	-	737.00	193.95	26.32	

กองแผนงาน

1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

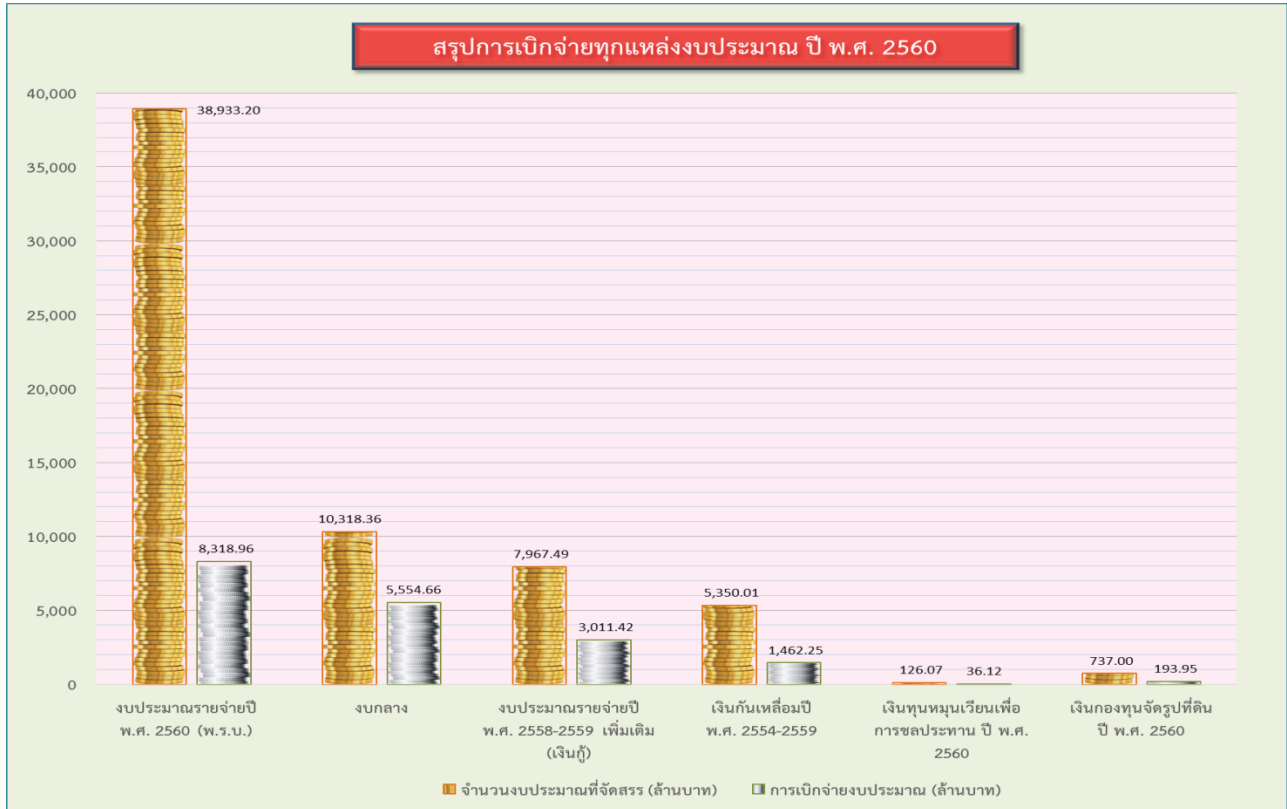

2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

