



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖ ๓๑๐๑๑๕/๒๕๖๕.๑.๒๕

ที่ กผง ๐๖/๔๒๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ๓๑๑๕

เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๙ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๒,๐๕๐.๓๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๘๒๑.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๗๘๐.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๗ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๒,๐๖๘.๐๕ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๒,๖๙๖.๙๓ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๔๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐๕ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ และยกเลิก จำนวน ๙ รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๑ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๗๑๔.๘๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๓๘๑.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๖ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๘๙๘.๐๔ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๔๑๙.๔๙ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ รายการ (อนุมัติแผน จำนวน ๒ รายการ เปิดซอง จำนวน ๑ รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน ๑ รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๙๓ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๖ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายงาน ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาด้วยแล้ว

อวิศ ธีระ

(นางสาวอวิศ ดั่งนุ่น)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รบ. รร. รร. รร. และผู้อำนวยการสำนัก/กอง เพื่อโปรดทราบ

อวิศ ธีระ

นายวิชา แก้วมี

ผอ.ผง.

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕

-ทราบ

-เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ภาค., ทน.๑-๙ มอ.

เพื่อโปรดทราบ

อช.

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕

อช.

โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้อย่างพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 219 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2,050.38 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,821.06 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,780.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.77 แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 2,068.05 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 2,696.93 ตัน คิดเป็นร้อยละ 130.41 ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 205 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ และยกเลิก จำนวน 9 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- **Para Asphalt Concrete** จำนวน 161 รายการ งบประมาณจัดสรร 1,332.78 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,323.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.31 แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 795.88 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,318.66 ตัน คิดเป็นร้อยละ 165.69 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 151 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- **Para Soil Cement** จำนวน 29 รายการ งบประมาณจัดสรร 153.95 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 153.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 1,210.73 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,324.03 ตัน คิดเป็นร้อยละ 109.36 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 28 รายการ และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คือ ซ่อมแซมถนนท้าย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3/2563 มีมติให้ชะลอแผนการดำเนินงาน โดยให้ส่วนความปลอดภัยเขื่อนของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อศึกษาและสรุปรูปแบบในการแก้ไขและปรับปรุงเขื่อนห้วยยาง จังหวัดสระแก้ว อย่างเร่งด่วน

- **โครงการขยายผลทุ่นยางพาราดักผักตบชวา (Para – Log Boom-I)** จำนวน 1 รายการ งบประมาณจัดสรร 82.85 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 82.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ

- **รายการงานโอนเปลี่ยนแปลง** จำนวน 28 รายการ งบประมาณจัดสรร 251.48 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 220.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.59 แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 61.44 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 54.24 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.28 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 25 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพารา ในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าหัวงาน โครงการชลประทาน รวมทั้งสิ้น 131 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท ได้รับงบประมาณ จัดสรร 1,714.81 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 381.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.26 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 898.04 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 419.49 ตัน คิดเป็นร้อยละ 46.71 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ (อนุมัติแผน จำนวน 2 รายการ เปิดซอง จำนวน 1 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 1 รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 93 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 26 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ โดยจำแนกตาม ประเภทงาน ได้แก่

- **Para Asphalt Concrete** จำนวน 127 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,802.41 ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร 1,683.49 ล้านบาท เบิกจ่าย 358.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.30 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 792.54 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 345.33 ตัน คิดเป็นร้อยละ 43.57 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ (อนุมัติแผน จำนวน 2 รายการ เปิดซอง จำนวน 1 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 1 รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง จำนวน 91 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 รายการ และยกเลิกจำนวน 8 รายการ เนื่องจาก ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

- **Para Soil Cement** จำนวน 4 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 34.27 ล้านบาท ได้รับ งบประมาณจัดสรร 31.32 ล้านบาท เบิกจ่าย 23.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.07 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 105.50 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 74.16 ตัน คิดเป็นร้อยละ 70.29 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565

กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ 17 พฤษภาคม 2565





การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดำเนินการต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2565



พ.ร.บ. 2564			
ประเภท	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,821.06	219	2,068.05
ผล	1,780.53 (97.77%)	205	2,696.93 (130.41%)



Para Asphalt Concrete			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,332.78	161	795.88
ผล	1,323.58 (99.31%)	151	1,318.66 (165.69%)

Para Soil Cement			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	153.95	29	1,210.73
ผล	153.83 (99.92%)	28	1,324.03 (109.36%)

รายการโอนเปลี่ยนแปลง			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	251.48	28	61.44
ผล	220.27 (87.59%)	25	54.24 (88.28%)


Para. - Log Boom-I		
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)
แผน	82.85	1
ผล	82.85 (100%)	1



หมายเหตุ : ยกเลิกจำนวน 9 รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

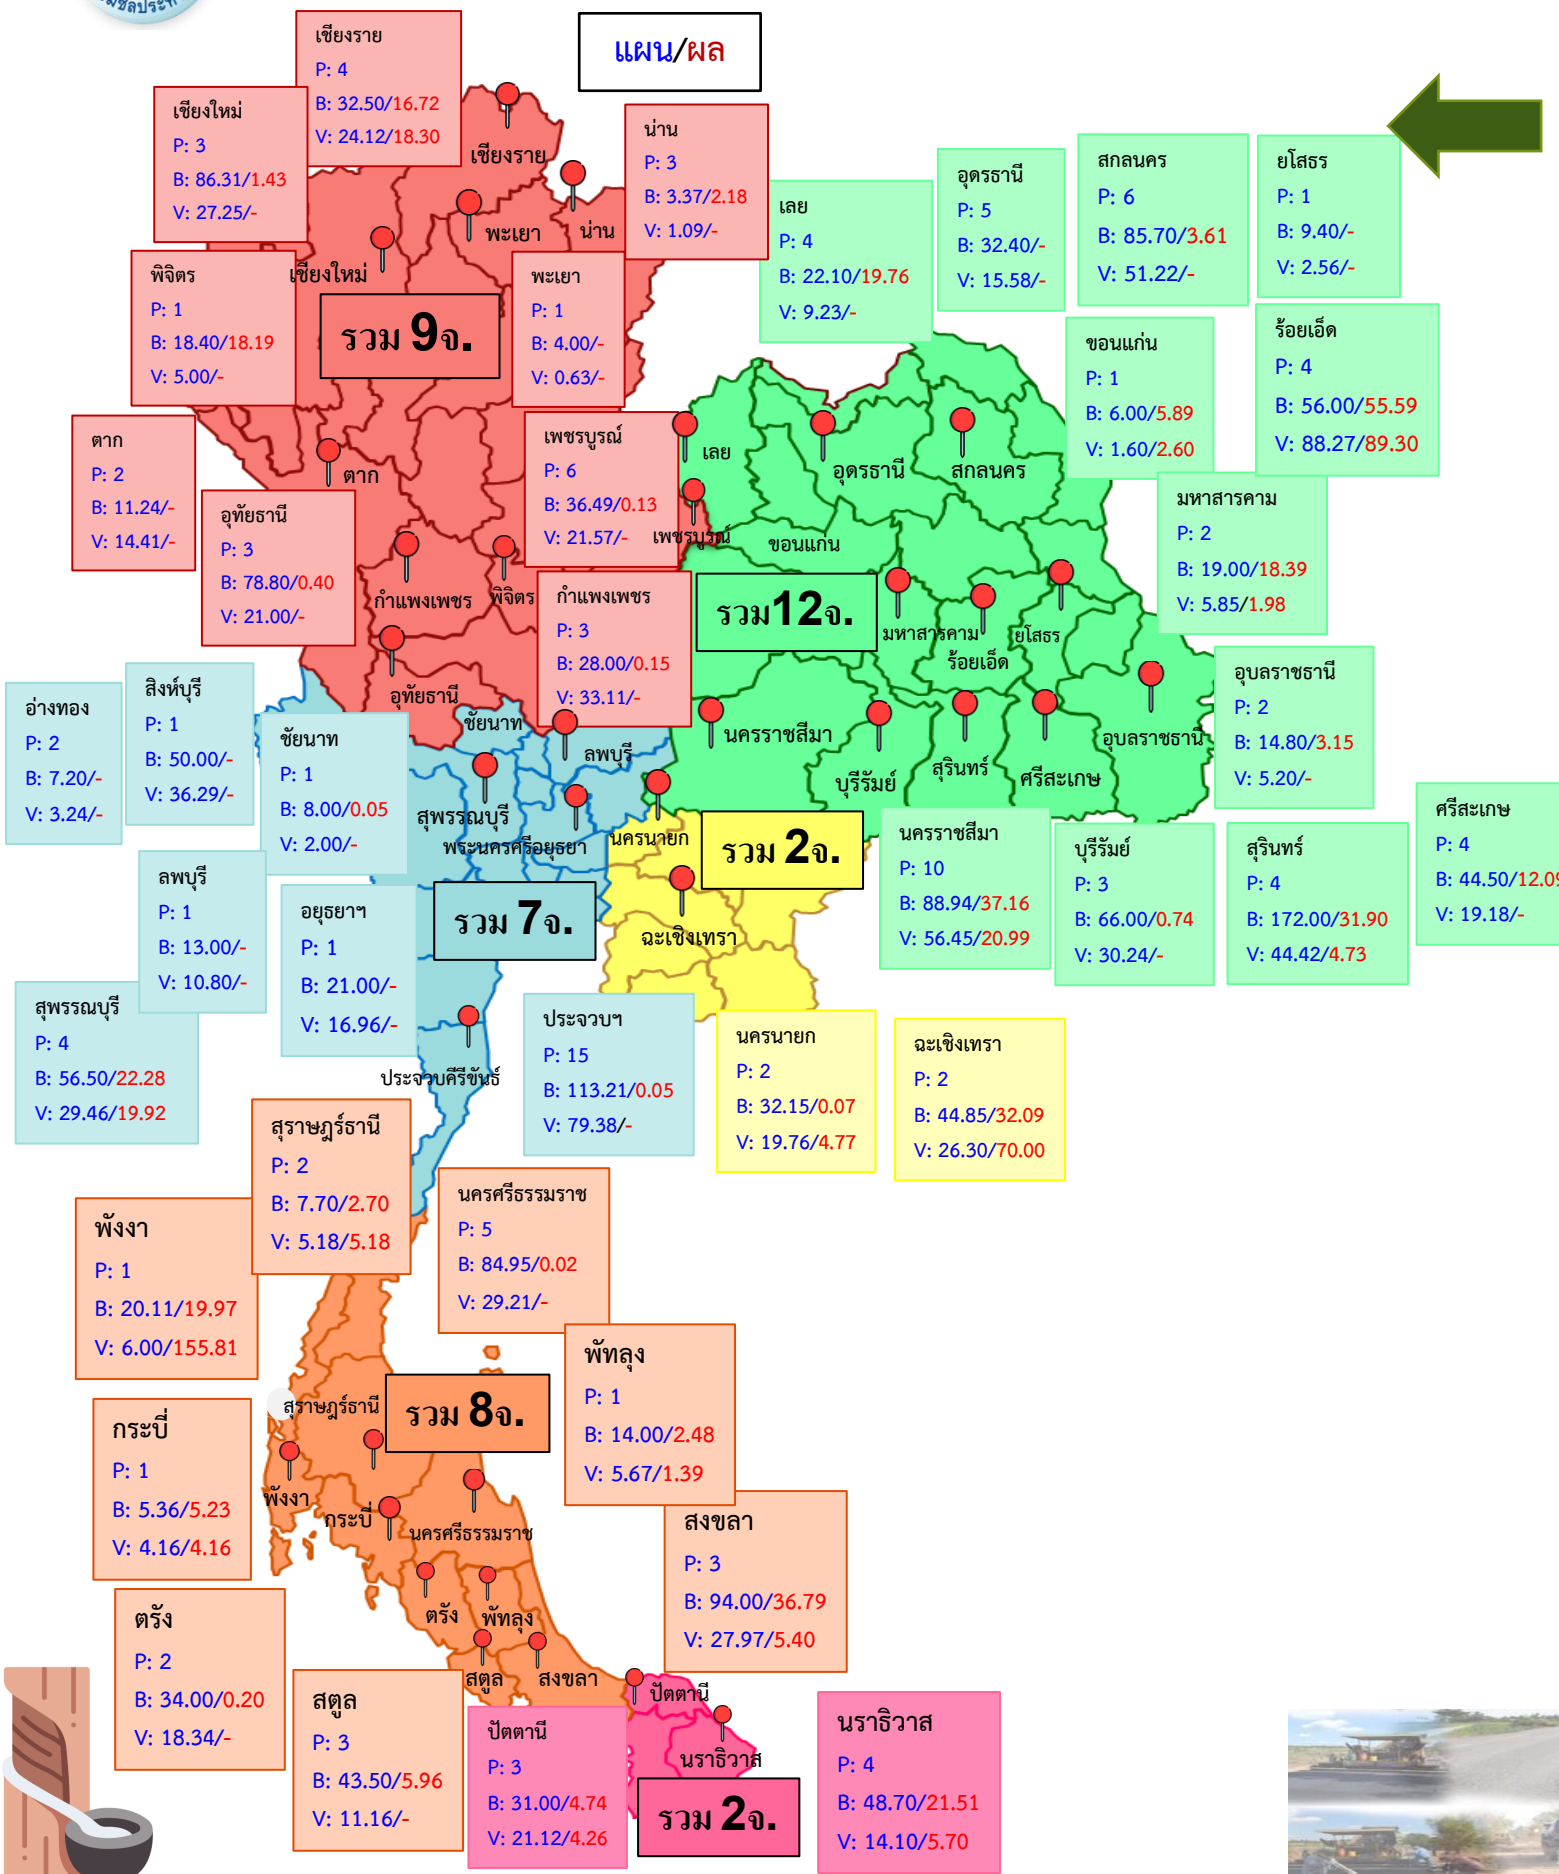

แผนการดำเนินงาน		P (PA-PS)	B	V
ภาค/จังหวัด	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	น้ำยางชั้น (ตัน)	
รวม 40 จ.	131 (127-4)	1,836.68	898.04	
เหนือ	26 (26)	299.11	148.17	
ตะวันออกเฉียงเหนือ	46 (43-3)	616.84	329.80	
กลาง	25 (25)	268.91	178.13	
ตะวันออก	4 (4)	77.00	46.06	
ใต้	23 (22-1)	495.12	160.65	
ใต้ชายแดน	7 (7)	79.70	35.22	

ผลการดำเนินงานภาพรวม				
ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,836.68	1,714.81	131	898.04
ผล	381.75 (20.78%)	381.75 (22.26%)	26	419.49 (46.71%)


PA : Para Asphalt Concrete				
ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,802.41	1,683.49	127	792.54
ผล	358.55 (19.89%)	358.55 (21.30%)	24	345.33 (43.57%)

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ (อนุมัติแผน 2 รายการ เปิดซอง 1 รายการ อนุมัติรับราคา 1 รายการ)
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 91 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 รายการ และยกเลิก 8 รายการ
เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

PS : Para Soil Cement				
ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	34.27	31.32	4	105.50
ผล	23.20 (67.70%)	23.20 (74.07%)	2	74.16 (70.29%)

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ

- หมายเหตุ
- PA : Para Asphalt Concrete
 - PS : Para Soil Cement



รายละเอียดรายการงานโครงการส่งเสริมการใช้น้ำในหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	ประเภททางพารา	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผนปริมาณการใช้ ยางพารา (ตัน)
	รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 รายการ			42,700,000	29.83
1	(28) ซ่อมสร้างผิวทางเข้าห้วงงานโครงการ ระยะทาง 2.74 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [2157]	สำนักงานชลประทานที่ 9	Para Asphalt Concrete	24,000,000	14.99
2	(33) ปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณห้วงงาน โครงการอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี - [2162]	สำนักงานชลประทานที่ 10	Para Asphalt Concrete	13,000,000	10.80
3	(1.37) ซ่อมแซมถนนลาดยางคันโอบ ปตร.บางแก้ว ความยาว 0.48 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง - [2098]	สำนักงานชลประทานที่ 10	Para Asphalt Concrete	1,700,000	1.81
4	(1.46) ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณห้วงงานอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม ความยาว 1,200 ม. โครงการชลประทานประจวบประจวบคีรีขันธ์ ตำบลเขาหลัก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [2107]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	4,000,000	2.23
