



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๔๙๖/๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ผง.

๒๕๕๔๐

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันมาด้วยแล้ว

(นางสลิทธิพย์ วีระวงศ์)

ตป.๒ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.
๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

โดย ผอ.ธช., ผอ.กท., ทท.๑-๕ มอ.

และ ผมท.มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

13 ส.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 7 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 100,664.33 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 55,244.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.88 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 14,589 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 321 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.20 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 594 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.07 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7,073 รายการ คิดเป็นร้อยละ 48.48 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6,438 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.13 และยกเลิก จำนวน 163 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.12 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 77,143.43 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 39,781.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.57 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,317.50 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 4,711.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.39 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 69,825.93 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 35,069.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.22 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,659 รายการ (รายการ พ.ร.บ. 65 จำนวน 9,554 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ) ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 41 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.42 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6,464 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.92 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2,986 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.92 และยกเลิก จำนวน 152 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.57 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น ดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น

2. งบเงินกู้ยืมเบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 7,455.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.07 งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 792.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.02 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 152.79 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 56.46 ล้านบาท และเบิกไม่ทันตามกำหนด 583.24 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 3,035.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.91 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,068 รายการ (รายการเงินกู้ยืมเบิกเหลือปี จำนวน 1,067 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 279 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.12 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 786 รายการ คิดเป็นร้อยละ 73.60 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.28 ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เนื่องจากราษฎรบางรายเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ และเกิดข้อพิพาทเรื่องมรดก เนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่ดินได้

3. งบกลาง พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 4,605.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,083.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.96 มีจำนวนรายการ 1,188 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 78 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.57 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,108 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.26 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 เนื่องจากมีการแก้ไขสถานที่ดำเนินการจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

4. งบกลาง พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 1,666.06 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 39.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.35 มีจำนวนรายการ 649 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรร งบประมาณจากสำนักงบประมาณจำนวน 305 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.99 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 184 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.35 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 158 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.35 และยกเลิก 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.31 เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่า สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

5. เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 งบประมาณ จำนวน 4,224.82 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,877.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.78 มีจำนวนรายการ 384 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.65 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 367 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 95.57 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น ดำเนินการแล้ว

6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 806.12 ล้านบาท เบิกจ่าย 360.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.75 มีจำนวนรายการ 1,541 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 369 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.95 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.32 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,167 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75.73

7. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 646.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.17 มีจำนวนรายการ 100 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 75 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.00 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.00 คือ รายการ จัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ระยะที่ 2 เนื่องจากการก่อสร้างจะมีผลกระทบกับการเพาะปลูกพืชผลทางการ เกษตรของเกษตรกร



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565

รายละเอียดข้อมูล



1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

- 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง
- 2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง
- 2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
- 2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
- 2.7 สถิติการเบิกจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
- 2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

3 งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)				หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่เบิกเงินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น	100,664.53	55,244.23	54.88	14,589	321	594	7,073	6,438
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (กรมบัญชีกลาง)	77,143.43	39,781.10	51.57	9,659	16	41	6,464	2,986
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,317.50	4,711.74	64.39					
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	69,825.93	35,069.36	50.22	9,659				
2. งบเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนา พ.ศ. 2563	11,283.76	7,455.41	66.07	1,068		41	6,464	2,986
3. งบกลาง พ.ศ. 2564	4,605.14	3,083.55	66.96	1,188				
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	3,419.87	2,076.70	60.72	1,117				
- โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียนและยิมเนเซียมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	426.47			24			24	
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183.31	485.20	41.00	44			30	14
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564	1,582.30	1,495.08	95.70	1,046			4	1,040
- โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน	94.70	0.10	0.11	1			1	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	83.09	63.32	76.21	1			1	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหัวแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	70.00	33.00	47.14	1			1	
3.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี พ.ศ. 2564	1,185.27	1,006.85	84.95	71			17	54
4. งบกลาง พ.ศ. 2565	1,666.06	39.17	2.35	649	305	184	158	
4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565	1,126.19	0.10	0.01	620	305	177	136	
4.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565	539.87	39.07	7.24	29		7	22	
5. เงินกู้ ประจำปี พ.ศ. 2564	4,224.82	3,877.52	91.78	384			14	367
6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอุปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2565	806.12	340.71	44.75	1,541		369	5	1,167
7. จัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565	935.00	646.77	69.17	100			75	24


- ยกเลิก 3 รายการ
- ตัดไม่ขยาย/ขยาย PO/เบิกไม่ทัน
จำนวน 792.49 ล้านบาท
- คงเหลือต้องดำเนินการต่อ
จำนวน 3,035.86 ล้านบาท

ยกเลิก 163 รายการ
ยกเลิก 152 รายการ
ยกเลิก 3 รายการ
ยกเลิก 2 รายการ
ยกเลิก 3 รายการ
ยกเลิก 1 รายการ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจาก ระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565

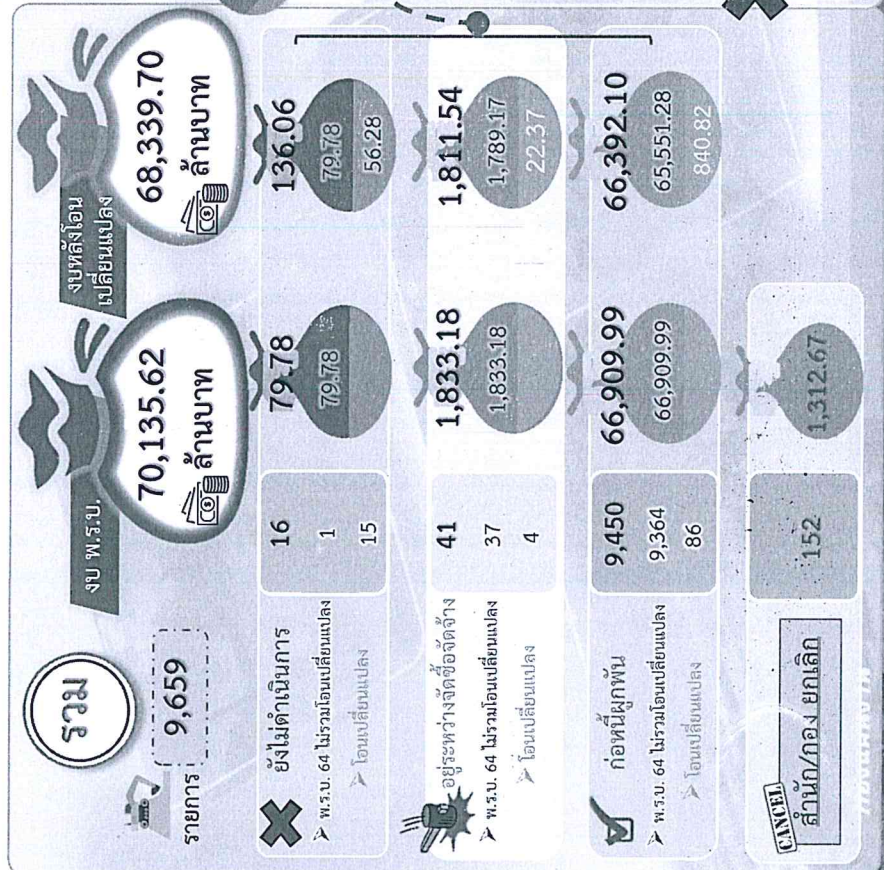

พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ (พ.ร.บ.)

9,554 รายการ

งบลงทุน

70,135.62 ล้านบาท

67,420.23 ล้านบาท

โอนเปลี่ยนแปลง

105 รายการ

งบลงทุน

งบประมาณ
หลังโอนจัดสรร

919.47 ล้านบาท

ผลการก่อหนี้ผูกพัน

ก่อนนี้ผูกพัน (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 9,450 รายการ (99.40%)
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 66,392.10 ล้านบาท (97.15%)

แล้วเสร็จ จำนวน 2,986 รายการ
งบประมาณ 6,630.47 ล้านบาท

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 41 รายการ (0.43%)
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,811.54 ล้านบาท (2.65%)

- อนุมัติแผน 9 รายการ งบประมาณ 37.19 ล้านบาท
- ประกาศร่าง TOR 1 รายการ งบประมาณ 220.00 ล้านบาท
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ งบประมาณ 679.99 ล้านบาท
- เปิดซอง 9 รายการ งบประมาณ 694.51 ล้านบาท
- อนุมัติรับราคา 17 รายการ งบประมาณ 179.85 ล้านบาท

ยังไม่ได้เป็นการ จำนวน 16 รายการ (0.17%)
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 136.06 ล้านบาท (0.20%)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขยายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GEMIS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
จากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565

หน่วยงน	งบประมณ พ.ร.บ.	งบสัณยน เปลยนแปลง	เบญกจ่าย	รสนะ	จนวนรายการ	ย้งไมดำเนินการ		อยุ่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำสัญญากน							
						จนวนรายการ	งบสัณยนเปลยนแปลง (ล้านบาท)	จนวนรายการ	งบสัณยนเปลยนแปลง (ล้านบาท)	จนวนรายการ	งบสัณยนเปลยนแปลง (ล้านบาท)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,822.95	68,339.70	34,471.22	50.44	9,507	16	136.06	41	1,811.54	9,450	66,392.10	1,760	658	1,074	1,002	1,970	2,986
สชป. 1	1,604.88	1,582.69	1,059.55	66.95	363	1	1.30			362	1,581.39	15	14	26	48	149	110
สชป. 2	1,890.25	1,836.59	1,094.81	59.61	450					450	1,836.59	89	27	107	42	117	68
สชป. 3	2,334.81	2,319.47	1,102.73	47.54	343					343	2,319.47	51	25	45	58	85	79
สชป. 4	1,074.89	1,084.34	653.62	60.28	495			2	9.68	493	1,074.66	132	60	67	43	82	109
สชป. 5	2,640.61	2,699.94	1,663.45	61.61	602					602	2,699.94	51	34	59	53	181	224
สชป. 6	2,646.30	2,786.47	1,818.09	65.25	531					531	2,786.47	11	12	30	53	139	286
สชป. 7	2,349.87	2,324.15	2,081.25	89.55	510					510	2,324.15	17	16	47	44	123	263
สชป. 8	4,016.81	4,149.36	1,385.41	33.39	571			1	0.95	570	4,148.41	85	44	45	76	85	235
สชป. 9	2,437.91	2,372.72	1,253.79	52.84	685	4	6.24	1	20.33	680	2,346.15	30	55	84	88	192	231
สชป. 10	1,337.10	1,323.77	506.02	38.23	589			4	3.25	585	1,320.51	140	43	65	68	142	127
สชป. 11	1,507.05	1,437.17	495.38	34.47	555	1	0.57	2	224.50	552	1,212.11	320	31	28	22	76	75
สชป. 12	2,416.48	2,417.66	1,100.79	45.53	650			1	0.98	649	2,416.68	91	53	63	88	151	203
สชป. 13	2,130.91	2,087.66	1,031.78	49.42	636			4	12.40	632	2,075.26	87	83	112	70	191	89
สชป. 14	3,273.65	3,279.58	1,532.99	46.74	302	2	8.50	3	3.29	297	3,267.79	47	32	56	37	39	86
สชป. 15	1,887.06	1,803.50	619.65	34.36	449			2	4.95	447	1,798.55	245	22	40	29	46	65
สชป. 16	3,057.93	3,015.04	727.24	24.12	593			1	100.00	592	2,915.04	64	41	46	47	38	356
สชป. 17	682.65	701.39	319.70	45.58	235			4	23.87	231	677.52	5	8	25	32	36	125
กทอ.	12,363.12	11,808.61	6,645.61	56.28	173	1	79.78	2	275.15	170	11,453.68	101	12	14	22	10	11
สทอ.	12,268.92	12,372.79	5,014.64	40.53	171	1	1.14	3	979.00	167	11,392.65	93	19	26	8	8	13
สธอ.	695.81	692.25	152.90	22.09	205			4	14.67	201	677.59	13	14	71	56	25	22
สค.	742.05	734.19	519.75	70.79	210					210	734.19	5	6	14	6	16	163
สธ.	531.51	528.41	344.83	65.26	43	1	0.37			42	528.04	6	1	3	19	13	
สท.	549.48	562.92	123.78	21.99	34			1	25.00	33	537.92	33					2
สธ.	376.65	396.49	155.65	39.26	12	2	19.84	1	40.00	9	336.65	6		1	1	4	22
สค.	138.22	137.54	112.60	81.87	38					38	137.54	2	2	1	4	9	1
สค.	82.68	92.24	0.97	1.05	6	1	9.39	2	47.58	3	35.26	2					
สท.	4.71	4.71	3.82	81.20	3					3	4.71	3					
สท.	3,531.61	3,530.07	2,925.70	82.88	47			3	25.94	44	3,504.13	14	4	3	4	11	8
กทอ.		0.06	0.06	99.87	1					1	0.06	1					
สท.		8.50			1	1	8.50										
สท.		0.42			1	1	0.42										
Lump Sum	249.00	249.00	24.64	9.90	3					3	249.00	3					

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 152 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,312.67 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น จังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น
2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 919.47 ล้านบาท

2.4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขยายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565


หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน รายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อมูลอื่น							
						จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)							
										0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%		
รวม	68,822.95	68,339.70	34,471.22	50.44	9,507	16	136.06	41	1,811.54	9,450	66,392.10	1,760	658	1,074	1,002	1,970	2,986
โครงการเขื่อนหน้าจอก จังหวัดอุดรธานี	809.00	789.57	431.68	54.67	10					10	789.57	2	2	5		1	
โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,561.63	2,607.19	1,125.32	43.16	14			1	676.20	13	1,930.99	8	1	1		1	2
โครงการจัดการแหล่งน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังจังหวัดประจวบ	27,440.29	27,034.08	14,987.54	55.44	629	2	19.84	7	303.29	620	26,710.96	205	80	95	80	132	28
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	499.74	519.35	200.14	38.54	9	1	79.78			8	439.57	7					1
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครราชสีมาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา	789.37	1,029.41	241.67	23.48	13					13	1,029.41	7	2	4			
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่2) จังหวัดสงขลา	141.06	141.06			1					1	141.06	1					
โครงการประติรูประบบน้ำบ้านก้อพ้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	99.56	69.39	61.55	88.70	4					4	69.39	2	1				1
โครงการประติรูประบบน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	312.00	312.00	74.97	24.03	4					4	312.00	2	2				
โครงการประติรูประบบน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย	72.00	91.19	41.96	46.02	4					4	91.19	1		2			1
โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย	275.66	275.66	8.43	3.06	6					6	275.66	4	1	1			
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,308.96	6,347.87	2,264.59	35.67	380	1	6.00	4	18.05	375	6,323.82	100	53	56	56	76	34
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	10,917.06	10,768.92	4,155.34	38.59	297			2	237.60	295	10,531.32	106	37	67	42	25	18
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	1,033.27	1,201.23	316.41	26.34	14			1	228.00	13	973.23	8	2	1	2		
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเชื่อมแม่ทวนอุบลราชาร จังหวัดชัยภูมิใหม่	1,298.06	859.89	597.24	69.46	12					12	859.89	4	3	2	1	1	1
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,193.40	2,179.56	1,193.59	54.76	748			3	236.37	745	1,943.20	107	46	91	53	147	301
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,509.86	10,508.33	6,744.63	64.18	6,761	6	7.91	19	60.38	6,736	10,440.03	1,080	393	701	715	1,456	2,391
โครงการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	167.77	237.64	27.10	11.41	5					5	237.64	3		1		1	
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	108.00	108.00	100.02	92.61	2					2	108.00	2					
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	104.14	117.34	67.49	57.52	6					6	117.34	5		1			
โครงการอ่างเก็บน้ำก้นป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	348.02	348.02	32.93	9.46	7					7	348.02	5		1		1	
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	637.62	637.62	490.88	76.99	5					5	637.62	3				1	1
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	388.00	388.00	205.14	52.87	3					3	388.00	3					
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ม จังหวัดฉะเชิงเทรา	525.00	404.98	300.64	74.24	3					3	404.98	1	1				1
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี	313.78	361.03	298.65	82.72	6					6	361.03				1	2	2
ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	969.71	1,002.38	503.30	50.21	564	6	22.53	4	51.65	554	928.20	94	34	44	52	126	204

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 152 รายการ ณ พ.ร.บ. 1.312.67 ส่วนบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น จังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น
2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 919.47 ล้านบาท

2.5

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565

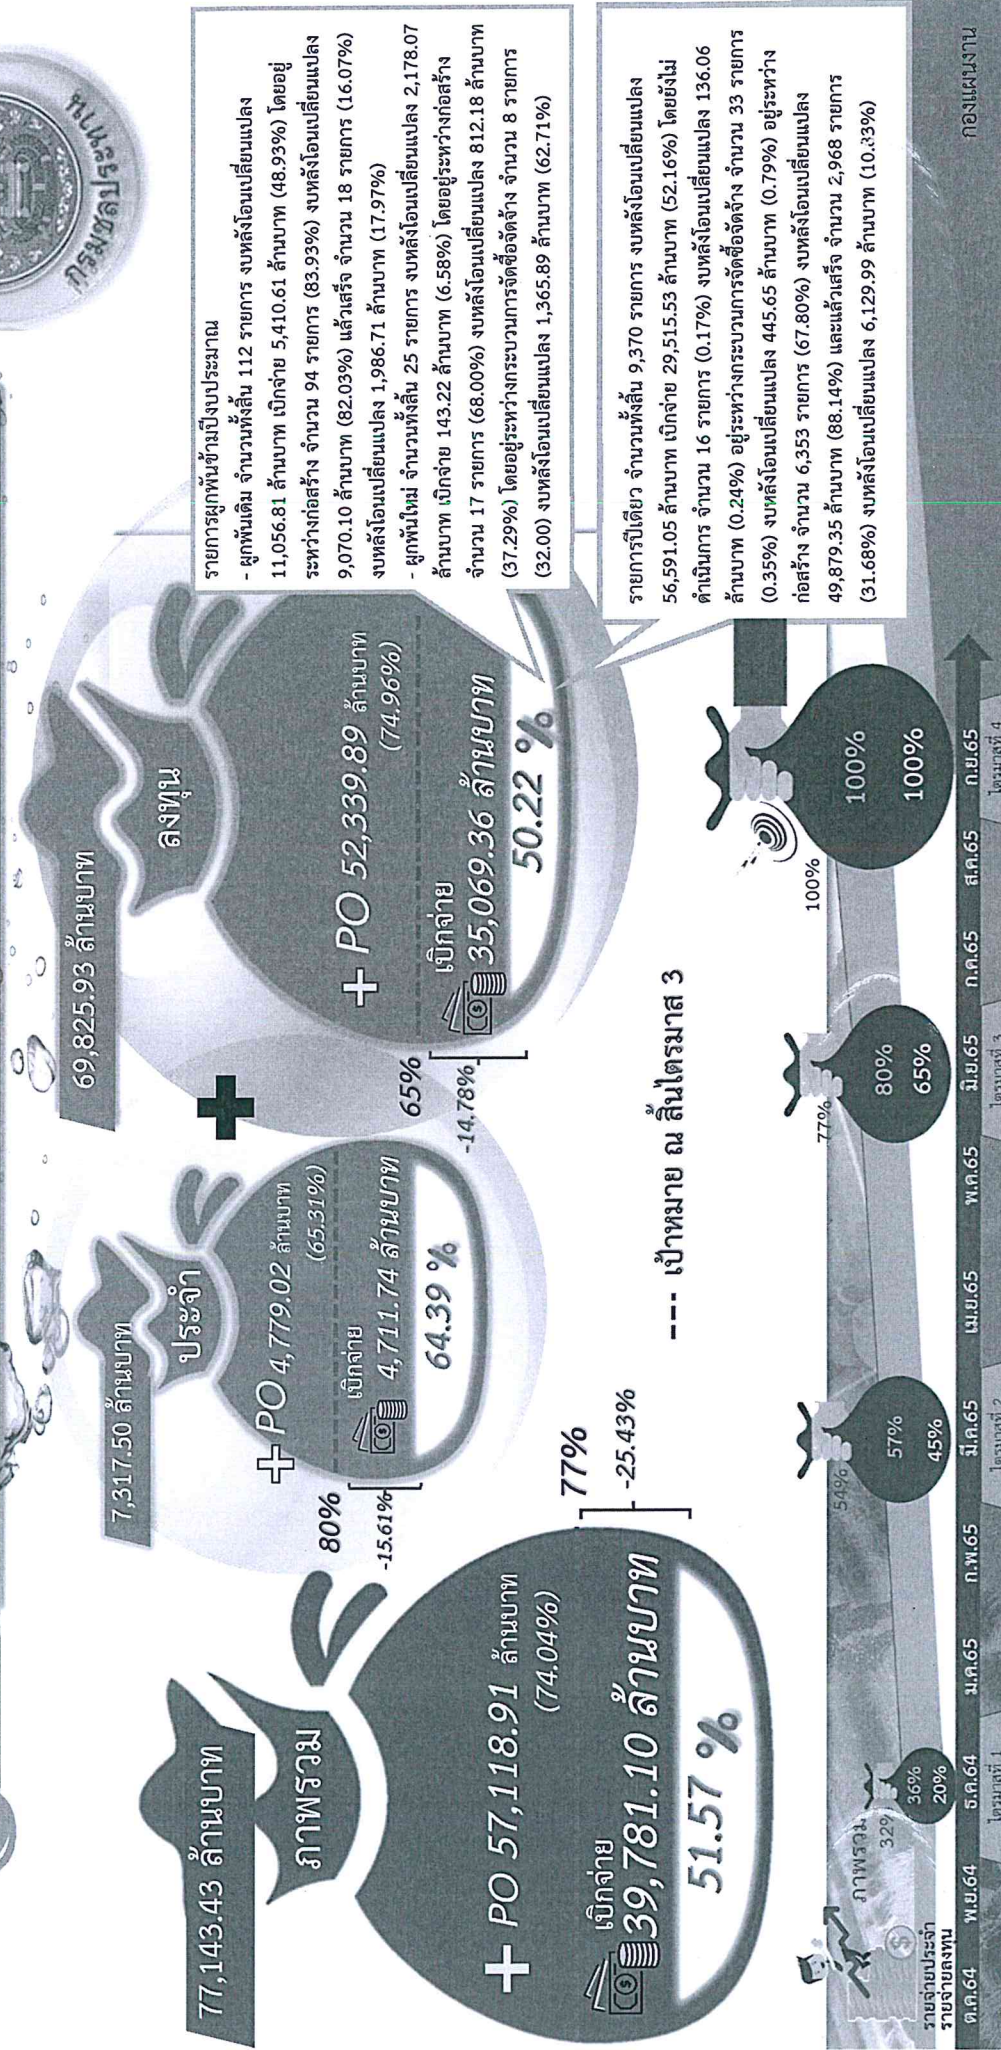

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

- ผู้ผูกพันเดิม จำนวนทั้งสิ้น 112 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 11,056.81 ล้านบาท เบิกจ่าย 5,410.61 ล้านบาท (48.93%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 94 รายการ (83.93%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 9,070.10 ล้านบาท (82.03%) แล้วเสร็จ จำนวน 18 รายการ (16.07%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,986.71 ล้านบาท (17.97%)

- ผู้ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,178.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 143.22 ล้านบาท (6.58%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (68.00%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 812.18 ล้านบาท (37.29%) โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ (32.00%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,365.89 ล้านบาท (62.71%)

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 9,370 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 56,591.05 ล้านบาท เบิกจ่าย 29,515.53 ล้านบาท (52.16%) โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 16 รายการ (0.17%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 136.06 ล้านบาท (0.24%) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 33 รายการ (0.35%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 445.65 ล้านบาท (0.79%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 6,353 รายการ (67.80%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 49,879.35 ล้านบาท (88.14%) และแล้วเสร็จ จำนวน 2,968 รายการ (31.68%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 6,129.99 ล้านบาท (10.33%)

2.6

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565


77,143.43 ล้านบาท

ภาพรวม

เบิกจ่าย

39,781.10 ล้านบาท

51.57%

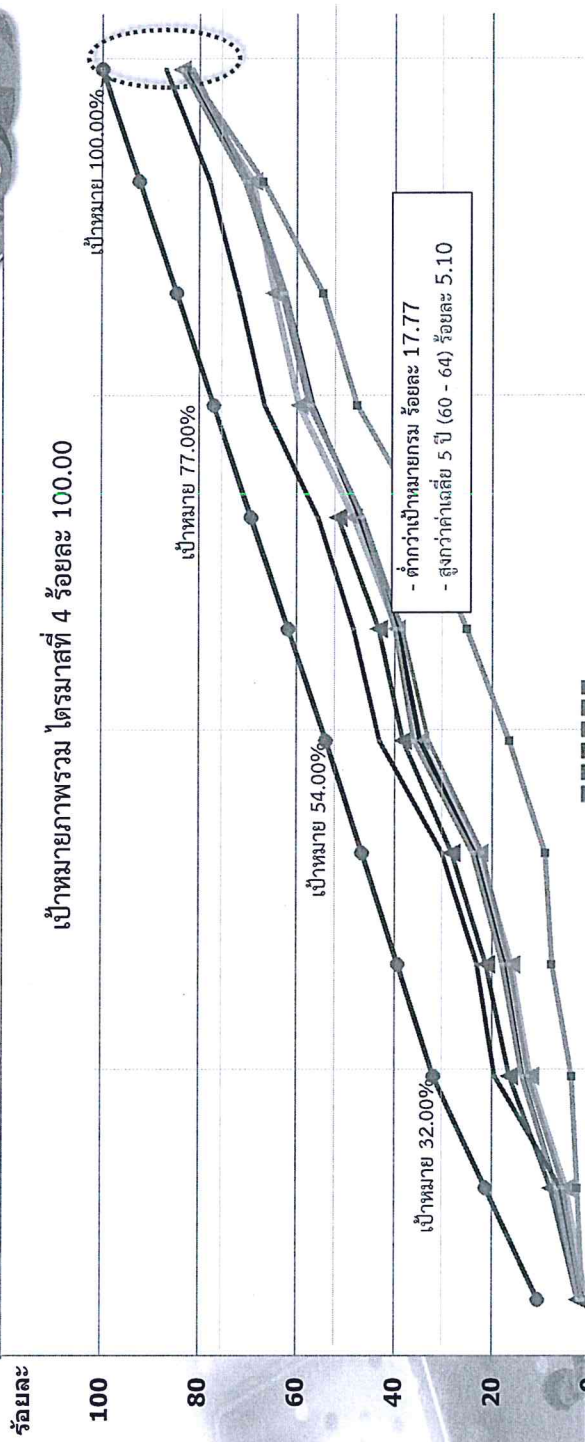

	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
➔ เป้าหมายกรม ปี 65	10.67	21.34	32.00	39.33	46.66	54.00	61.67	69.34	77.00	84.67	92.34	100.00
— ผลปี 65 (77,143.43)	2.45	7.97	16.49	21.25	28.37	38.31	43.27	51.57				
— ผลปี 64 (74,106.98)	0.66	4.91	12.24	16.05	22.61	34.76	39.61	48.38	59.48	64.67	68.91	83.67
— ผลปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	7.84	9.23	16.56	25.26	34.54	47.70	54.68	66.97	82.54
— ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	83.17
— ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
— ผลปี 60 (47,004.27)	1.50	5.94	19.46	23.11	30.30	43.12	48.35	55.72	66.56	71.83	77.86	86.95
— เฉลี่ย 5 ปี (60-64)	1.46	5.43	12.62	16.50	21.98	33.08	38.50	46.47	57.49	63.16	70.82	83.54


กองแผนงาน

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

2.7

สถิติการเบิกจ่ายบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ เดือนพฤษภาคม 2565

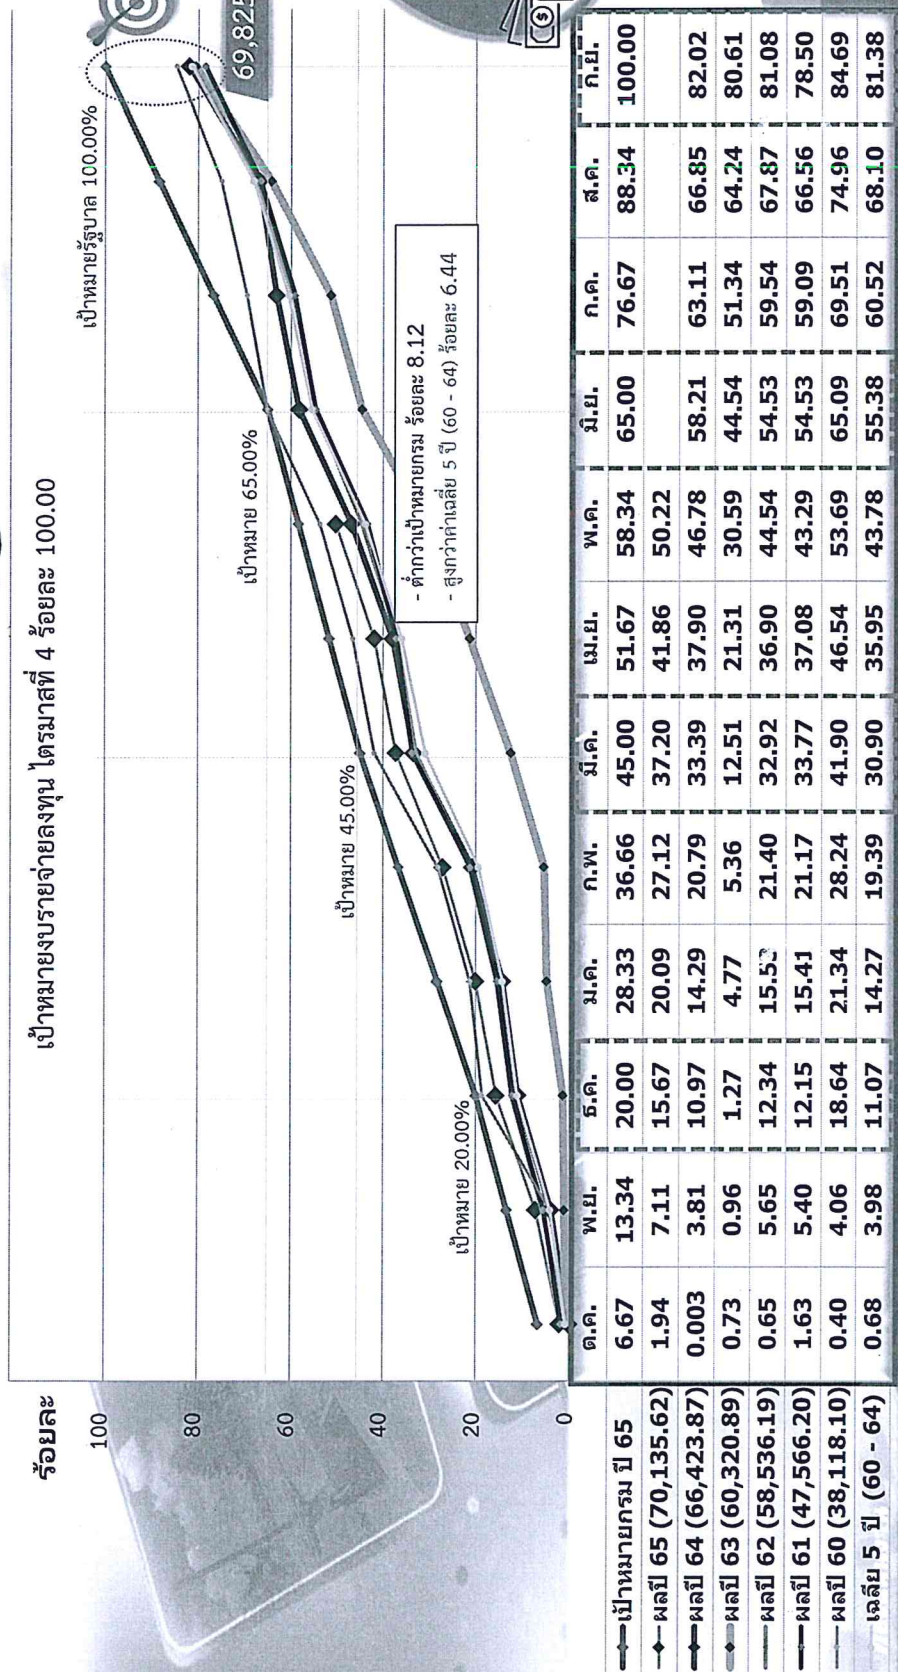

2.8


ရဲစွယ်

ขอมูลจากระบบบริหารการเงินคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565

sp. part	extreme min.	average min. (°C/mo)	extreme max. (°C/mo)	average max. (°C/mo)	precipitation (mm/mo)	relative humidity (%)	average wind speed (km/h)	average wind direction (°)	average number of rainy days		
april 1	1,604.88	1,582.69	1,609.55	66.95	april	69.51	april	549.48	562.92	121.78	21.99
april 2	1,890.25	1,836.59	1,904.73	59.61	may	69.51	may	695.81	692.25	152.90	22.09
april 3	2,334.81	2,319.47	1,102.73	47.64	may	12,363.12	may	12,363.12	11,808.61	6,646.61	54.28
april 4	1,074.89	1,084.34	653.62	60.28	may	61.61	may	12,268.92	12,372.79	5,014.64	40.53
april 5	2,640.61	2,699.94	1,463.45	61.61	may	53,151	may	344.83	528.41	65.26	65.26
april 6	2,646.30	2,786.47	1,810.09	65.25	may	65.25	may	376.65	396.49	155.65	39.26
april 7	2,249.87	2,324.15	2,081.25	89.35	may	3,531.61	may	2,925.70	3,530.07	82.88	70.79
april 8	4,016.61	4,149.36	1,385.41	33.39	may	33.39	may	742.05	734.19	519.75	70.79
april 9	2,437.91	2,372.72	1,257.19	52.84	may	138.22	may	138.22	137.54	112.60	81.87
april 10	1,337.10	1,323.77	506.02	38.23	may	82.68	may	82.68	92.24	0.97	1.05
april 11	1,507.05	1,437.17	495.38	34.47	may	45.53	may	4.71	4.71	3.82	81.20
april 12	2,416.48	2,417.66	1,101.79	49.42	may	1,031.78	may	-	8.50	0.06	99.87
april 13	2,130.91	2,087.66	1,533.99	46.74	may	46.74	may	-	0.42	-	-
april 14	3,273.65	3,279.58	1,803.50	619.65	Lump Sum	24.12	Lump Sum	249.00	249.00	26.64	9.90
april 15	1,887.06	1,803.50	619.65	34.36							
april 16	3,057.93	3,015.04	727.24	24.12	may	45.59	may	66,339.70	66,339.70	34,471.22	50.44
april 17	682.65	701.39	319.70	45.59	may	45.59	may	68,827.65	68,827.65	34,471.22	50.44

เป้าหมายกรม ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 : 58.34 %

— ■ — เฉลี่ย 5 ปี (60-64) : 43.78 %

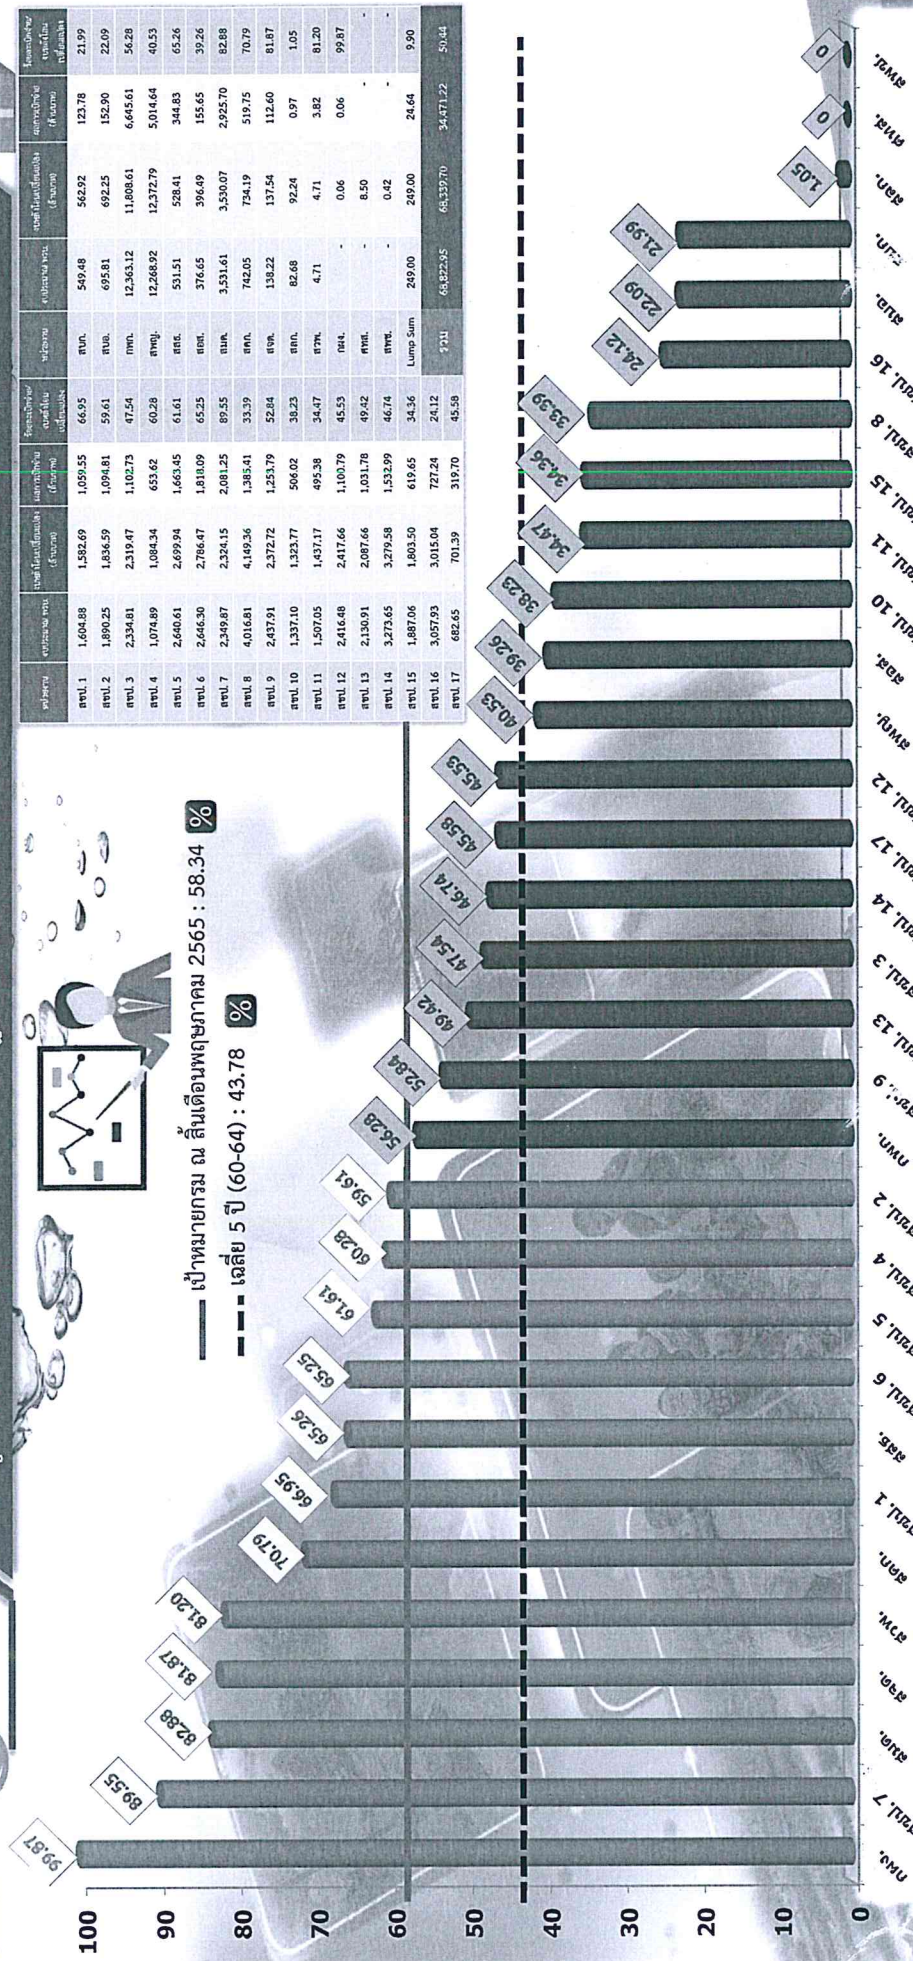

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 152 รายการ ณ พ.ร.บ. 1,312.67 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณย้อนกลับแล้ว เช่น จังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น
2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 919.47 ล้านบาท

☐ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายรัฐบาล ☐ กองแผนงาน

2.9

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการมู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)							
1	กระทรวงคมนาคม	161,071.14	81,091.71	50.35	177,308.97	78,051.90	44.02	6.33
2	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	75,151.69	37,500.00	49.90	72,299.20	34,334.25	47.49	2.41
3	กระทรวงมหาดไทย	75,817.42	25,709.40	33.91	80,634.86	21,060.90	26.12	7.79
	ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมพัฒนาที่ดิน	1,867.24	1,178.50	63.11	2,114.26	1,502.61	71.07	-7.96
2	กรมชลประทาน	69,825.93	35,069.36	50.22	66,278.77	31,004.12	46.78	3.44
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,276.11	241.11	18.89	1,159.16	547.97	47.21	-28.32
	ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)							
1	กรมทางหลวงชนบท	44,275.39	24,988.86	56.44	47,151.29	19,022.67	40.34	16.10
2	กรมชลประทาน	69,825.93	35,069.36	50.22	66,278.77	31,004.12	46.78	3.44
3	กรมทางหลวง	107,576.44	53,137.33	49.39	120,044.00	56,702.17	47.23	2.16
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	29,838.27	8,664.44	29.04	27,512.17	10,255.31	37.28	-8.24

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 46.45%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (45 หน่วยงาน) เฉลี่ย 45.44%



ภาพรวม
งบประมาณเงินกู้เพื่อชดเชยปี พ.ศ. 2564

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมี พ.ศ. 2564

สถานการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565

รวมทั้งสิ้น 1,068 รายการ
(เพิ่มขึ้น 1,067 รายการ โอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ)

ตัวเสร็จ

3,035.86 ล้านบาท

152.79	ล้านบาท	1.35 %
--------	---------	--------

56.46 ล้านบาท 0.50%

583.24 ล้านบาท 5.17%

รวม 792.49 ล้านบาท 7.02 %

รวม 792.49 ล้านบาท 7.02 %

1. แก๊สแอมโมเนีย เกิดจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้ใช้จ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้^๑ ๖๒๖.๒๕๖๔

กองแผนงาน														เบิกจ่าย 100%									
ต.ค.64		พ.ย.64		ธ.ค.64		ม.ค.65		ก.พ.65		มี.ค.65		เม.ย.65		พ.ค.65		มิ.ย.65		ก.ค.65		ส.ค.65		ก.ย.65	
				ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4						ไตรมาสที่ 4	
แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95	11,283.76										
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	839.80	1,330.56	866.19	879.60	463.75					7,455.41										
ผลต่าง	-	- 428.49	- 1,221.49	- 746.44	- 3.28	- 580.67	351.53	139.47															

ИСКУПНИК



 ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ
1,108 รายการ 93.28%

ยกเล็ก
2 รายการ 0.17 %

มติ ครม.
15 มิ.ย.
64

฿ 1,183.31 ล้านบาท
เบิกจ่าย 485.20 ล้านบาท

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 30 รายการ
- แล้วเสร็จ 14 รายการ

▶ คำดำเนินงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ปี 2563/2564

มติ ครม.
14 ก.ย.
64

฿ 1,562.30 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1,495.08 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 95.70

97.36 %

- ปริมาณน้ำ 1.26 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันกาเกิดอุทกภัย
และปัญหายุ้ง ปี 2564

คำสั่งนายก
29 ก.ย.
64

฿ 94.70 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0.10 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.11

10.00 %

๒๕ พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า 4 สถานี

ศาสตราจารย์
29 ก.ย.
64

฿ 83.09 ล้านบาท
เบิกจ่าย 63.32 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 76.21

70.00%

พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 ระยะคลองละคลองระยะยาวปกติ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

๒๙ ก.ย. ๖๔

70.00 ล้านบาท
เบิกจ่าย 33.00 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 47.14

60.00%

- พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่
- ครวเรือนรับประโยชน์ 60 ครวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

กปร.
ปี 2564

๑ 1,185.27 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1,006.85 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 84.95

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
17 รายการ
82.18 %
แล้วเสร็จ 54 รายการ

ทำเนียบงานก่อสร้างอาคารชลประทาน
ัดพาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวน
วายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) ประจำปี 2564



ผลการดำเนินงาน

มีมติ คร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี 65 รวม

2 ครั้ง จำนวน 649 รายการ

งบประมาณ 1,666.06 ล้านบาท เบิก 39.17 ล้านบาท 2.35 %

ผลการดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ 305 รายการ 46.99 %

จัดซื้อ-จัดจ้าง 184 รายการ 28.35 %

ดำเนินการก่อสร้าง 158 รายการ 24.35 %

ยกเลิก 2 รายการ 0.31 %

ตัวชี้วัดของโครงการ

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบม.

พื้นที่รับประโชน์ 1,657,922 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบม. = - ไร่

ครัวเรือน 130,088 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = - ครัวเรือน

มติ ครม.

29 มี.ค. 65

กปร.

ปี 2565

รายการ 620
ล้านบาท 1,126.19

เบิกจ่าย 0.10 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 0.01

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 136 รายการ

จัดซื้อ-จัดจ้าง 177 รายการ

ยังไม่ดำเนินการ 305 รายการ

ยกเลิก 2 รายการ

1.00 %

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบม.

พื้นที่รับประโชน์ 1,657,922 ไร่

ครัวเรือนรับประโชน์ 130,088 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วม ปี 2565

รายการ 29
ล้านบาท 539.87

เบิกจ่าย 39.07 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 7.24

3.93 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 22 รายการ

จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 รายการ

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่ง
น้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ
โครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ประจำปี 2565





5

เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



UP ภาพรวมโครงการเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเบิกจ่ายงบประมาณ	4,224.82 ล้านบาท
เบิกจ่าย	3,877.52 ล้านบาท 91.78%
คงเหลือ	163.24 ล้านบาท 3.86%
เหลือจ่าย	184.07 ล้านบาท 4.36%

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง 14 รายการ = 3.65%
แล้วเสร็จ 367 รายการ = 95.57%
ยกเลิก 3 รายการ = 0.78%

ตัวชี้วัดของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ :

- ซ่อมแซม/ปรับปรุง 207 รายการ - ฝ่าย 21 รายการ
- อาคารบังคับน้ำ 12 รายการ - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 10 รายการ
- ระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรกรรม 30 รายการ
- ขุดลอก 61 รายการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 รายการ)
- แก้มลิง 40 รายการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ)
- อื่น ๆ เช่น ประตูปรับน้ำ ท่อหัวดิน 3 รายการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ)

ผลลัพธ์ของโครงการ :

พ.ท.บ. 19,667 ไร่ = 19,667 ไร่ 100%	ปริมาณน้ำ 26,98 ล้าน ลบ.ม. = 16.94 ล้าน ลบ.ม. 62.79%
พ.ท.บ. 209,653 ไร่ = 194,128 ไร่ 92.59%	ค่าเฉลี่ย 64,952 ศร.ลิ้น = 60,507 ศร.ลิ้น 91.16%
	การจ้างงาน 9,716 คน = 9,716 คน 100%

ภาพแผนงาน



ผลการดำเนินงานจำแนกตามลำดับ/กอง มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

จำนวน
รายการ

140

130

120

100

80

60

40

20

0

ประเภทการดำเนินงาน

87 รายการ

62 รายการ

232 รายการ

= รวม 381 รายการ

สถานะการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ = 367

ผลงานร้อยละ 71-99 = 10

ผลงานร้อยละ 41-70 = 2

ผลงานร้อยละ 1-40 = 2

ยกเลิก = 3

NOTE:

รายการที่ไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน 14 รายการ

58

59

25

8

6

19

10

4

8

1

1

Note :

งานจ้างเหมา
ทั้งโครงการ

จ้างเหมา
บางส่วน

ดำเนินการเอง

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่ สบป.6 = 2 รายการ และ สบป.7 = 1 รายการ

2. งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 184,0674 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินงานกับบรรณานุกรมวัสดุต้องโครงการแล้ว



6


เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



กรมชลประทาน

รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

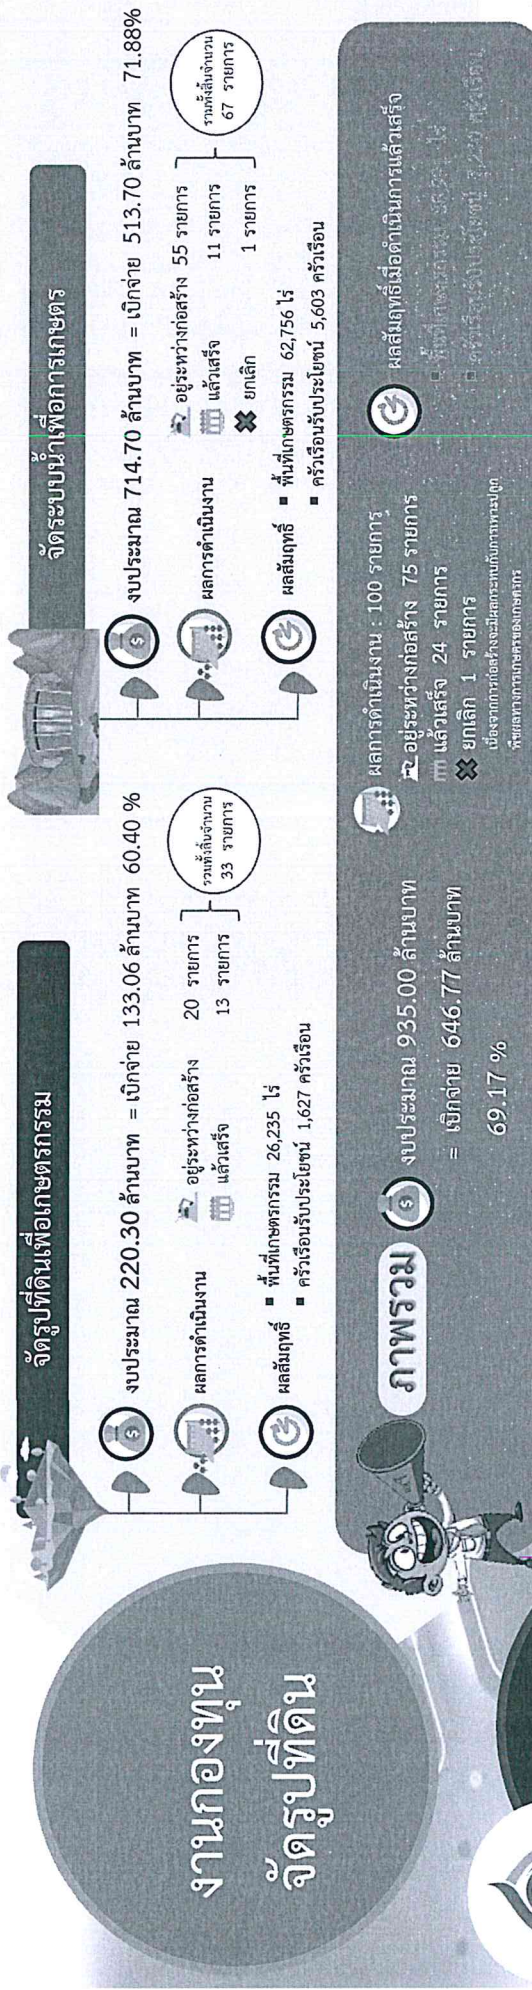

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



งบประมาณ 806.12 ล้านบาท

งบจัดสรร 700.18 ล้านบาท

= เบิกจ่าย 360.71 ล้านบาท 44.75 %

ผลการดำเนินงาน : 1,541 รายการ



อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 369 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,167 รายการ

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	สถานะดำเนินการ	ประเภท
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 57 รายการ			1,947,593,074		
1	ททก.	(1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง) - [9550]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	งานปศุสัตว์	79,780,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	ทพบ.
2	ททก.	(230) ประตุน้ำฝายบ้านและอาคารประกอบโครงการประตุน้ำฝายบ้านคลองกลาย บ้านนาขุน ตำบลสระแก้วอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9490]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานผูกพันใหม่	137,600,000	5.เปิดซอง	ทพบ.
3	ททก.	(367) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อน จังหวัดยะลา - [9013]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	137,550,000	5.เปิดซอง	ทพบ.
4	สมด.	(11) คำขี้ดิน คำตม คำรือยในการจัดหาดิน จังหวัดจันทบุรี - [8589]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ที่ชลประทาน	งานปศุสัตว์	22,338,050	2.อนุมัติแผน	ทพบ.
5	สมด.	(1.12) คำขี้ดิน คำตม คำรือยในการจัดหาดิน จังหวัดอำนาจเจริญ - [8560]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ที่ชลประทาน	งานปศุสัตว์	598,500	2.อนุมัติแผน	ทพบ.
6	สมด.	(1.2) คำขี้ดิน คำตม คำรือยในการจัดหาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา - [8550]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ที่ชลประทาน	งานปศุสัตว์	3,000,000	2.อนุมัติแผน	ทพบ.
7	สขป. 10	(1.4253) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสระบุรี จังหวัดสระบุรี - [6445]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	974,717	6.อนุมัติรับราคา	ทพบ.
8	สขป. 10	(1.4196) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำลูกเหล็ก จังหวัดลพบุรี - [6388]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	1,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ทพบ.
9	สขป. 10	(1.4067) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 3 สาย มีขนาด กว.12+856 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานาหาราช ตำบลหนองบอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [6259]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	280,000	2.อนุมัติแผน	ทพบ.
10	สขป. 10	(1.4005) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานาหาราช จังหวัดสิงห์บุรี - [6197]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	1,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ทพบ.
11	สขป. 11	(1.164) ปรับปรุงก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางนก กม.7+700 ของคันกันน้ำสายบางไทร-เสนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [1920]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	4,500,000	6.อนุมัติรับราคา	ทพบ.
12	สขป. 11	(33) เขื่อนป้องกันล้นและตลิ่งคลองอู่ตะเภา ระยะที่ 2 มีระยะทาง 100 เมตร ตำบลพรหมทอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ - [1660]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปศุสัตว์	220,000,000	3.ประกาศจ้าง TOR	ทพบ.
13	สขป. 12	(1.5049) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - [7241]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	981,457	6.อนุมัติรับราคา	ทพบ.
14	สขป. 13	(1.102) บำรุงรักษาทางลัดใหญ่ คลอง 1R-3L-1R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สขป.13 ระยะทาง 8,400 กม. ตำบลเขาสามสิบหยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี - [1858]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	902,200	6.อนุมัติรับราคา	ทพบ.
15	สขป. 13	(1.94) ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้า คลองส่งน้ำ 4ขา-11ขา-2ขา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานาหาราช จังหวัดลพบุรี - [662]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	1,500,000	5.เปิดซอง	ทพบ.
16	สขป. 13	(1.93) ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้า คลองส่งน้ำ 4ขา-11ขา-2ขา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานาหาราช จังหวัดลพบุรี - [661]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	5,000,000	6.อนุมัติรับราคา	ทพบ.
17	สขป. 13	(1.92) ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้า คลองส่งน้ำสายใหญ่ ท่าสาร-บางปลาก กม.8+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานาหาราช จังหวัดนครปฐม - [660]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	5,000,000	6.อนุมัติรับราคา	ทพบ.
18	สขป. 15	(1.5597) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [7789]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	1,000,000	2.อนุมัติแผน	ทพบ.
19	สขป. 15	(1.288) อาคารที่ทำการส่วนแผนงาน ภายในที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพองมีชัยรัตนคีรี อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [376]	ผลผลิตโครงการงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	3,945,800	6.อนุมัติรับราคา	ทพบ.
20	สขป. 16	(195) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำฝายคลองห้วยสาม และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [9455]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปศุสัตว์	100,000,000	5.เปิดซอง	ทพบ.
21	สขป. 17	(1.186) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ คลองระบายน้ำ DI-11.3R กม.8+347 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำลูกเหล็ก ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี - [1942]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	4,500,000	6.อนุมัติรับราคา	ทพบ.
22	สขป. 4	(1.1120) ซ่อมแซมคลองโดยรอบจุดจ่ายน้ำ คลองส่งน้ำสายซอย MC-1C หมู่ 5 หมู่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังนก-หนองขวัญ ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดง อำเภอเบญจมาศ จังหวัดนครสวรรค์ - [3312]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	1,524,200	2.อนุมัติแผน	ทพบ.
23	สขป. 4	(1.1119) ซ่อมแซมคลองโดยรอบจุดจ่ายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ MC-1C หมู่ 5 หมู่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังนก-หนองขวัญ ปริมาณดิน 185,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดง อำเภอเบญจมาศ จังหวัดนครสวรรค์ - [3311]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	8,155,400	2.อนุมัติแผน	ทพบ.
24	สขป. 14	(1.1477) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเพชรบุรี - [3669]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	49,100	2.อนุมัติแผน	ทพบ.
25	สขป. 14	(1.1463) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสุพรรณบุรี - [3655]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	240,000	2.อนุมัติแผน	ทพบ.
26	สขป. 8	(1.3292) ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่นาฝายบางนาโพธิ์ ระยะทาง 1.80 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานาหาราช ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา - [5484]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	950,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ทพบ.
27	สขป. 9	(28) ซ่อมสร้างผิวทางเข้าพื้นที่โครงการ ระยะทาง 2.74 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานาหาราช ตำบลกุดรัง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [2157]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	20,329,650	6.อนุมัติรับราคา	ทพบ.
28	สขก.	(10) อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [557]	ผลผลิตโครงการงานชลประทาน	งานผูกพันใหม่	46,742,000	5.เปิดซอง	ทพบ.

ลำดับที่	สำนัก	รายงานงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	สถานะดำเนินการ	ประเภท
29	สทก.	(1.460) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - (548)	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานพิเศษ	842,200	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ทพ.
30	สทก.	(33) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 (ระบบส่งน้ำ) จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ - (9049)	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	25,000,000	6.อนุมัติรับราคา	ทพ.
31	สทอ.	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - (8250)	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	3,000,000	5.เปิดซอง	ทพ.
32	สทอ.	(1.82) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในคูน้ำเพชรบุรี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - (2033)	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	4,997,900	6.อนุมัติรับราคา	ทพ.
33	สทอ.	(1.146) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำระบบโทรมาตร ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - (714)	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานพิเศษ	6,551,000	6.อนุมัติรับราคา	ทพ.
34	สทอ.	(1.370) ค่าจัดทำป้ายและข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - (458)	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานพิเศษ	117,000	5.เปิดซอง	ทพ.
35	สทอ.	(8) งานชุดลอกรอบยานพาหนะพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 - (9528)	โครงการลอกรอบยานพาหนะจากบางลา - บางโพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานผูกพันใหม่	676,200,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ทพ.
36	สทอ.	(6) ประดิษฐ์บานประตูและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง - (9514)	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดหนองคาย	งานผูกพันใหม่	228,000,000	5.เปิดซอง	ทพ.
37	สทอ.	(364) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำชุมแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลชุมแสง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ชลประทาน 7,450 ไร่ - (9010)	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	74,800,000	6.อนุมัติรับราคา	ทพ.
38	สทอ.	(29) ค่าจ้างสำรวจออกแบบโครงการลอกรอบยานพาหนะจากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - (9045)	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	40,000,000	5.เปิดซอง	ทพ.
39	ศทส.	โครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมชลประทาน	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานพิเศษ	8,500,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
40	สทอ.	จ้างสำรวจออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานศูนย์น้ำมูลตอนล่างฝั่งซ้าย (ระยะที่ 1) จังหวัดอุบลราชธานี	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานพิเศษ	9,950,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
41	สทอ.	จ้างสำรวจออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานศูนย์น้ำมูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 1) จังหวัดอุบลราชธานี	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานพิเศษ	9,890,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
42	สทป. 14	ปรับปรุงถนนพื้นคอนกรีตจากบ้านน้ำกระเทียมระหว่างสามระยะทาง 4.00 กม. ตำบลบ้านดิง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานพิเศษ	6,000,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
43	สทป. 1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อย่างเก็บน้ำแม่อาวใหญ่ โครงการชลประทานลำห้วยปริมาณดิน 26,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	1,300,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
44	สทป. 9	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนระบบชลประทานและอาคารประกอบ ประตูเจ็ดสีอุบลราชธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	2,750,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
45	สทป. 9	ซ่อมแซม บานระบาย คลอง 1 ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย สาย 2 ขนาดบานระบาย 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	800,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
46	สทป. 9	ซ่อมแซมคันไอบ ประตูแม่น้ำนอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	494,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
47	สทป. 9	ขุดลอกคลองโดยรถดูดทรายขนาด 14 ปริมาณดินขุดลอก 55,800 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	2,200,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
48	สทอ.	ค่าสำรวจธรณีและภูมิสถาปัตย์ โครงการเจาะและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานรีไซเคิลกระดาษเขตนครศรีธรรมราช อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	366,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
49	สทอ.	ปรับปรุงพื้นที่และภูมิสถาปัตย์ในกรมชลประทานสามเสน อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นที่ 4 สำนักงานพัฒนาพลังงานน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานพิเศษ	1,144,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
50	สทป. 11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก (อ.3/24) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานพิเศษ	568,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
51	สทอ.	ปรับปรุงทางเดินรอบอาคารอำนวยการ สถานีพัฒนาการชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานพิเศษ	424,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
52	สทป. 17	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำโครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคันหยงเมือง อำเภอระโนด จังหวัดนราธิวาส	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานพิเศษ	6,478,000	6.อนุมัติรับราคา	โอนเปลี่ยนแปลง
53	สทป. 17	ปรับปรุงฝายคลองโอรังไจ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 50 ไร่ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานพิเศษ	9,890,000	6.อนุมัติรับราคา	โอนเปลี่ยนแปลง
54	สทก.	ปรับปรุงห้องกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานพิเศษ	9,389,900	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
55	สทป. 17	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายอัยปูลอง (ปชค) ช่วงที่ 2 ตำบลมาโมะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	3,000,000	6.อนุมัติรับราคา	โอนเปลี่ยนแปลง
56	สทป. 14	ซ่อมแซมเครื่องวัดระดับคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.42+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปาดนบุรี ตำบลสหคาม อำเภอปาดนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	3,000,000	6.อนุมัติรับราคา	โอนเปลี่ยนแปลง
57	สทป. 14	ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำสาย 12ซ้าย - 1ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปาดนบุรี ตำบลหนองคาบแก้ว อำเภอปาดนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานพิเศษ	2,500,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
