



เลขที่เอกสารในระบบ E: ๖๔๙๐๐๖/๕๐๔/๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๕๐๔/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ผง.

รับ 4๓๙๒

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันมาด้วยแล้ว

อรุณ ทรัพย์

(นางสาวอารียศ ด้วงน่ม)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

- ทราบ

โดยน ผอ.ส่วน, ผอ.ร.กค., กน.๑-๙ ผอ.

|| ลจ ผมท.๒๐.

เพื่อโปรดทราบทางเรา
นางสาวอารียศ ด้วงน่ม

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณจำนวน 7 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 100,841.41 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 59,755.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.26 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 14,597 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 138 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.94 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 433 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.97 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6,923 รายการ คิดเป็นร้อยละ 47.43 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6,939 รายการ คิดเป็นร้อยละ 47.54 และยกเลิก จำนวน 164 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.12 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 77,143.43 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 43,517.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.41 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,317.50 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 5,151.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.39 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 69,825.93 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 38,366.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.95 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,659 รายการ (รายการ พ.ร.บ. 65 จำนวน 9,554 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ) ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.10 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 31 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.32 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6,171 รายการ คิดเป็นร้อยละ 63.89 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3,294 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.10 และยกเลิก จำนวน 153 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.59 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น ดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น

2. งบเงินกู้เบิกเหรัญญิกปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 7,870.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.75 งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 1,002.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.89 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 252.40 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 85.82 ล้านบาท และเบิกไม่ทันตามกำหนด 664.66 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 2,410.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.36 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,068 รายการ (รายการเงินกู้เบิกเหรัญญิกปี จำนวน 1,067 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 253 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.69 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 812 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.03 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.28 ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เนื่องจากราษฎรบางรายเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ และเกิดข้อพิพาทเรื่องมรดกเนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่ดินได้

3. งบกลาง พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 4,605.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,127.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.90 มีจำนวนรายการ 1,188 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 76 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.40 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,110 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.43 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 เนื่องจากมีการแก้ไขสถานที่ดำเนินการจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

4. งบกลาง พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 1,843.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 129.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.04 มีจำนวนรายการ 657 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรร งบประมาณจากสำนักงบประมาณ จำนวน 128 รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.48 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 186 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.31 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 336 รายการ คิดเป็นร้อยละ 51.14 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.76 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.31 เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

5. เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 งบประมาณ จำนวน 4,224.82 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,887.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.02 มีจำนวนรายการ 384 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.60 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 371 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.62 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น ดำเนินการแล้ว

6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 806.12 ล้านบาท เบิกจ่าย 540.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.04 มีจำนวนรายการ 1,541 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 216 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.02 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.32 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,320 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.66

7. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 682.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.02 มีจำนวนรายการ 100 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 72 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 27 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.00 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.00 คือ รายการ จัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ระยะที่ 2 เนื่องจากการก่อสร้างจะมีผลกระทบกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย
ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

รายละเอียดข้อมูล



1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

3 งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	100,841.41	59,755.70	59.26	14,597	138	433	6,923	6,939	ยกเลิก 164 รายการ
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (กรมบัญชีกลาง)	77,143.43	43,517.56	56.41	9,659	10	31	6,171	3,294	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,317.50	5,151.00	70.39						
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	69,825.93	38,366.56	54.95	9,659	10	31	6,171	3,294	ยกเลิก 153 รายการ
2. งบเงินกู้ยืมไปเบิกเหลือปี พ.ศ. 2563	11,283.76	7,870.21	69.75	1,068			253	812	- ยกเลิก 3 รายการ - ตัดไม่ขยาย/สลาย PO/เบิกไม่ทัน จำนวน 1,002.88 ล้านบาท - คงเหลือต้องดำเนินการต่อ จำนวน 2,410.67 ล้านบาท
3. งบกลาง พ.ศ. 2564	4,605.14	3,127.09	67.90	1,188			76	1,110	
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	3,419.87	2,107.19	61.62	1,117			60	1,055	
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	426.47			24			24		
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183.31	499.97	42.25	44			29	15	
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564	1,562.30	1,501.66	96.12	1,046			4	1,040	ยกเลิก 2 รายการ
- โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	94.70	0.10	0.11	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	83.09	66.73	80.31	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	70.00	38.73	55.33	1			1		
3.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี พ.ศ. 2564	1,185.27	1,019.90	86.05	71			16	55	
4. งบกลาง พ.ศ. 2565	1,843.14	129.83	7.04	657	128	186	336	5	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565	1,126.19	37.44	3.32	620	124	176	313	5	ยกเลิก 2 รายการ
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565	716.95	92.39	12.89	37	4	10	23		
5. เงินกู้ ประจำปี พ.ศ. 2564	4,224.82	3,887.80	92.02	384			10	371	ยกเลิก 3 รายการ
6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565	806.12	540.43	67.04	1,541		216	5	1,320	
7. จัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565	935.00	682.78	73.02	100			72	27	ยกเลิก 1 รายการ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

2

งบลงทุน

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565




ข้อมูลจาก ระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565





2.2

สรุปผลการก่อกั้นผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

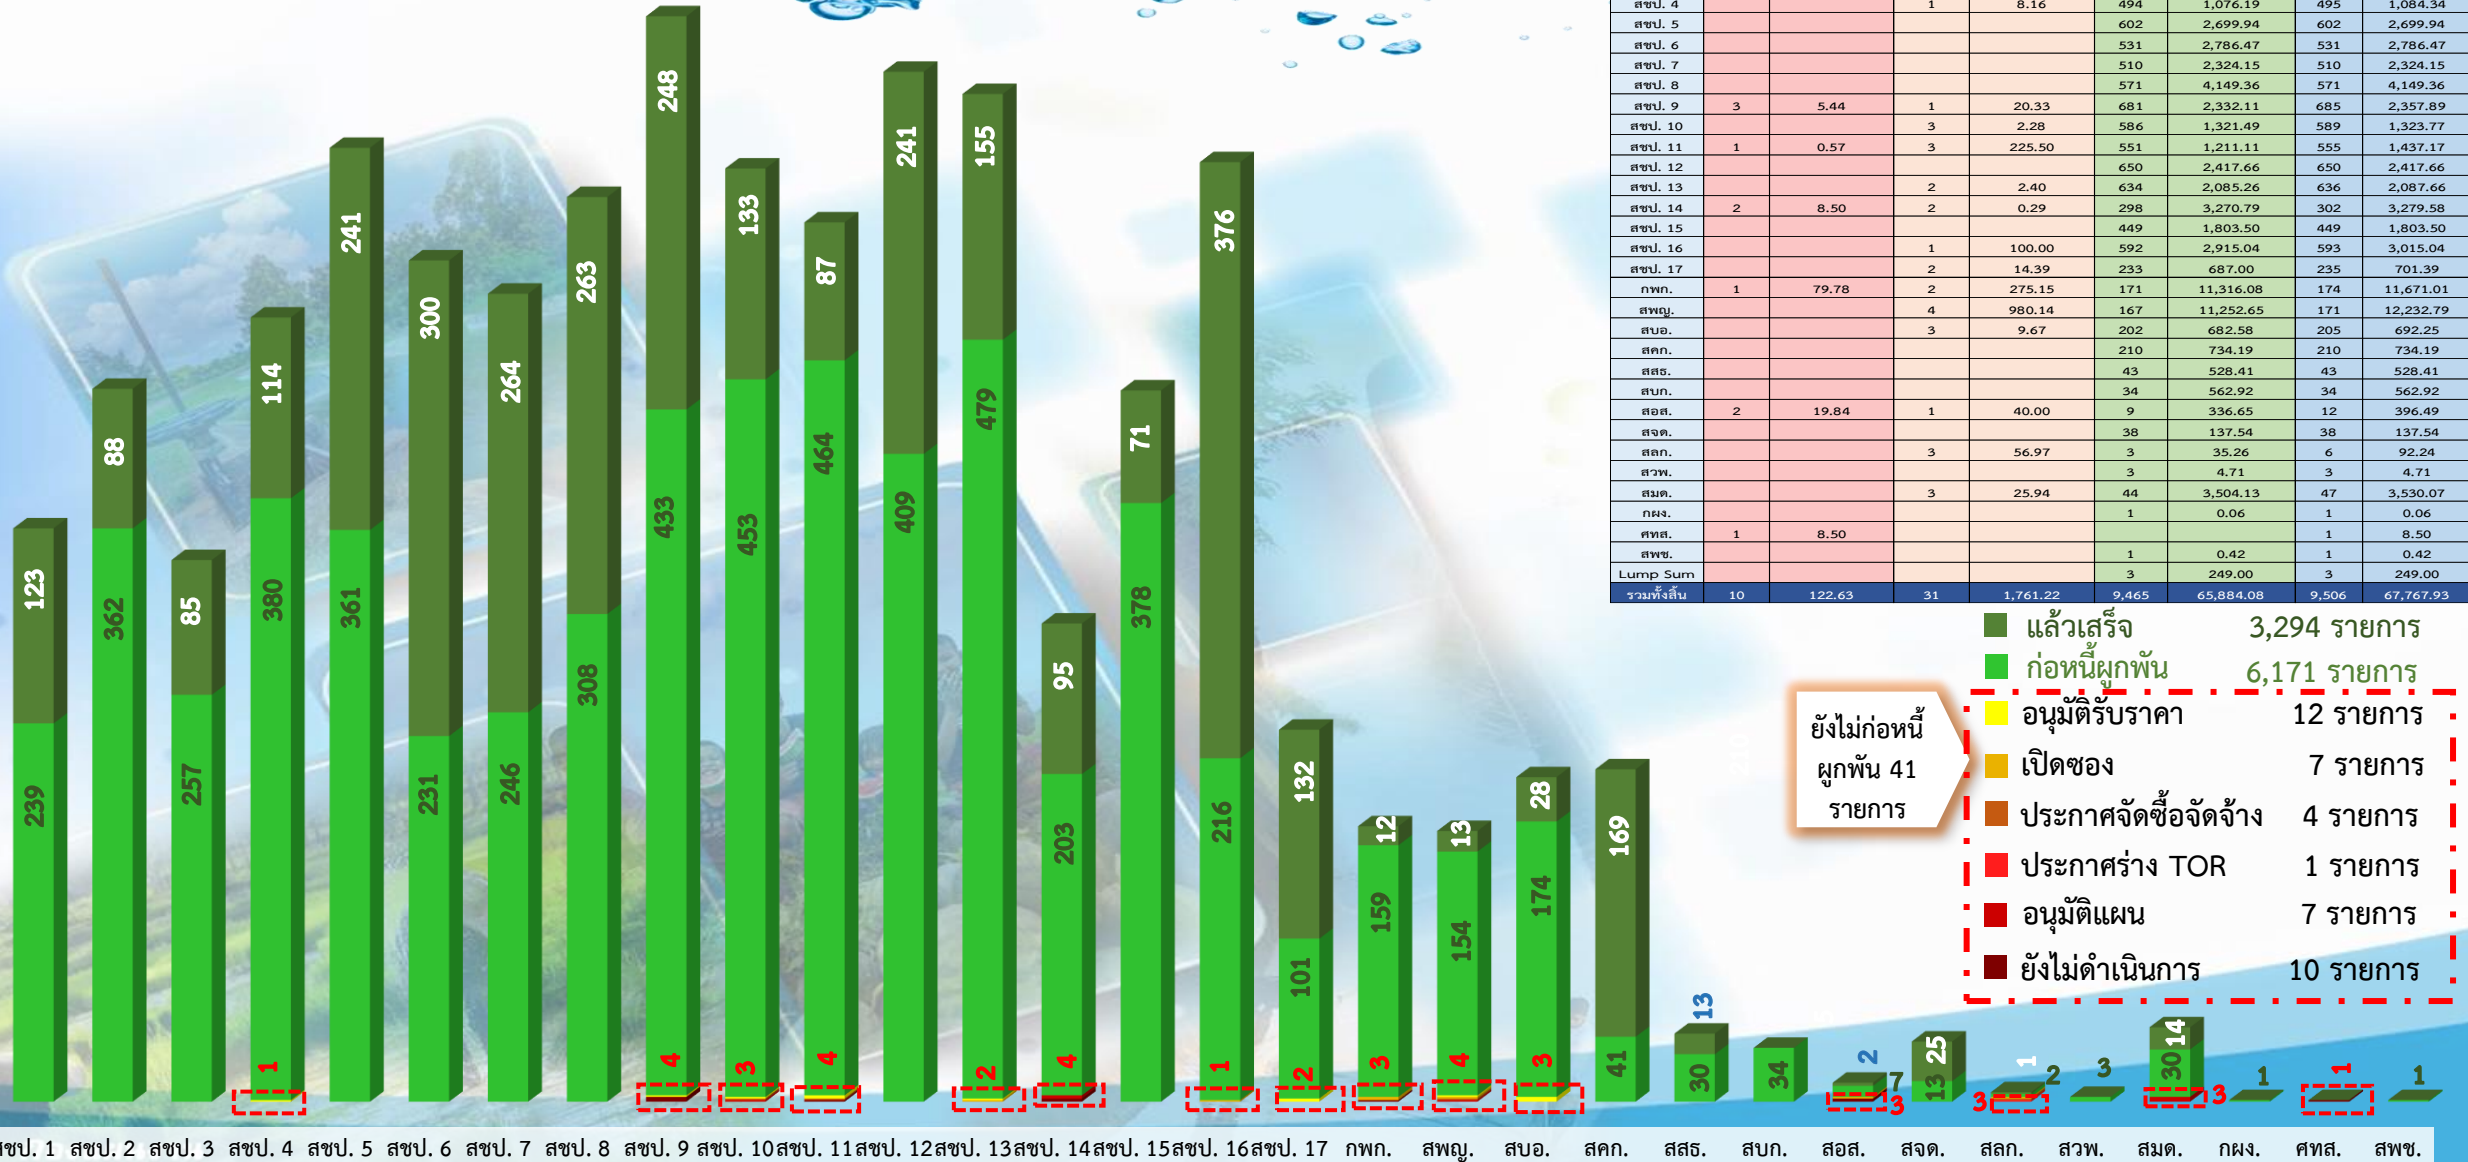



2.3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ [GFMIS](#) และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม [Cen Project](#) ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อมูลพัน							
						จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
												0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,822.95	67,767.93	37,729.61	55.67	9,506	10	122.63	31	1,761.22	9,465	65,884.08	1,610	581	902	1,031	2,047	3,294
สขป. 1	1,604.88	1,581.39	1,139.57	72.06	362					362	1,581.39	7	9	21	43	159	123
สขป. 2	1,890.25	1,836.59	1,263.89	68.82	450					450	1,836.59	79	23	102	37	121	88
สขป. 3	2,334.81	2,041.44	1,213.23	59.43	342					342	2,041.44	48	22	40	60	87	85
สขป. 4	1,074.89	1,084.34	733.78	67.67	495			1	8.16	494	1,076.19	132	58	67	43	80	114
สขป. 5	2,640.61	2,699.94	1,903.59	70.50	602					602	2,699.94	46	34	47	53	181	241
สขป. 6	2,646.30	2,786.47	1,934.52	69.43	531					531	2,786.47	10	11	27	42	141	300
สขป. 7	2,349.87	2,324.15	2,152.80	92.63	510					510	2,324.15	14	17	47	38	130	264
สขป. 8	4,016.81	4,149.36	1,604.30	38.66	571					571	4,149.36	79	38	44	69	77	264
สขป. 9	2,437.91	2,357.89	1,359.91	57.67	685	3	5.44	1	20.33	681	2,332.11	25	53	80	96	179	248
สขป. 10	1,337.10	1,323.77	580.52	43.85	589			3	2.28	586	1,321.49	135	33	39	65	181	133
สขป. 11	1,507.05	1,437.17	533.70	37.14	555	1	0.57	3	225.50	551	1,211.11	308	30	26	24	76	87
สขป. 12	2,416.48	2,417.66	1,221.82	50.54	650					650	2,417.66	69	52	59	70	159	241
สขป. 13	2,130.91	2,087.66	1,235.29	59.17	636			2	2.40	634	2,085.26	55	51	89	97	187	155
สขป. 14	3,273.65	3,279.58	1,719.23	52.42	302	2	8.50	2	0.29	298	3,270.79	47	25	38	55	38	95
สขป. 15	1,887.06	1,803.50	722.53	40.06	449					449	1,803.50	243	19	15	51	50	71
สขป. 16	3,057.93	3,015.04	924.21	30.65	593			1	100.00	592	2,915.04	48	41	40	47	40	376
สขป. 17	682.65	701.39	392.32	55.94	235			2	14.39	233	687.00	6	7	19	27	42	132
กพก.	12,363.12	11,671.01	7,231.28	61.96	174	1	79.78	2	275.15	171	11,316.08	99	14	12	23	11	12
สพญ.	12,268.92	12,232.79	5,270.79	43.09	171			4	980.14	167	11,252.65	80	20	31	9	14	13
สบอ.	695.81	692.25	208.35	30.10	205			3	9.67	202	682.58	13	12	46	68	35	28
สคก.	742.05	734.19	554.91	75.58	210					210	734.19	4	5	10	7	15	169
สสร.	531.51	528.41	379.38	71.80	43					43	528.41	7	1		3	19	13
สบก.	549.48	562.92	138.81	24.66	34					34	562.92	34					
สอธ.	376.65	396.49	158.23	39.91	12	2	19.84	1	40.00	9	336.65	6			1		2
สจด.	138.22	137.54	118.97	86.50	38					38	137.54		2		2	9	25
สลก.	82.68	92.24	1.09	1.18	6			3	56.97	3	35.26	2					1
สวพ.	4.71	4.71	3.97	84.26	3					3	4.71	3					
สมด.	3,531.61	3,530.07	2,996.80	84.89	47			3	25.94	44	3,504.13	6	4	3	1	16	14
กผง.		0.06	0.06	99.87	1					1	0.06	1					
ศทส.		8.50			1	1	8.50										
สพข.		0.42			1					1	0.42	1					
Lump Sum	249.00	249.00	31.77	12.76	3					3	249.00	3					

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 153 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,312.67 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น

2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 918.17 ล้านบาท



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน รายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อผูกพัน							
						จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
												0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,822.95	67,767.93	37,729.61	55.67	9,506	10	122.63	31	1,761.22	9,465	65,884.08	1,610	581	902	1,031	2,047	3,294
โครงการเขื่อนทด่น้ำผาจุ จังหวัดอุดรดิต์	809.00	789.57	442.70	56.07	10					10	789.57	2	2	5		1	
โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,561.63	2,607.19	1,216.51	46.66	14			1	676.20	13	1,930.99	8	1	1		1	2
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	27,440.29	26,718.45	16,308.52	61.04	629	2	19.84	6	278.29	621	26,420.32	183	69	97	84	145	43
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	499.74	419.35	211.27	50.38	9	1	79.78			8	339.57	7					1
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	789.37	1,029.41	242.90	23.60	13					13	1,029.41	7	2	4			
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอลาดหลวง (ระยะที่2) จังหวัดสงขลา	141.06	141.06			1					1	141.06					1	
โครงการประดูระบายน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	99.56	69.39	61.79	89.06	4					4	69.39	2	1	1			
โครงการประดูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	312.00	312.00	93.26	29.89	4					4	312.00	2	2				
โครงการประดูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย	72.00	91.19	42.31	46.40	4					4	91.19	1		2			1
โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย	275.66	275.66	10.16	3.69	6					6	275.66	4		2			
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,308.96	6,347.87	2,714.78	42.77	380	1	6.00	2	8.05	377	6,333.82	87	46	53	59	88	44
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	10,917.06	10,754.08	4,683.77	43.55	297			2	237.60	295	10,516.48	87	40	59	50	31	28
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	1,033.27	1,061.23	331.70	31.26	14			1	228.00	13	833.23	8	2	1	2		
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	1,298.06	859.89	634.51	73.79	12					12	859.89	4	3	2	1	1	1
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,193.40	2,179.56	1,342.02	61.57	748			2	229.89	746	1,949.67	99	41	85	46	144	331
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,509.86	10,507.03	7,285.68	69.34	6,760	3	5.44	12	44.96	6,745	10,456.63	1,013	339	548	735	1,499	2,611
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี	167.77	237.64	28.42	11.96	5					5	237.64	3		1		1	
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	108.00	108.00	100.03	92.62	2					2	108.00	1					1
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	104.14	117.34	67.66	57.67	6					6	117.34	5		1			
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	348.02	348.02	34.38	9.88	7					7	348.02	5		1		1	
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	637.62	637.62	493.53	77.40	5					5	637.62	3				1	1
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	388.00	388.00	222.56	57.36	3					3	388.00	3					
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	525.00	404.98	319.12	78.80	3					3	404.98		1	1			1
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิต์	313.78	361.03	302.78	83.87	6					6	361.03			1	1	2	2
ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	969.71	1,002.38	539.23	53.80	564	3	11.57	5	58.24	556	932.57	76	32	37	53	131	227


หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 153 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,312.67 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น

2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 918.17 ล้านบาท

2.5

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

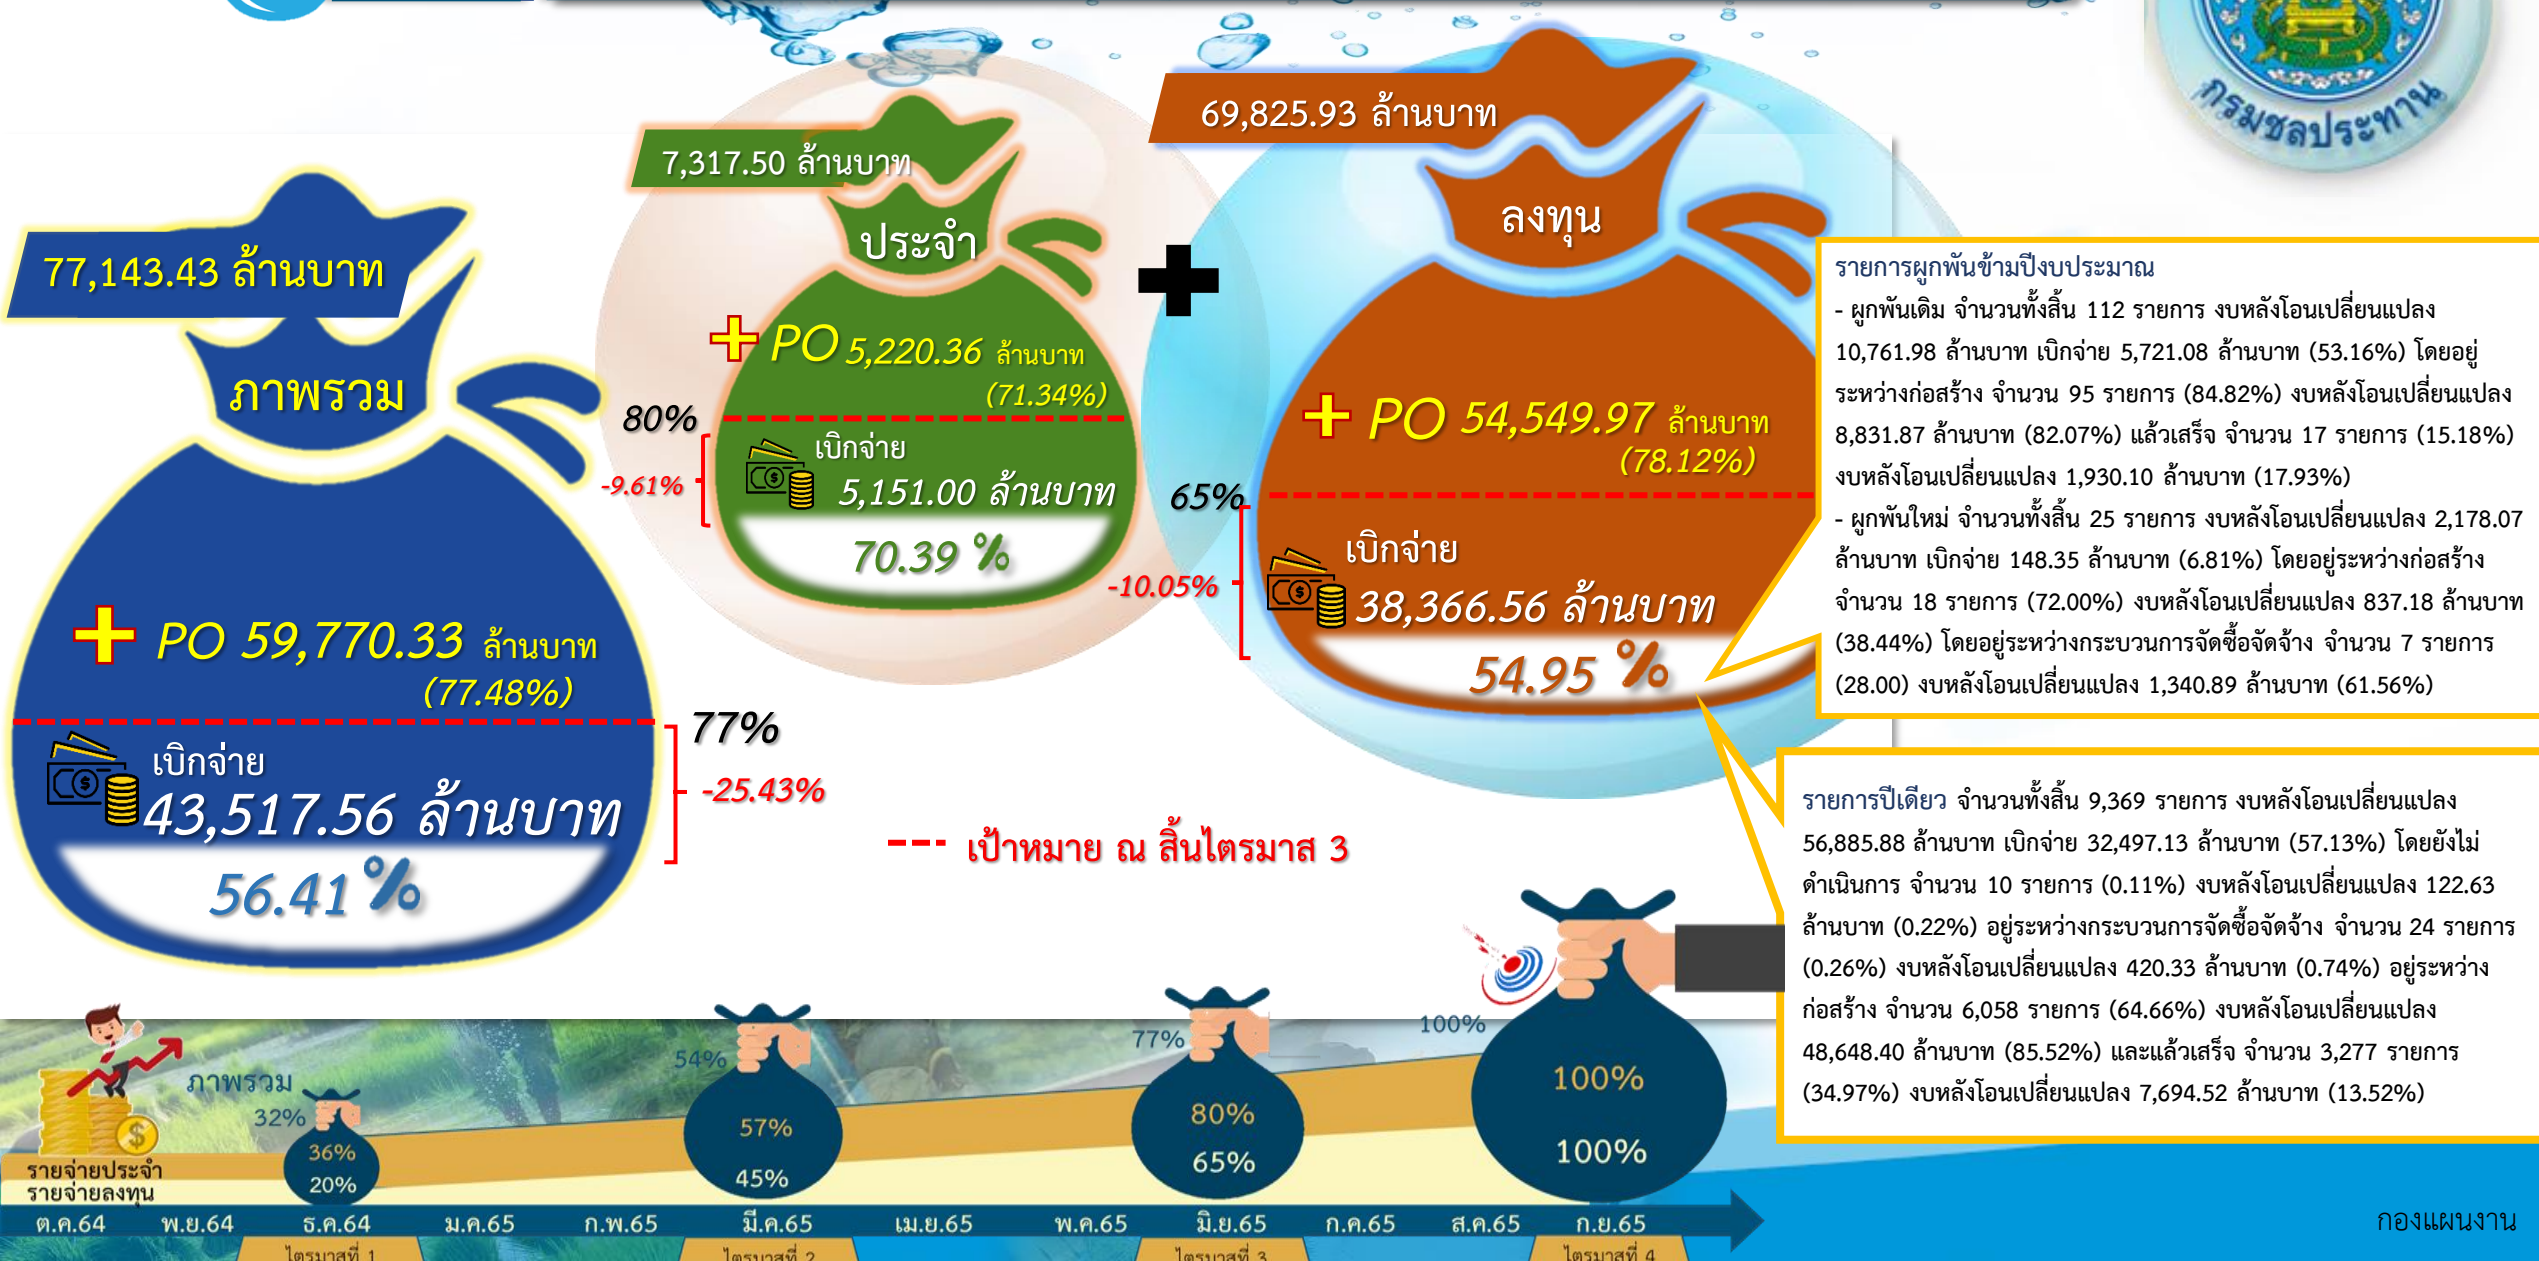

2.6

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

77,143.43 ล้านบาท

ภาพรวม

เบิกจ่าย

43,517.56 ล้านบาท

56.41 %

ร้อยละ

เป้าหมายภาพรวม ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

เป้าหมาย 100.00%

เป้าหมาย 77.00%

เป้าหมาย 54.00%

เป้าหมาย 32.00%

- ต่ำกว่าเป้าหมายกรม ร้อยละ 20.59
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (60 - 64) ร้อยละ 1.08

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
● เป้าหมายกรม ปี 65	10.67	21.34	32.00	39.33	46.66	54.00	61.67	69.34	77.00	84.67	92.34	100.00
▲ ผลปี 65 (77,143.43)	2.45	7.97	16.49	21.25	28.37	38.31	43.27	51.57	56.41			
▲ ผลปี 64 (74,106.98)	0.66	4.91	12.24	16.05	22.61	34.76	39.61	48.38	59.48	64.67	68.91	83.67
■ ผลปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	7.84	9.23	16.56	25.26	34.54	47.70	54.68	66.97	82.54
■ ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	83.17
■ ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
■ ผลปี 60 (47,004.27)	1.50	5.94	19.46	23.11	30.30	43.12	48.35	55.72	66.56	71.83	77.86	86.95
■ เฉลี่ย 5 ปี (60-64)	1.46	5.43	12.62	16.50	21.98	33.08	38.50	46.47	57.49	63.16	70.82	83.54



2.7

สถิติการเบิกจ่าย งบรายจ่ายลงทุน ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ร้อยละ

เป้าหมายงบรายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

100

80

60

40

20

0

เป้าหมายรัฐบาล 100.00%

เป้าหมาย 65.00%

เป้าหมาย 45.00%

เป้าหมาย 20.00%

69,825.93 ล้านบาท

ลงทุน

เบิกจ่าย

38,366.56 ล้านบาท

54.95%

- ต่ำกว่าเป้าหมายกรม ร้อยละ 10.05
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (60 - 64) ร้อยละ 0.43

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายกรม ปี 65	6.67	13.34	20.00	28.33	36.66	45.00	51.67	58.34	65.00	76.67	88.34	100.00
ผลปี 65 (70,135.62)	1.94	7.11	15.67	20.09	27.12	37.20	41.86	50.22	54.95			
ผลปี 64 (66,423.87)	0.003	3.81	10.97	14.29	20.79	33.39	37.90	46.78	58.21	63.11	66.85	82.02
ผลปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	4.77	5.36	12.51	21.31	30.59	44.54	51.34	64.24	80.61
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
ผลปี 61 (47,566.20)	1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
ผลปี 60 (38,118.10)	0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69
เฉลี่ย 5 ปี (60 - 64)	0.68	3.98	11.07	14.27	19.39	30.90	35.95	43.78	55.38	60.52	68.10	81.38




2.8

ผลการเบิกจ่าย งบรายจ่ายลงทุน ของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565



ร้อยละ

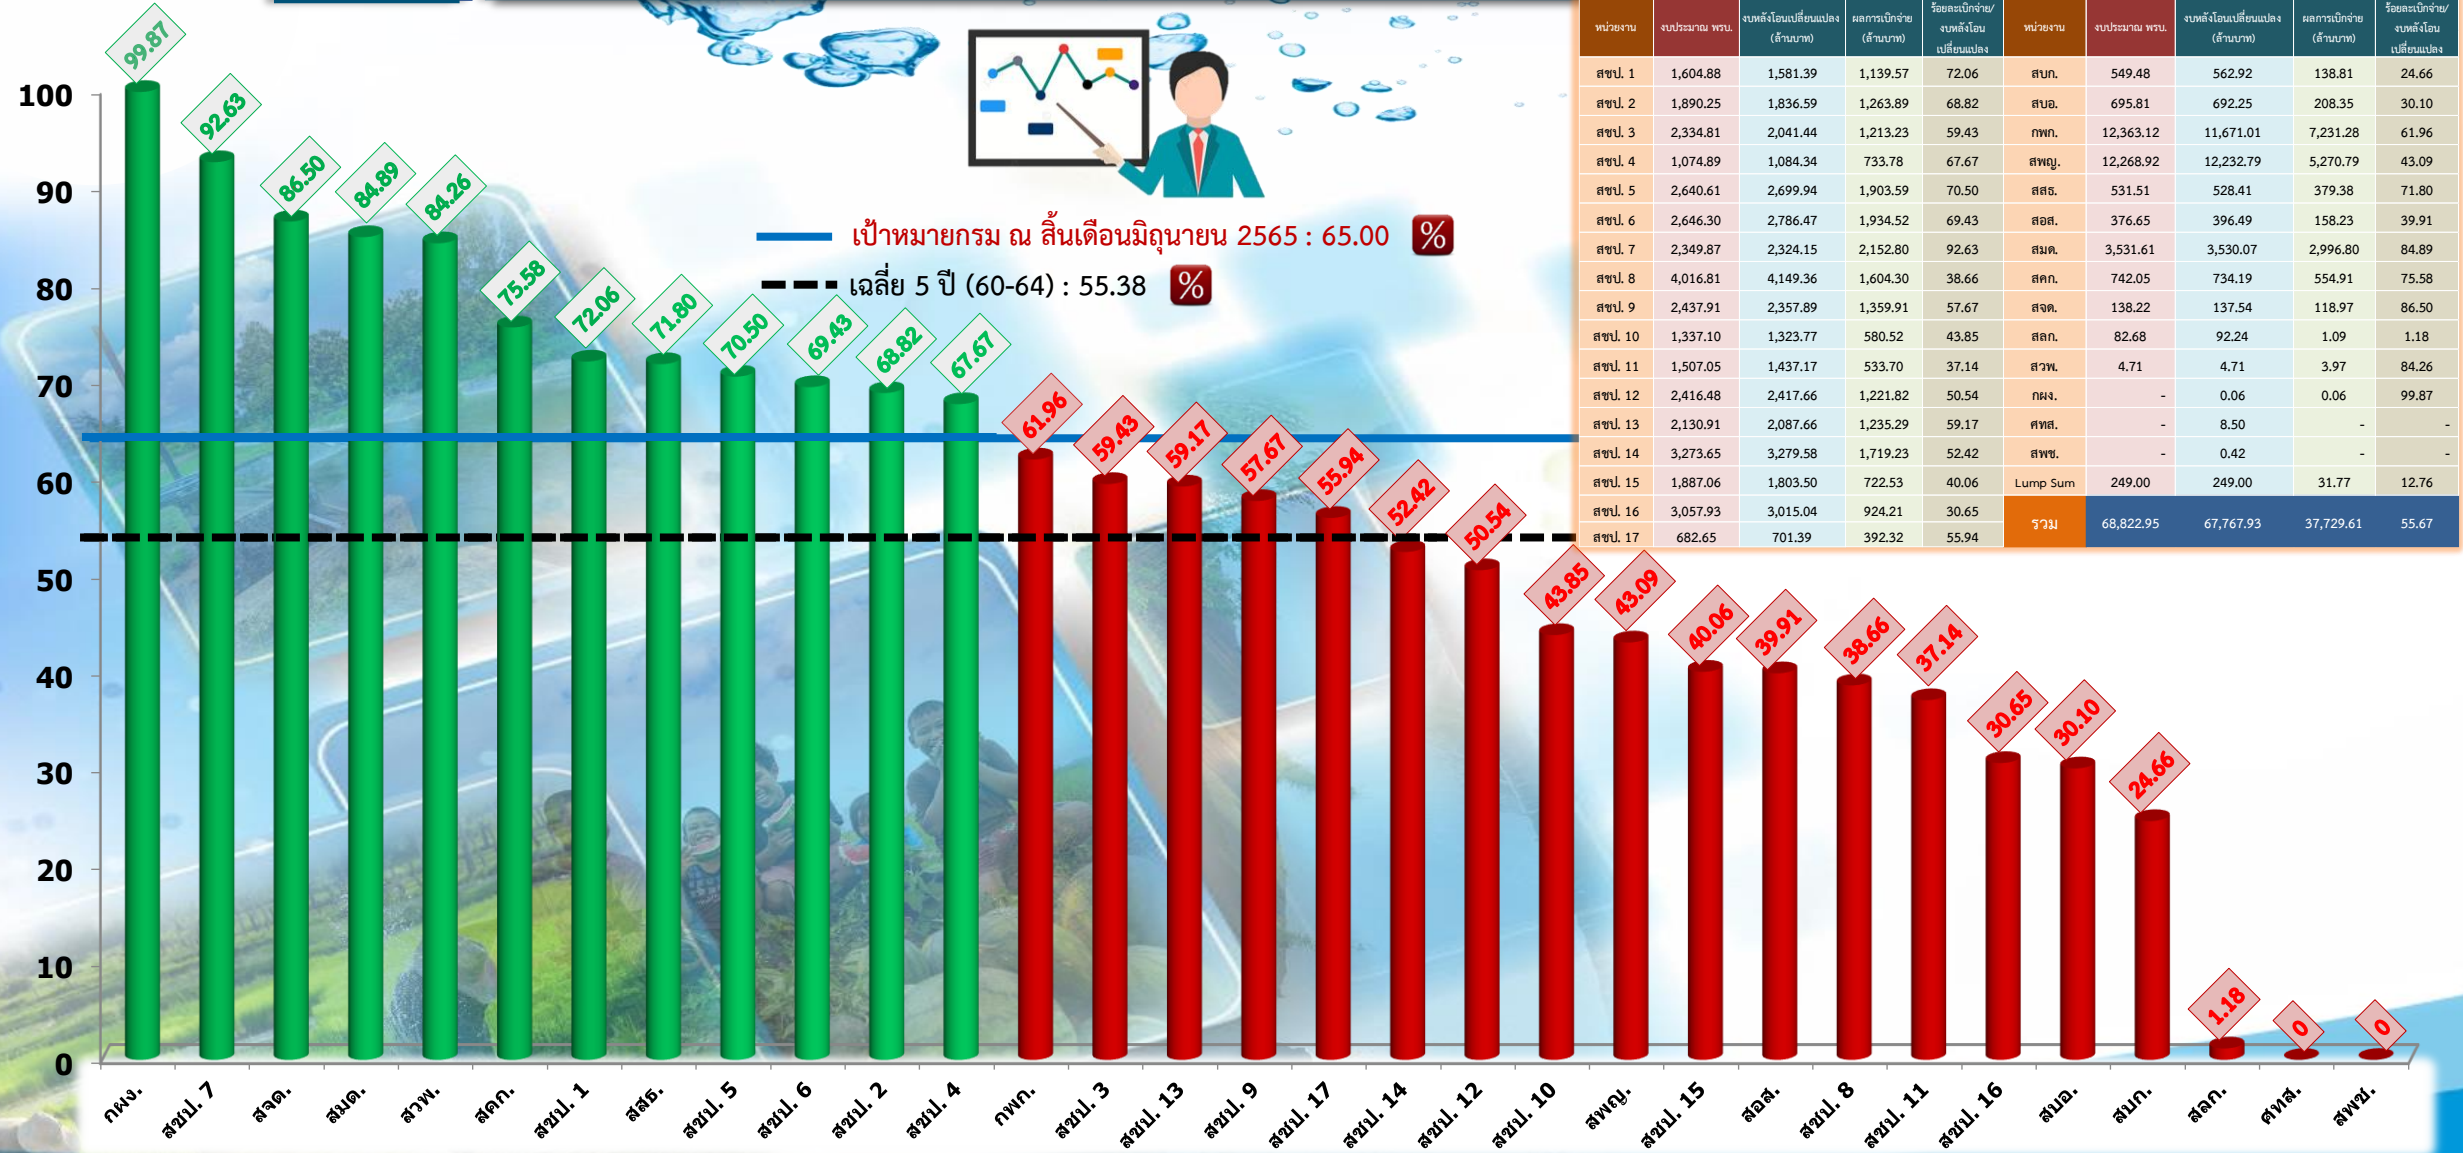

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 153 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,312.67 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น จบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น
2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 918.17 ล้านบาท

■ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายรัฐบาล
■ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

กองแผนงาน

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)							
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	75,132.76	41,022.26	54.60	72,207.15	39,228.75	54.33	0.27
2	กระทรวงคมนาคม	161,060.20	87,358.74	54.24	177,291.92	85,300.98	48.11	6.13
3	กระทรวงมหาดไทย	75,817.05	28,284.83	37.31	80,624.69	24,812.83	30.78	6.53
	ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมพัฒนาที่ดิน	1,852.85	1,323.03	71.41	2,114.38	1,613.35	76.30	-4.89
2	กรมชลประทาน	69,825.93	38,366.56	54.95	66,186.60	35,588.98	53.77	1.18
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,272.34	244.05	19.18	1,159.16	565.38	48.78	-29.60
	ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)							
1	กรมทางหลวงชนบท	44,275.39	26,358.63	59.53	47,151.29	21,147.69	44.85	14.68
2	กรมชลประทาน	69,825.93	38,366.56	54.95	66,186.60	35,588.98	53.77	1.18
3	กรมทางหลวง	107,568.92	57,675.38	53.62	120,044.00	61,392.15	51.14	2.48
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	29,841.10	9,071.12	30.40	27,512.17	11,070.04	40.24	-9.84



หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 49.65%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (45 หน่วยงาน) เฉลี่ย 48.75%

ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

1,068 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

7,870.21 ล้านบาท 69.75 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

252.40 ล้านบาท 2.24 %

เหลือจ่าย/ยกเลิก

85.82 ล้านบาท 0.76 %

เบิกจ่ายไม่ทัน แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ

664.66 ล้านบาท 5.89 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

2,410.67 ล้านบาท

21.36 %

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565



สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,068 รายการ

(เงินกัน 1,067 รายการ โอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ



812 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง



253 รายการ

ยกเลิกรายการ



3 รายการ

หมายเหตุ: รายการโอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ล้านบาท

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

รวม

แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95	11,283.76
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	839.80	1,330.56	866.19	879.60	463.75	414.80				7,870.21
ผลต่าง	-	- 428.49	- 1,221.49	- 746.44	- 3.28	- 580.67	351.53	139.47	71.17				

ต.ค.64

พ.ย.64

ธ.ค.64

ม.ค.65

ก.พ.65

มี.ค.65

เม.ย.65

พ.ค.65

มิ.ย.65

ก.ค.65

ส.ค.65

ก.ย.65

กองแผนงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย
100%

ผลการดำเนินงาน

มิตติ คร.ม./คำสั่งนายก อบม.ตั้งงบกลาง 64

รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ

งบประมาณ 4,605.14 ล้านบาท

เบิก 3,127.09 ล้านบาท 67.90 %



ผลการดำเนินงาน



แล้วเสร็จ

1,110 รายการ 93.43 %



ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ

76 รายการ 6.40 %



ยกเลิก

2 รายการ 0.17 %

ตัวชี้วัดของโครงการ



พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่



พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 857,165 ไร่ 86.38 %



ปริมาณน้ำ 16.74 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์ = 11.23 ล้าน ลบ.ม. 67.08 %



ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 126,143 ครัวเรือน 89.42 %

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565



มติ ครม.
8 มิ.ย. 64
ครุภัณฑ์

มติ ครม.
15 มิ.ย.
64

มติ ครม.
14 ก.ย.
64

คำสั่งนายก
29 ก.ย.
64

คำสั่งนายก
29 ก.ย.
64

คำสั่งนายก
29 ก.ย.
64

กปร.
ปี 2564

24 รายการ

426.47 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่างดำเนินการ

24 รายการ

(ส่งมอบ)*

-
%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 16

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ
เคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ในช่วงฤดูฝนปี 2564

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการ
แก้ไขปัญหายุทกภัยและภัยแล้ง

44 รายการ

1,183.31 ล้านบาท

เบิกจ่าย 499.97 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 42.25

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

29 รายการ

• แล้วเสร็จ 15 รายการ

39.83
%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 16

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่
ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไข
ปัญหายากภัยแล้ง ปี 2563/2564

1,046 รายการ

1,562.30 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,501.66 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 96.12

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

4 รายการ

• แล้วเสร็จ 1,040 รายการ

• ยกเลิก 2 รายการ

97.42
%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 23

ปริมาณน้ำ 1.26 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิด
อุทกภัย และปัญหายากภัยแล้ง ปี 2564

1 รายการ

94.70 ล้านบาท

เบิกจ่าย 0.10 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.11

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

1 รายการ

50.00
%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย.

พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

1 รายการ

83.09 ล้านบาท

เบิกจ่าย 66.73 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 80.32

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

1 รายการ

75.00
%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย.

พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและ
ระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3
และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคาร
ประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

1 รายการ

70.00 ล้านบาท

เบิกจ่าย 38.73 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 55.33

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

1 รายการ

70.00
%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 29

พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัด
เพชรบุรี

71 รายการ

1,185.27 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,019.90 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 86.05

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

16 รายการ

• แล้วเสร็จ 55 รายการ

83.25
%

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน
จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) ประจำปี 2564

ผลการดำเนินงาน

มีมติ คร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี 65

รวม 2 ครั้ง จำนวน 657 รายการ

งบประมาณ 1,843.14 ล้านบาท เบิก 129.83 ล้านบาท 7.04%

ผลการดำเนินงาน

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 128 รายการ 19.48%

จัดซื้อ-จัดจ้าง 186 รายการ 28.31%

ดำเนินการก่อสร้าง 336 รายการ 51.14%

แล้วเสร็จ 5 รายการ 0.76%

ยกเลิก 2 รายการ 0.31%

ตัวชี้วัดของโครงการ

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่

ครัวเรือน 130,088 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 75 ครัวเรือน 0.05%

มติ คร.ม.
29 มี.ค.
65

กปร.

ปี 2565

620 รายการ
1,126.19 ล้านบาท

เบิกจ่าย 37.44 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 3.32

- แล้วเสร็จ 5 รายการ
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 313 รายการ
- จัดซื้อ-จัดจ้าง 176 รายการ
- เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 124 รายการ
- ยกเลิก 2 รายการ

1.00 %

- ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

37 รายการ
716.95 ล้านบาท

เบิกจ่าย 92.39 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.45

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 23 รายการ
- จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 รายการ
- เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ

6.67 %

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) ประจำปี 2565

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565



ส่วนติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน





5

เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



UP ภาพรวมโครงการเงินกู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



การเบิกจ่ายงบประมาณ **4,224.82** ล้านบาท



เบิกจ่าย **3,887.80** ล้านบาท **92.02%**



คงเหลือ **152.96** ล้านบาท **3.62%**



เหลือจ่าย **184.08** ล้านบาท **4.36%**



สถานะการดำเนินงาน



ดำเนินการก่อสร้าง
10 รายการ = 2.61%

แล้วเสร็จ **371** รายการ
= 96.61%

ยกเลิก **3** รายการ
= 0.78%



ตัวชี้วัดของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ :

- ซ่อมแซม/ปรับปรุง **207** รายการ - ฝาย **21** รายการ
- อาคารบังคับน้ำ **12** รายการ - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า **10** รายการ
- ระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรกรรม **30** รายการ
- ขุดลอก **61** รายการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 รายการ)
- แก้มลิง **40** รายการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ)
- อื่น ๆ เช่น ประตุน้ำขึ้นน้ำลง ท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ **3** รายการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ)

ผลลัพธ์ของโครงการ :

พท.ชป. **19,667** ไร่
= 19,667 ไร่ 100%

ปริมาณน้ำ **26.98** ล้าน ลบ.ม.
= 17.28 ล้าน ลบ.ม. 64.05%



พท.รับประโยชน์ **209,653** ไร่
= 195,668 ไร่ 93.33%

ครัวเรือน
รับประโยชน์ **64,952** ครัวเรือน
= 61,127 ครัวเรือน 94.11%

การจ้างแรงงาน **9,716** คน
= 10,918 คน 112.37%



ผลการดำเนินงานจำแนกตามสำนัก/กอง มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

จำนวน
รายการ

140

120

100

80

60

40

20

0



รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 10 รายการ

สถานะการดำเนินงาน

■ แล้วเสร็จ = 371

■ ผลงานร้อยละ 71-99 = 8

■ ผลงานร้อยละ 41-70 = 2

✗ ยกเลิก = 3

Note :



งานจ้างเหมา
ทั้งโครงการ



จ้างเหมา
บางส่วน



ดำเนินการเอง

ประเภทการดำเนินงาน

90 รายการ

77 รายการ

214 รายการ

= รวม 381 รายการ



หมายเหตุ : 1. ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่ สขป.6 = 2 รายการ และสขป.7 = 1 รายการ

2. งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 184.0674 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว

สำนัก/กอง

16 กองแผนงาน



6

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565




รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้


(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565)

งานกองทุน จัดรูปที่ดิน



จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

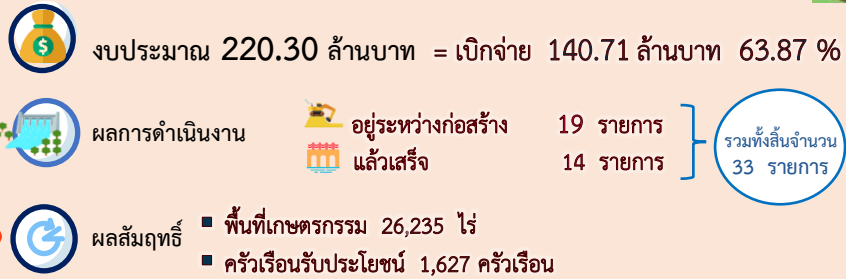

จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร

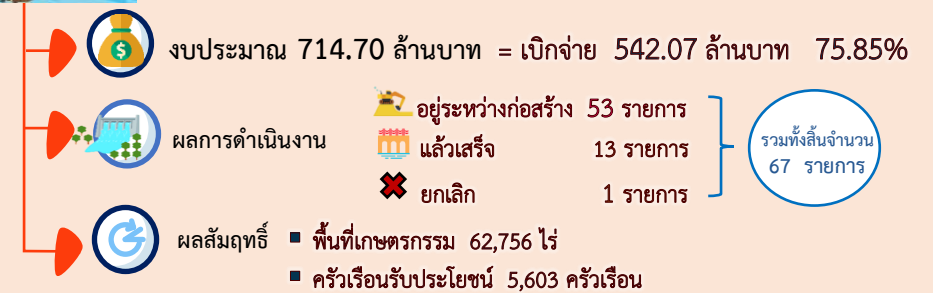

ภาพรวม



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ผลการดำเนินงาน : 1,541 รายการ



เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน



รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2565 (บาท)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	สถานะดำเนินการ	ประเภท
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 41 รายการ			1,864,444,400	1,883,851,000		
1	กทก.	(1) สะพานรยอนต์ทางหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง) - [9550]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	งานปีเดียว	79,780,000	79,780,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	พรบ.
2	กทก.	(230) ประชูประบายน้ำวังงามและอาคารประกอบโครงการประชูประบายน้ำคลองกลายบ้านนาขุน ตำบลสระแก้วอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9490]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานผูกพันใหม่	137,600,000	137,600,000	5.เปิดของ	พรบ.
3	กทก.	(367) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยม จังหวัดยะลา - [9013]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	137,550,000	137,550,000	5.เปิดของ	พรบ.
4	สมต.	(11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าเรือย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี - [8589]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	62,292,400	22,338,050	2.อนุมัติแผน	พรบ.
5	สมต.	(1.12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าเรือย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอ่างทอง - [8560]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	598,500	598,500	2.อนุมัติแผน	พรบ.
6	สมต.	(1.2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าเรือย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา - [8550]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	2.อนุมัติแผน	พรบ.
7	สขป. 10	(1.4196) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี - [6388]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	พรบ.
8	สขป. 10	(1.4067) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 3 ซ้ายฝั่งขวา กม.12+856 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหนองสน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [6259]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	280,000	280,000	2.อนุมัติแผน	พรบ.
9	สขป. 10	(1.4005) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี - [6197]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา	พรบ.
10	สขป. 11	(1.4295) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านน้ำ อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [6487]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา	พรบ.
11	สขป. 11	(1.164) ปรับปรุงก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางแก กม.7+700 ของคันกันน้ำสายบางโพธิ์-เสนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบางโพธิ์ อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [1920]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,500,000	4,500,000	6.อนุมัติรับราคา	พรบ.
12	สขป. 11	(33) เชื่อมป้องกันตลิ่งและขุดลอกคลองลัดโพธิ์ ทั้ง 2 มีระยะทาง 100 เมตร ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ - [1660]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	220,000,000	220,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	พรบ.
13	สขป. 13	(1.102) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-3L-1R ส่วนการบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สขป.13 ระยะทาง 8.400 กม. ตำบลเขาสวนลิมพบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี - [1858]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	902,200	902,200	6.อนุมัติรับราคา	พรบ.
14	สขป. 13	(1.94) ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้า คลองส่งน้ำ 4ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี - [662]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000	1,500,000	5.เปิดของ	พรบ.
15	สขป. 16	(195) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำฝายคลองหลักสาม และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [9455]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	100,000,000	100,000,000	5.เปิดของ	พรบ.
16	สขป. 17	(1.186) ปรับปรุงสะพานรยอนต์ คลองระบายน้ำ D1-11.3R กม.8+347 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี - [1942]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,500,000	4,500,000	6.อนุมัติรับราคา	พรบ.
17	สขป. 4	(1.1119) ขุดลอกคลองโดยทอดจุดเข้าหามา คลองส่งน้ำสายใหญ่ MC ของขงชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเวียง-หนองขัว ปริมาณดิน 185,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคาสัง อำเภอรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - [3311]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,400,000	8,155,400	6.อนุมัติรับราคา	พรบ.
18	สขป. 14	(1.1477) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเพชรบุรี - [3669]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	49,100	49,100	2.อนุมัติแผน	พรบ.
19	สขป. 14	(1.1463) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดชุมพร - [3655]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	240,000	240,000	2.อนุมัติแผน	พรบ.
20	สขป. 9	(28) ซ่อมสร้างผิวทางเข้าหัวงานโครงการ ระยะทาง 2.74 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [2157]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	24,000,000	20,329,650	6.อนุมัติรับราคา	พรบ.
21	สคก.	(10) อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [557]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานผูกพันใหม่	46,742,000	46,742,000	5.เปิดของ	พรบ.
22	สคก.	(1.460) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [548]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	842,200	842,200	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	พรบ.
23	สบอ.	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8250]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	3,000,000	6.อนุมัติรับราคา	พรบ.
24	สบอ.	(1.146) ปรับปรุงสถานีหลักระบบโทรมาตร ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [714]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	6,551,000	6,551,000	6.อนุมัติรับราคา	พรบ.
25	สบอ.	(1.370) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์วิทยุวิทยุชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [458]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	117,000	117,000	6.อนุมัติรับราคา	พรบ.
26	สพญ.	(8) งานชุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 - [9528]	โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานผูกพันใหม่	676,200,000	676,200,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	พรบ.
27	สพญ.	(6) ประชูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง - [9514]	โครงการพัฒนาสูบน้ำช่วยเหลือหนองล่าง จังหวัดหนองคาย	งานผูกพันใหม่	228,000,000	228,000,000	5.เปิดของ	พรบ.
28	สพญ.	(364) สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำขุมแสงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลขุมแสง อำเภอน้ำจืด จังหวัดระยอง พื้นที่ชลประทาน 7,450 ไร่ - [9010]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	74,800,000	74,800,000	6.อนุมัติรับราคา	พรบ.
29	สอส.	(29) ค่าจ้างสำรวจออกแบบโครงการคลองระบายน้ำหลักป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [9045]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	40,000,000	40,000,000	5.เปิดของ	พรบ.
30	ศทส.	โครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมชลประทาน	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว		8,500,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
31	สอส.	จ้างสำรวจออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำมูลตอนล่างฝั่งซ้าย (ระยะที่ 1) จังหวัดอุบลราชธานี	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว		9,950,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
32	สอส.	จ้างสำรวจออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำมูลตอนล่างฝั่งขวา (ระยะที่ 1) จังหวัดอุบลราชธานี	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว		9,890,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
33	สขป. 14	ปรับปรุงถนนคันคลองอ่างเก็บน้ำกระหังสามระยะทาง 4.00 กม. ตำบลป่าเต็ง อำเภอแม่เงา ะงาน จังหวัดเพชรบุรี	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว		6,000,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
34	สขป. 9	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบายและอาคารประกอบ ประชูประบายน้ำ บางตลาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางตลาด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว		2,750,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
35	สขป. 9	ซ่อมแซมคันโอป ปตร.แม่บ้านก่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางตลาด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว		494,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
36	สขป. 9	ขุดลอกคลองโดยทอดจุดข้างวังมดลอง 14 ปริมาณดินขุดลอก 55,800 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางตลาด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว		2,200,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
37	สพญ.	ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในกรมชลประทานสามเสน อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นที่ 4 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว		1,144,000	2.อนุมัติแผน	โอนเปลี่ยนแปลง
38	สขป. 11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก (อ.3/24) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว		568,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง

ลำดับที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2565 (บาท)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	สถานะดำเนินการ	ประเภท
39	สขป. 17	ปรับปรุงฝายคลองไอร่ำป่าโจ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 50 ไร่ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว		9,890,000	6.อนุมัติรับราคา	โอนเปลี่ยนแปลง
40	สสท.	ปรับปรุงห้องกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ผลผลิตการจัดການงานชลประทาน	งานปีเดียว		9,389,900	3.ประกาศร่าง TOR	โอนเปลี่ยนแปลง
41	สขป. 14	ปรับปรุงสะพานคลองส่งน้ำสาย 12ซ้าย - 1ขวา ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางบุรี จังหวัดพระจวบคีรีขันธ์	ผลผลิตการจัดການงานชลประทาน	งานปีเดียว		2,500,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
