



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๕๐๕/๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๖๖4๐73

เรียน ผอ.ผง. สำนัก ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๙ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๒,๐๕๐.๓๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๘๒๑.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๗๙๙.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๔ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๒,๐๖๘.๐๕ ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา ๒,๗๐๔.๑๓ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๗๖ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐๗ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ และยกเลิก จำนวน ๙ รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๑ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๖๗๑.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๕๘๙.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๙ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๘๙๘.๐๔ ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา ๔๖๐.๕๓ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๘ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา จำนวน ๑ รายการ คือ ซ่อมสร้างผิวทางเข้าห้วงงานโครงการ ระยะทาง ๒.๗๔ กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบประมาณ ๒๔.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๘๘ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๔ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ ออช. เพื่อทราบต่อไป

๐๕๗ ๓๐๗

(นางสาวอวิศ ด้วงนุ้ม)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน ออช. สำนักเรียน รสบ. รรช. รรช. รรช. และผู้อำนวยการสำนัก/กอง เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

- ทราบ

โดย ผอ.ส่วน., ผอ.ก.ค., ทน.๑-๙ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายนนต์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้อย่างพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 219 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2,050.38 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,821.06 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,799.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.84 แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 2,068.05 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 2,704.13 ตัน คิดเป็นร้อยละ 130.76 ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 207 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ และยกเลิก จำนวน 9 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- **Para Asphalt Concrete** จำนวน 161 รายการ งบประมาณจัดสรร 1,332.78 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,323.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.31 แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 795.88 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,318.66 ตัน คิดเป็นร้อยละ 165.69 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 151 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างฯ ห้วยยาง (Para soil cement) ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอบักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา และซ่อมแซมถนนทำนบกดิน อ่างฯ ลำเชียงไกร (ตอนล่าง) (Para A/C) ระยะทาง 3.20 กิโลเมตร ตำบลบัลลังก์ อำเภอนนไทย จังหวัด นครราชสีมา และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- **Para Soil Cement** จำนวน 29 รายการ งบประมาณจัดสรร 153.95 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 153.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 1,210.73 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,324.03 ตัน คิดเป็นร้อยละ 109.36 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 28 รายการ และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คือ ซ่อมแซมถนนท้าย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3/2563 มีมติให้ชะลอแผนการดำเนินงาน โดยให้ส่วนความปลอดภัยเขื่อนของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จัดตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อศึกษาและสรุปรูปแบบในการแก้ไขและปรับปรุงเขื่อนห้วยยาง จังหวัดสระแก้วอย่างเร่งด่วน

- **โครงการขยายผลทุ่นยางพาราดักผักตบชวา (Para – Log Boom-I)** จำนวน 1 รายการ งบประมาณจัดสรร 82.85 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 82.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ

- **รายการงานโอนเปลี่ยนแปลง** จำนวน 28 รายการ งบประมาณจัดสรร 251.48 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 239.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.28 แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 61.44 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 61.44 ตัน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 27 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ ปรับปรุงคันคลองพระยาบรรลือ ฝั่งเหนือ กม.7+150 ถึง กม.4+600 รวมความยาว 2.550 กิโลเมตร ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพารา ในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าหัวงาน โครงการชลประทาน รวมทั้งสิ้น 131 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท ได้รับงบประมาณ จัดสรร 1,671.75 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 589.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.29 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 898.04 ต้น ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 460.53 ต้น คิดเป็นร้อยละ 51.28 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา จำนวน 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 88 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 34 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ โดยจำแนกตาม ประเภทงาน ได้แก่

- **Para Asphalt Concrete** จำนวน 127 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,802.41 ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร 1,640.43 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 566.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.51 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 792.54 ต้น ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 386.37 ต้น คิดเป็นร้อยละ 48.75 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา จำนวน 1 รายการ คือ ซ่อมสร้างผิวทางเข้า หัวงานโครงการ ระยะทาง 2.74 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบประมาณ 24.00 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 86 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 32 รายการ และยกเลิกจำนวน 8 รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณ จากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว




- **Para Soil Cement** จำนวน 4 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 34.27 ล้านบาท ได้รับ งบประมาณจัดสรร 31.32 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 23.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.44 ของงบประมาณ จัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 105.50 ต้น ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 74.16 ต้น คิดเป็นร้อยละ 70.29 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565


กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

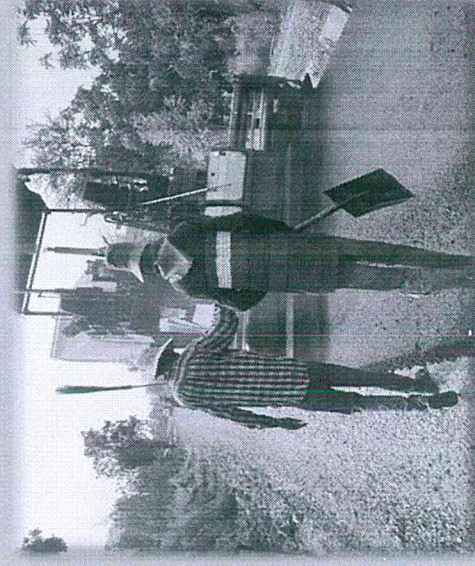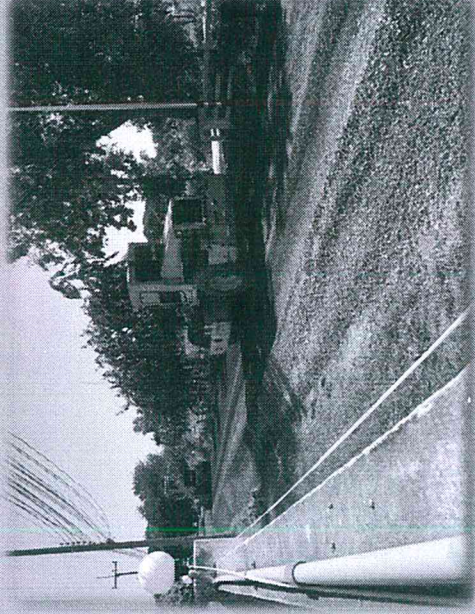





การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



พ.ร.บ. 2564			
ประเภท	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางขึ้น (ตัน)
แผน	1,821.06	219	2,068.05
ผล	1,799.88 (98.84%)	207	2,704.13 (130.76%)

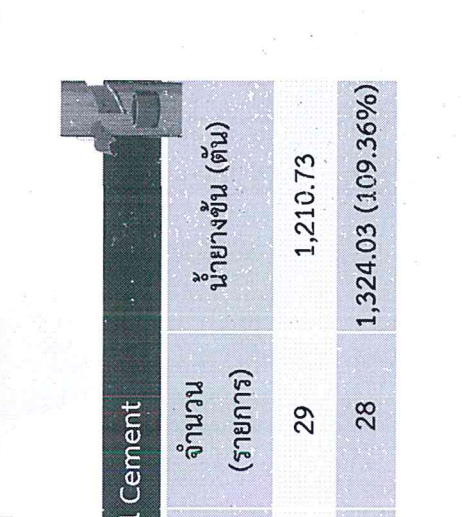

Para Asphalt Concrete			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางขึ้น (ตัน)
แผน	1,332.78	161	795.88
ผล	1,323.58 (99.31%)	151	1,318.66 (165.69%)

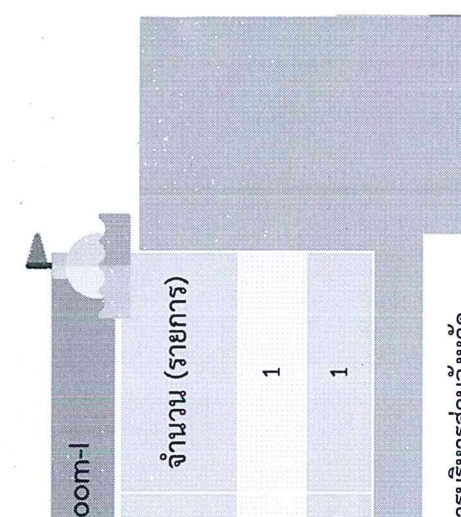

Para Soil Cement			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางขึ้น (ตัน)
แผน	153.95	29	1,210.73
ผล	153.83 (99.92%)	28	1,324.03 (109.36%)




รายการโอนเปลี่ยนแปลง			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางขึ้น (ตัน)
แผน	251.48	28	61.44
ผล	239.62 (95.28%)	27	61.44 (100.00%)

Para. - Log Boom-I			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางขึ้น (ตัน)
แผน	82.85	1	
ผล	82.85 (100%)	1	



หมายเหตุ : ยกเลิกจำนวน 9 รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

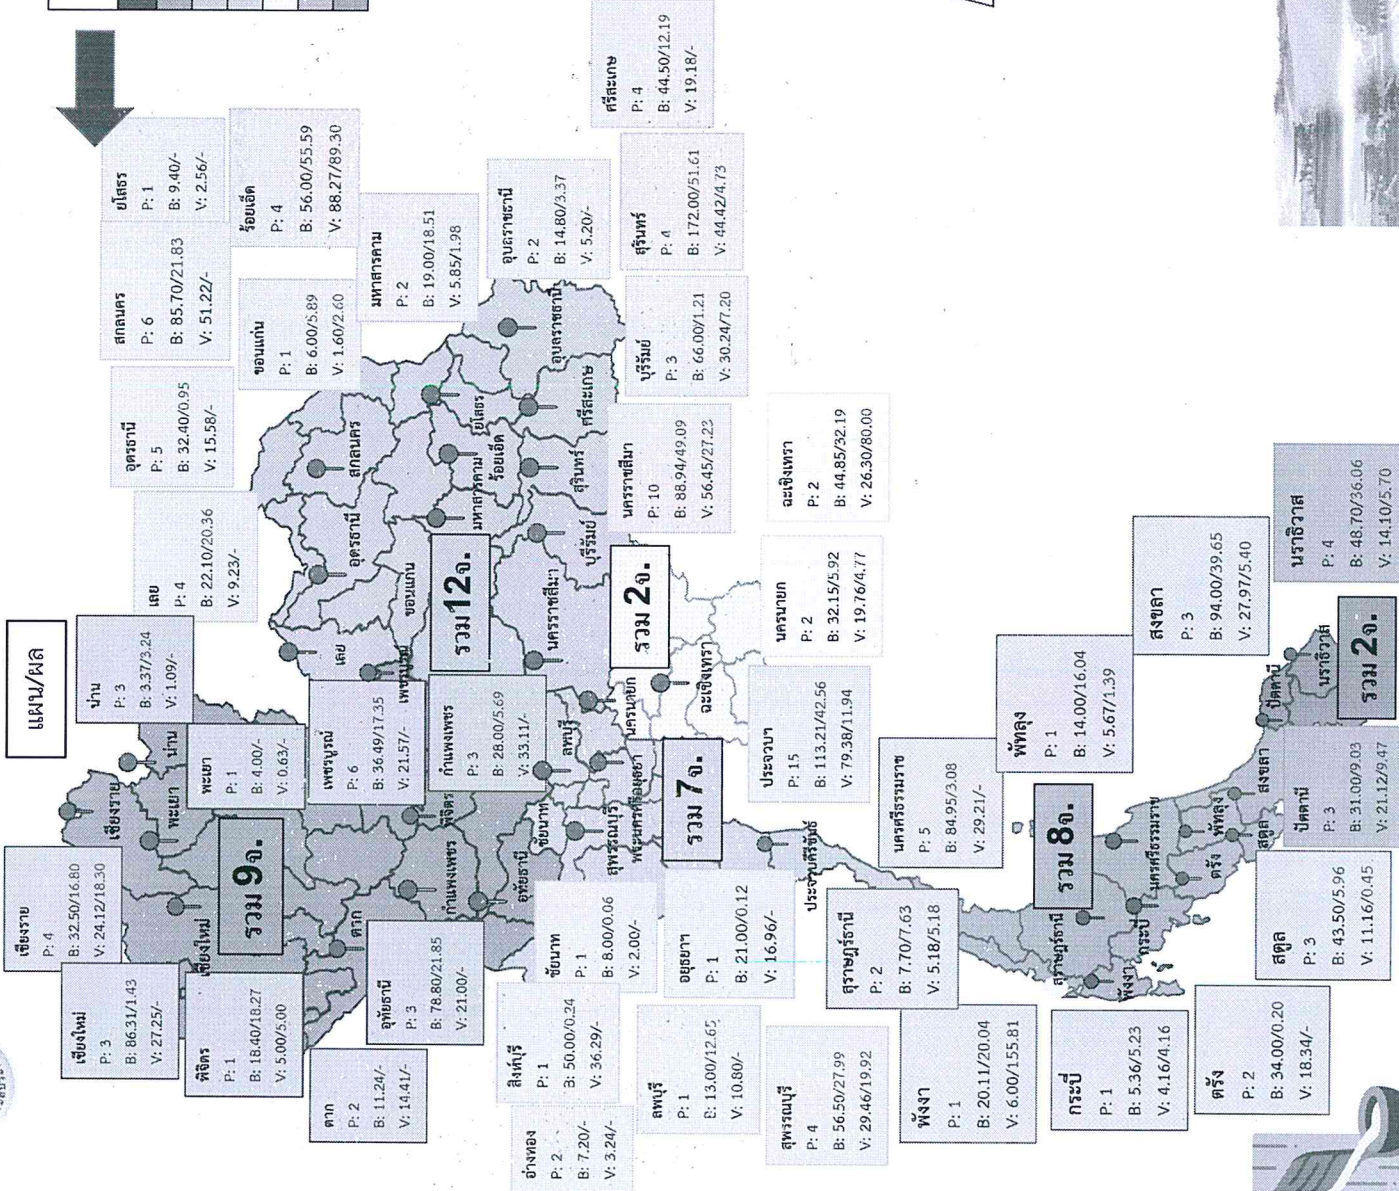

แผนการดำเนินงาน		P (PA-PS)		B		V	
ภาค/จังหวัด	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน
รวม 40 จ.	131	1,836.68	131	1,836.68	131	1,836.68	131
เหนือ	26 (26)	299.11	26 (26)	299.11	26 (26)	299.11	26 (26)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	46 (43-3)	616.84	46 (43-3)	616.84	46 (43-3)	616.84	46 (43-3)
กลาง	25 (25)	268.91	25 (25)	268.91	25 (25)	268.91	25 (25)
ตะวันออก	4 (4)	77.00	4 (4)	77.00	4 (4)	77.00	4 (4)
ใต้	23 (22-1)	495.12	23 (22-1)	495.12	23 (22-1)	495.12	23 (22-1)
ใช้จ่ายเงิน	7 (7)	79.70	7 (7)	79.70	7 (7)	79.70	7 (7)

ผลการดำเนินงานภาพรวม			
ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)
รวม	1,836.68	1,671.75	131
ผล	589.99 (32.12%)	589.99 (35.29%)	34

PA : Para Asphalt Concrete			
ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)
รวม	1,802.41	1,640.43	127
ผล	566.05 (31.41%)	566.05 (34.51%)	32

อยู่ระหว่างอนุมัติราคา 1 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 86 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 32 รายการ และยกเลิก 8 รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

PS : Para Soil Cement			
ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)
รวม	34.27	31.32	4
ผล	23.94 (69.86%)	23.94 (76.44%)	2

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ

- หมายเหตุ
- PA : Para Asphalt Concrete
 - PS : Para Soil Cement

