



บันทึกข้อความ

4649

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๕๔๐ /๒๕๖๕ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กม. 5334

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่กำหนดผู้ผูกพันมาด้วยแล้ว

ธวิมล ด้วงนุ่น

(นางสาวอวิยศ ด้วงนุ่น)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.
๕ ก.ค. ๒๕๖๕

- ทราบ

- เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.กอง, ทน. ๑-๕ ผอ.

11/๗ พ.ค. ๖๕

เพื่อโปรดทราบ ผอ.ผง.
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (ท.๖.๖๕)

ธกธรร

(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๕/๗

**สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565)**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 7 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 100,963.81 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 64,324.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.71 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 14,603 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 90 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.62 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 332 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.27 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6,726 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.06 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7,285 รายการ คิดเป็นร้อยละ 49.89 และยกเลิก จำนวน 170 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.16 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 77,143.43 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 47,292.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.30 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,360.22 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 5,305.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.08 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 69,783.21 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 41,987.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.17 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,659 รายการ (รายการ พ.ร.บ. 65 จำนวน 9,554 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ) ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.06 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 26 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.27 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5,887 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.95 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3,582 รายการ คิดเป็นร้อยละ 37.08 และยกเลิก จำนวน 158 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.64 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น

2. งบเงินกู้เบิกเหลี่ยมปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 8,126.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.02 งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 1,162.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.30 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 257.01 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 112.69 ล้านบาท และเบิกไม่ทันตามกำหนด 792.47 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,995.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.68 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,068 รายการ (รายการเงินกู้เบิกเหลี่ยมปี จำนวน 1,067 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 226 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.16 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 838 รายการ คิดเป็นร้อยละ 78.46 และยกเลิก จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.38 ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เนื่องจากราษฎรบางรายเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ และเกิดข้อพิพาทเรื่องมรดกเนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่ดินได้

3. งบกลาง พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 4,605.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,386.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.54 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,188 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 63 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.30 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,123 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.53 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 เนื่องจากมีการแก้ไขสถานที่การดำเนินงานจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

4. งบกลาง พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 1,965.54 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 283.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.42 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 663 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ จำนวน 84 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.67 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 90 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.57 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 477 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.95 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.51 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.30 เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

5. เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 งบประมาณ จำนวน 4,224.82 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,977.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.14 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 384 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 380 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.96 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 806.12 ล้านบาท เบิกจ่าย 540.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.04 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,541 รายการ ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 216 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.02 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.32 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,320 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.66

7. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 717.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.74 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 100 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 67 รายการ คิดเป็นร้อยละ 67.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 32 รายการ คิดเป็นร้อยละ 32.00 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.00 คือ รายการ จัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ระยะที่ 2 เนื่องจากการก่อสร้างจะมีผลกระทบกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565

รายละเอียดข้อมูล

1 > สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณความร่วมมือของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

3 > งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

5 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	100,963.81	64,324.01	63.71	14,603	90	332	6,726	7,285	ยกเลิก 170 รายการ
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (งบเบ็ดเตล็ด)	77,143.43	47,292.33	61.30	9,659	6	26	5,887	3,582	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,360.22	5,305.21	72.08						
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	69,783.21	41,987.12	60.17	9,659	6	26	5,887	3,582	ยกเลิก 158 รายการ
2. งบเงินกู้ไม่ใช้เงินเพื่อปี พ.ศ. 2563	11,283.76	8,126.58	72.02	1,068			226	838	- ยกเลิก 4 รายการ - ตั้งไม่ขยาย/สลาย PO/เบิกไม่ทัน - จำนวน 1,162.17 ล้านบาท - คงเหลือต้องดำเนินการต่อ จำนวน 1,995.01 ล้านบาท
3. งบกลาง พ.ศ. 2564	4,605.14	3,386.56	73.54	1,188			63	1,123	
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	3,419.87	2,358.42	68.96	1,117			49	1,066	
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาพายุและภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	426.47			24			24		
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183.31	746.83	63.11	44			22	22	
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2564/2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564	1,562.30	1,505.56	96.37	1,046				1,044	ยกเลิก 2 รายการ
- โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาบองล	94.70	0.10	0.11	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	83.09	67.17	80.84	1			1		
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำท่วมแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	70.00	38.76	55.37	1			1		
3.2 โครงการอื่นที่มีงบจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี พ.ศ. 2564	1,185.27	1,028.14	86.74	71			14	57	
4. งบกลาง พ.ศ. 2565	1,965.54	283.48	14.42	663	84	90	477	10	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565	1,126.19	136.30	12.10	620	77	83	448	10	ยกเลิก 2 รายการ
- โครงการอื่นที่มีงบจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565	839.35	147.18	17.53	43	7	7	29		
5. เงินกู้ ประจำปี พ.ศ. 2564	4,224.82	3,977.03	94.14	384			1	380	ยกเลิก 3 รายการ
6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565	806.12	540.43	67.04	1,541		216	5	1,320	
7. จัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565	935.00	717.55	76.74	100			67	32	ยกเลิก 1 รายการ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565

รวม	งบ พ.ร.บ.	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง
รายการ 9,659	70,135.62 ล้านบาท	67,727.33 ล้านบาท
✗ ยังไม่ดำเนินการ		
> พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง > โอนเปลี่ยนแปลง	6 1 5	79,78 79,78 105,29 79,78 25,51
⚡ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		
> พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง > โอนเปลี่ยนแปลง	26 23 3	1,645.43 1,645.43 1,622.92 1,602.50 20.42
✓ ก่อหนี้ผูกพัน		
> พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง > โอนเปลี่ยนแปลง	9,469 9,373 96	66,927.09 66,927.09 65,999.12 65,126.89 872.23
CANCEL ส่วนัก/กอง ยกเลิก	158	1,483.32

✗ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 6 รายการ (0.06%)
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 105.29 ล้านบาท (0.16%)

ผลการก่อหนี้ผูกพัน

แล้วเสร็จ จำนวน 3,582 รายการ
งบประมาณ 8,746.08 ล้านบาท

✓ ก่อหนี้ผูกพัน (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 9,469 รายการ (99.67%)
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 65,999.12 ล้านบาท (97.45%)


อยู่ระหว่างการระบวงการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 26 รายการ (0.27%)

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,622.92 ล้านบาท (2.39%)

- อนุมัติแผน 6 รายการ งบประมาณ 27.37 ล้านบาท
- ประกาศร่าง TOR 1 รายการ งบประมาณ 9.39 ล้านบาท
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ งบประมาณ 220.00 ล้านบาท
- เปิดซอง 7 รายการ งบประมาณ 1,130.33 ล้านบาท
- อนุมัติรับราคา 11 รายการ งบประมาณ 235.83 ล้านบาท

สรุปผลการอภิปรายผู้แทน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำแนกตามสำนัก/กอง

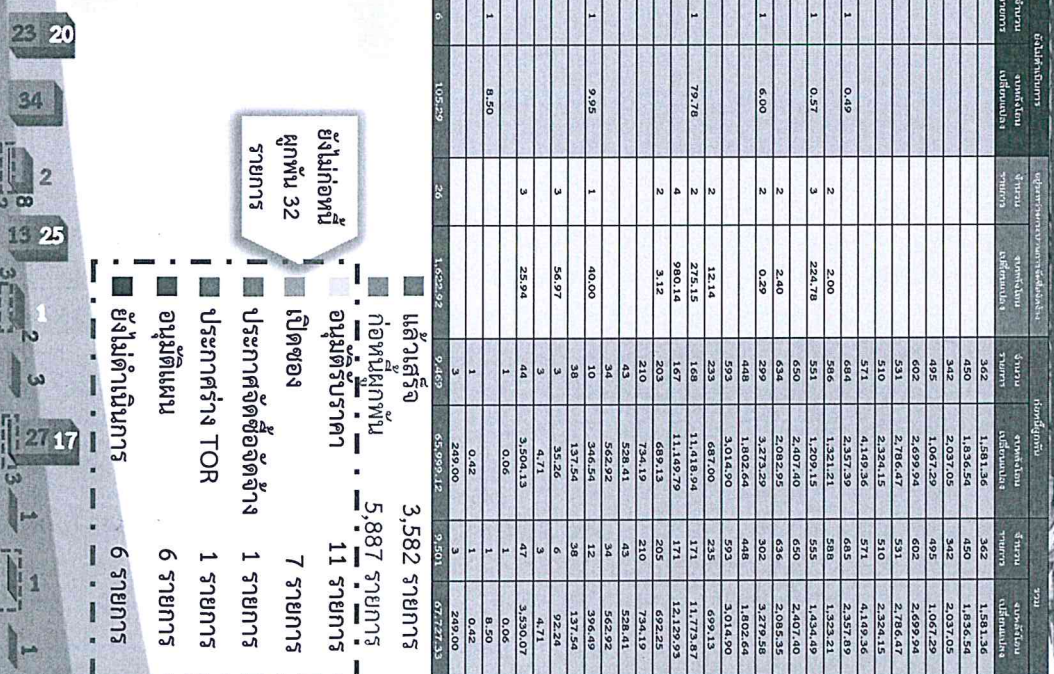

ยังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน 32
รายการ

■ แอลูมิเนียม	3,582 รายการ
■ ก่อหมื่นผูกพัน	5,887 รายการ
■ อนุพัตรปราศ	11 รายการ
■ เบ็ดทอง	7 รายการ
■ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	1 รายการ
■ ประกาศสร้าง TOR	1 รายการ
■ อนุมัติแผน	6 รายการ
■ ยังไม่ดำเนินการ	6 รายการ

2.3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบลงทุนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวนรายการ		ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อมูลเกิน						
					จำนวนรายการ	งบลงทุนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบลงทุนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบลงทุนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	อัตราทำเกินงบ (รวมทำ)						
											0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%	
รวม	68,652.30	67,727.33	41,266.62	60.93	9,501	6	105.29	26	1,622.92	9,469	65,999.12	1,451	477	661	1,044	2,254	3,582
สพป. 1	1,604.88	1,581.36	1,195.00	75.57	362					362	1,581.36	5	6	16	41	162	132
สพป. 2	1,890.25	1,836.54	1,375.91	74.92	450					450	1,836.54	82	22	25	43	184	94
สพป. 3	2,334.81	2,037.05	1,317.97	64.70	342					342	2,037.05	46	15	29	68	99	85
สพป. 4	1,074.89	1,067.29	814.90	76.35	495					495	1,067.29	133	58	65	43	80	116
สพป. 5	2,640.61	2,699.94	2,039.69	75.55	602					602	2,699.94	42	28	42	54	184	252
สพป. 6	2,646.30	2,786.47	2,035.97	73.07	531					531	2,786.47	10	5	26	46	137	307
สพป. 7	2,349.87	2,324.15	2,203.64	94.81	510					510	2,324.15	8	14	39	27	143	279
สพป. 8	4,016.81	4,149.36	1,999.38	48.19	571					571	4,149.36	65	32	39	70	80	285
สพป. 9	2,437.91	2,357.89	1,458.77	61.87	685	1	0.49			684	2,357.39	21	43	62	105	179	274
สพป. 10	1,336.82	1,323.21	697.71	52.73	588					586	1,321.21	115	22	29	60	197	163
สพป. 11	1,507.05	1,434.49	596.94	41.61	555	1	0.57			551	1,209.15	289	21	20	36	93	92
สพป. 12	2,416.48	2,407.40	1,388.83	57.69	650					650	2,407.40	56	40	53	68	171	262
สพป. 13	2,130.91	2,085.35	1,341.63	64.34	636					634	2,082.95	32	36	54	81	246	185
สพป. 14	3,273.65	3,279.58	1,872.48	57.10	302	1	6.00			299	3,273.29	24	27	27	48	44	129
สพป. 15	1,886.21	1,802.64	784.28	43.51	448					448	1,802.64	236	21	14	48	55	74
สพป. 16	3,057.93	3,014.90	1,293.94	42.92	593					593	3,014.90	34	29	38	44	39	409
สพป. 17	682.65	699.13	476.66	68.18	235					233	687.00	4	7	12	28	33	149
พทท.	12,193.60	11,773.87	7,925.40	67.31	171	1	79.78			168	11,418.94	96	13	10	23	14	12
สพญ.	12,268.92	12,129.93	5,659.66	46.66	171					167	11,149.79	78	17	32	10	16	14
สทอ.	695.81	692.25	258.35	37.32	205					203	689.13	12	9	17	90	42	33
สทก.	742.05	734.19	582.69	79.37	210					210	734.19	4	5	6	6	18	171
สทค.	531.51	528.41	416.37	78.80	43					43	528.41	6			2	15	20
สทก.	549.48	562.92	156.52	27.80	34					34	562.92	34					
สทค.	376.65	396.49	181.34	45.74	12	1	9.95			10	346.54	6	1		1	2	2
สทค.	138.22	137.54	124.96	90.85	38					38	137.54	2			2		25
สทค.	82.68	92.24	1.24	1.34	6					3	56.97	2					1
สทค.	4.71	4.71	3.99	84.62	3					3	4.71	3					
สทค.	3,531.61	3,530.07	3,017.99	85.49	47					44	3,504.13	3	4	6		14	17
พทค.		0.06	0.06	99.87	1					1	0.06	1					
สทค.		8.50			1	1	8.50										
สทค.		0.42			1					1	0.42	1					
Lump Sum	249.00	249.00	44.37	17.82	3					3	249.00	3					

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 158 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,483.32 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น จังหวัด เงินเพื่อจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น

2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 918.16 ล้านบาท



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลิตภัณฑ์/โครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Gen Project ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565


หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบเหลือโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน รายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		งบเหลือโอน		ทำข้อมูลกับ					
						จำนวน รายการ	งบเหลือโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบเหลือโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบเหลือโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
												0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,652.30	67,727.33	41,266.62	60.93	9,501	6	105.29	26	1,622.92	9,469	65,999.12	1,451	477	661	1,044	2,254	3,582
โครงการเชื่อมท่าอากาศยาน ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	809.00	789.57	447.89	56.73	10					10	789.57	2	1	5		2	
โครงการคลองระบายน้ำคลองบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,561.63	2,763.14	1,385.51	50.14	14			1	676.20	13	2,086.94	8	1	1		1	2
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	27,292.02	26,830.58	17,604.56	65.61	627	1	9.95	6	278.29	620	26,542.34	168	56	84	98	154	60
โครงการบริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะที่ 1)	499.74	419.35	244.51	58.31	9	1	79.78			8	339.57	7					1
โครงการบริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา	789.37	811.89	244.01	30.05	13					13	811.89	7	2	4			
โครงการบริหารท่าอากาศยานภูเก็ตอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่2) จังหวัดสงขลา	141.06	141.06			1					1	141.06					1	
โครงการประมงระบายน้ำกับก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสตูลนคร	99.56	69.39	62.40	89.93	4	4				4	69.39	2		1		1	
โครงการประมงระบายน้ำลำน้ำห้วยน้ำแก้วเชื่อมแอ่งจากพระราชดำริ จังหวัด สตูลนคร	312.00	312.00	121.37	38.90	4					4	312.00	2		2			
โครงการประมงระบายน้ำศรีสองรักษ์เชื่อมแอ่งจากพระราชดำริ จังหวัดเลย	72.00	91.19	42.47	46.57	4					4	91.19			1	2		1
โครงการปรับปรุงคลองยม - ป่าน จังหวัดสุโขทัย	275.66	220.72	11.57	5.24	6					6	220.72	4		2			
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,308.96	6,347.87	3,134.20	49.37	380	1	6.00	1	1.50	378	6,340.37	72	45	46	58	104	53
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	10,895.81	10,730.88	5,331.92	49.69	296			1	137.60	295	10,593.28	81	36	43	55	51	29
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	1,033.27	1,061.23	350.96	33.07	14			1	228.00	13	833.23	8	2	2	2	1	
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้าในอำเภอเมืองหนองคาย	1,298.06	859.89	653.99	76.06	12			2	229.89	746	1,949.54	91	43	43	49	167	353
โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานอำเภอเมืองหนองคาย	2,193.40	2,179.43	1,447.00	66.39	748			2		6,748	10,480.45	903	257	392	732	1,634	2,830
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,508.73	10,494.16	7,882.40	75.11	6,758	1	0.49	9	13.21	5	237.64	3		1		1	
โครงการทำท่อโถมยื่นเมืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี	167.77	237.64	29.37	12.36	5					2	108.00	1					1
โครงการทำท่อโถมยื่นเมืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดระยอง	108.00	108.00	100.03	92.62	2					2	117.34	5		1			
โครงการทำท่อโถมยื่นเมืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี	104.14	117.34	67.82	57.80	6					6	117.34	5		1			
โครงการทำท่อโถมยื่นเมืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดพระยา	348.02	348.02	59.66	17.14	7					7	348.02	5		1		1	
โครงการทำท่อโถมยื่นเมืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	637.62	637.62	564.96	88.60	5					5	637.62	3					1
โครงการทำท่อโถมยื่นเมืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	388.00	388.00	251.77	64.89	3					3	388.00	3		1			1
โครงการทำท่อโถมยื่นเมืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	525.00	404.98	338.85	83.67	3					3	404.98		1	1			1
โครงการทำท่อโถมยื่นเมืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา	313.78	361.03	309.92	85.84	6					6	361.03			1	1	1	3
โครงการทำท่อโถมยื่นเมืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	969.71	1,002.38	579.49	57.81	564	2	9.07	5	58.24	557	935.07	72	29	29	48	133	246

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 158 รายการ จบ พ.ร.บ. 1,483.32 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น จ.ภูเก็ต เงินเหลือจ่ายจากงบประมาทรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น
2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ งบประมาณเหลือโอนเปลี่ยนแปลง 918.16 ล้านบาท




2.5

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565

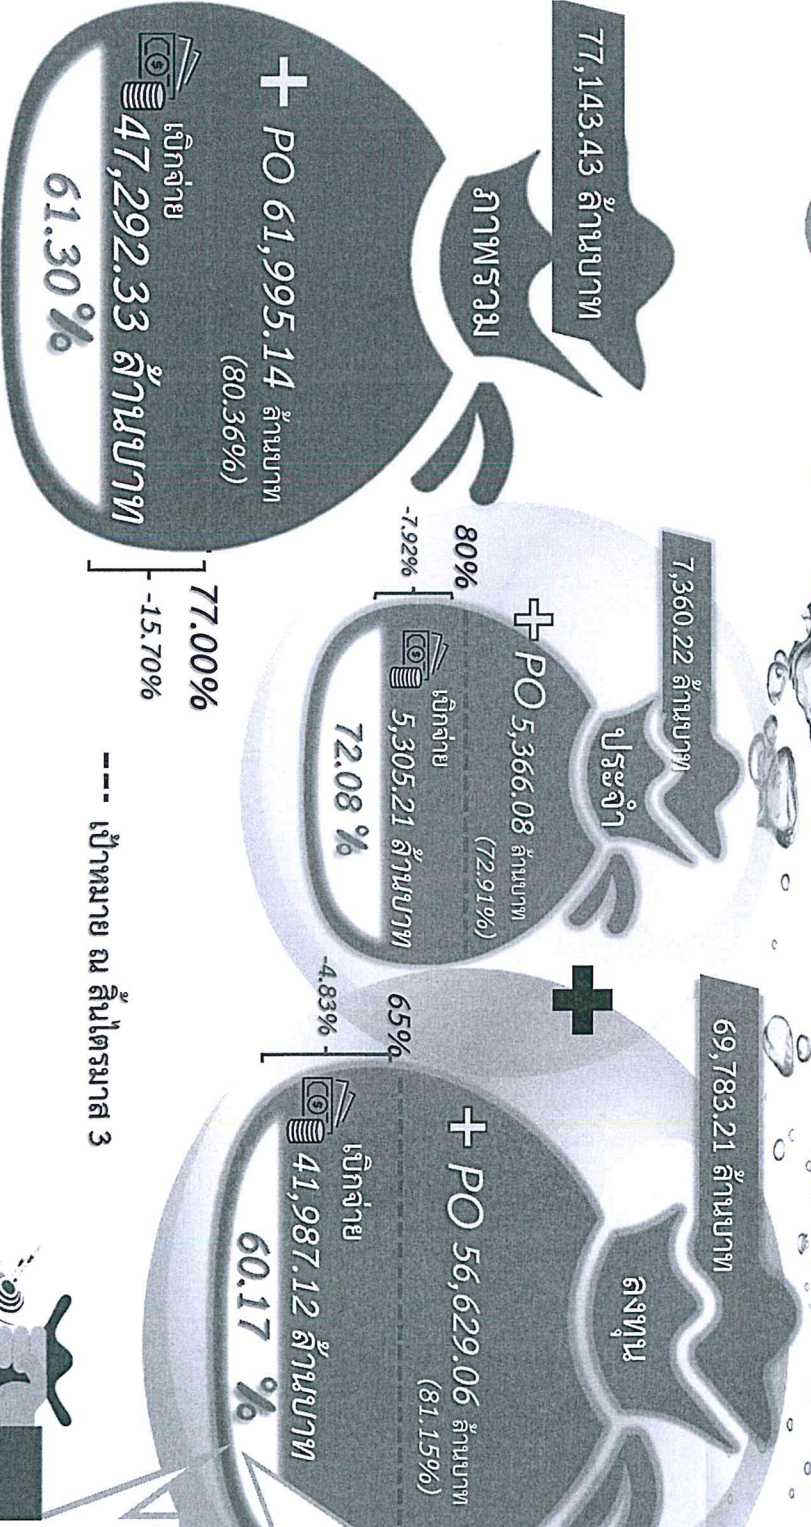

เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 3



รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

-ผูกพันเดิม จำนวนทั้งสิ้น 109 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 10,761.98 ล้านบาท เบิกจ่าย 6,250.67 ล้านบาท (58.08%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 92 รายการ (84.40%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 8,662.28 ล้านบาท (80.49%) แล้วเสร็จ จำนวน 17 รายการ (15.60%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,099.70 ล้านบาท (19.51%)


-ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,178.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 258.15 ล้านบาท (11.85%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (72.00%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 837.18 ล้านบาท (38.44%) โดยอยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ (28.00) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,340.89 ล้านบาท (61.56%)

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 9,367 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 56,843.16 ล้านบาท เบิกจ่าย 35,478.30 ล้านบาท (62.41%) โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 6 รายการ (0.06%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 105.29 ล้านบาท (0.19%) อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 19 รายการ (0.20%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 282.03 ล้านบาท (0.50%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 5,777 รายการ (61.67%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 47,753.58 ล้านบาท (84.01%) และแล้วเสร็จ จำนวน 3,555 รายการ (38.07%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 8,702.26 ล้านบาท (15.30%)

2.6

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565

ภาพรวม
77,143.43 ล้านบาท
เบิกจ่าย
47,292.33 ล้านบาท
61.30 %

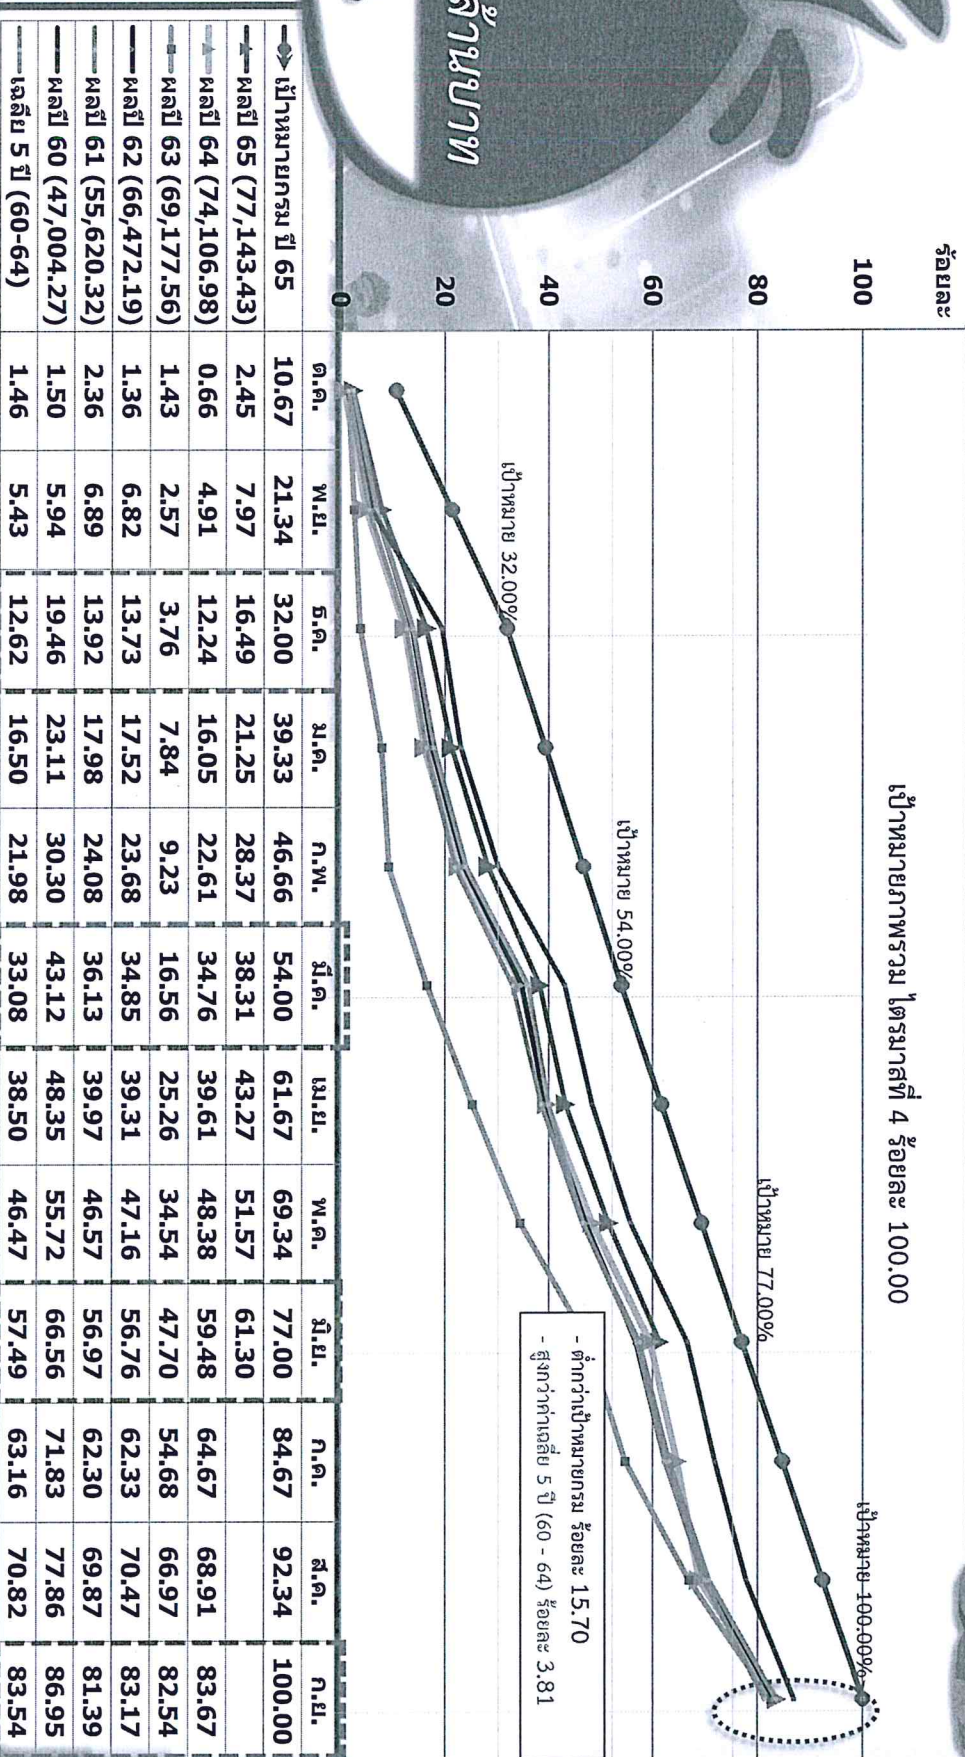

2.7

สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ข้อมูลจากการบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565

ร้อยละ

เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

เป้าหมายรัฐบาล 100.00%

69,783.21 ล้านบาท

ลงทุน

เบิกจ่าย

41,987.12 ล้านบาท


60.17%

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายกรม ปี 65	6.67	13.34	20.00	28.33	36.66	45.00	51.67	58.34	65.00	76.67	88.34	100.00
ผลปี 65 (70,135.62)	1.94	7.11	15.67	20.09	27.12	37.20	41.86	50.22	60.17			
ผลปี 64 (66,423.87)	0.003	3.81	10.97	14.29	20.79	33.39	37.90	46.78	58.21	63.11	66.85	82.02
ผลปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	4.77	5.36	12.51	21.31	30.59	44.54	51.34	64.24	80.61
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
ผลปี 61 (47,566.20)	1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
ผลปี 60 (38,118.10)	0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69
เฉลี่ย 5 ปี (60 - 64)	0.68	3.98	11.07	14.27	19.39	30.90	35.95	43.78	55.38	60.52	68.10	81.38

- ค่าเป้าหมายกรม ร้อยละ 4.83
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (60 - 64) ร้อยละ 4.79

2.8

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

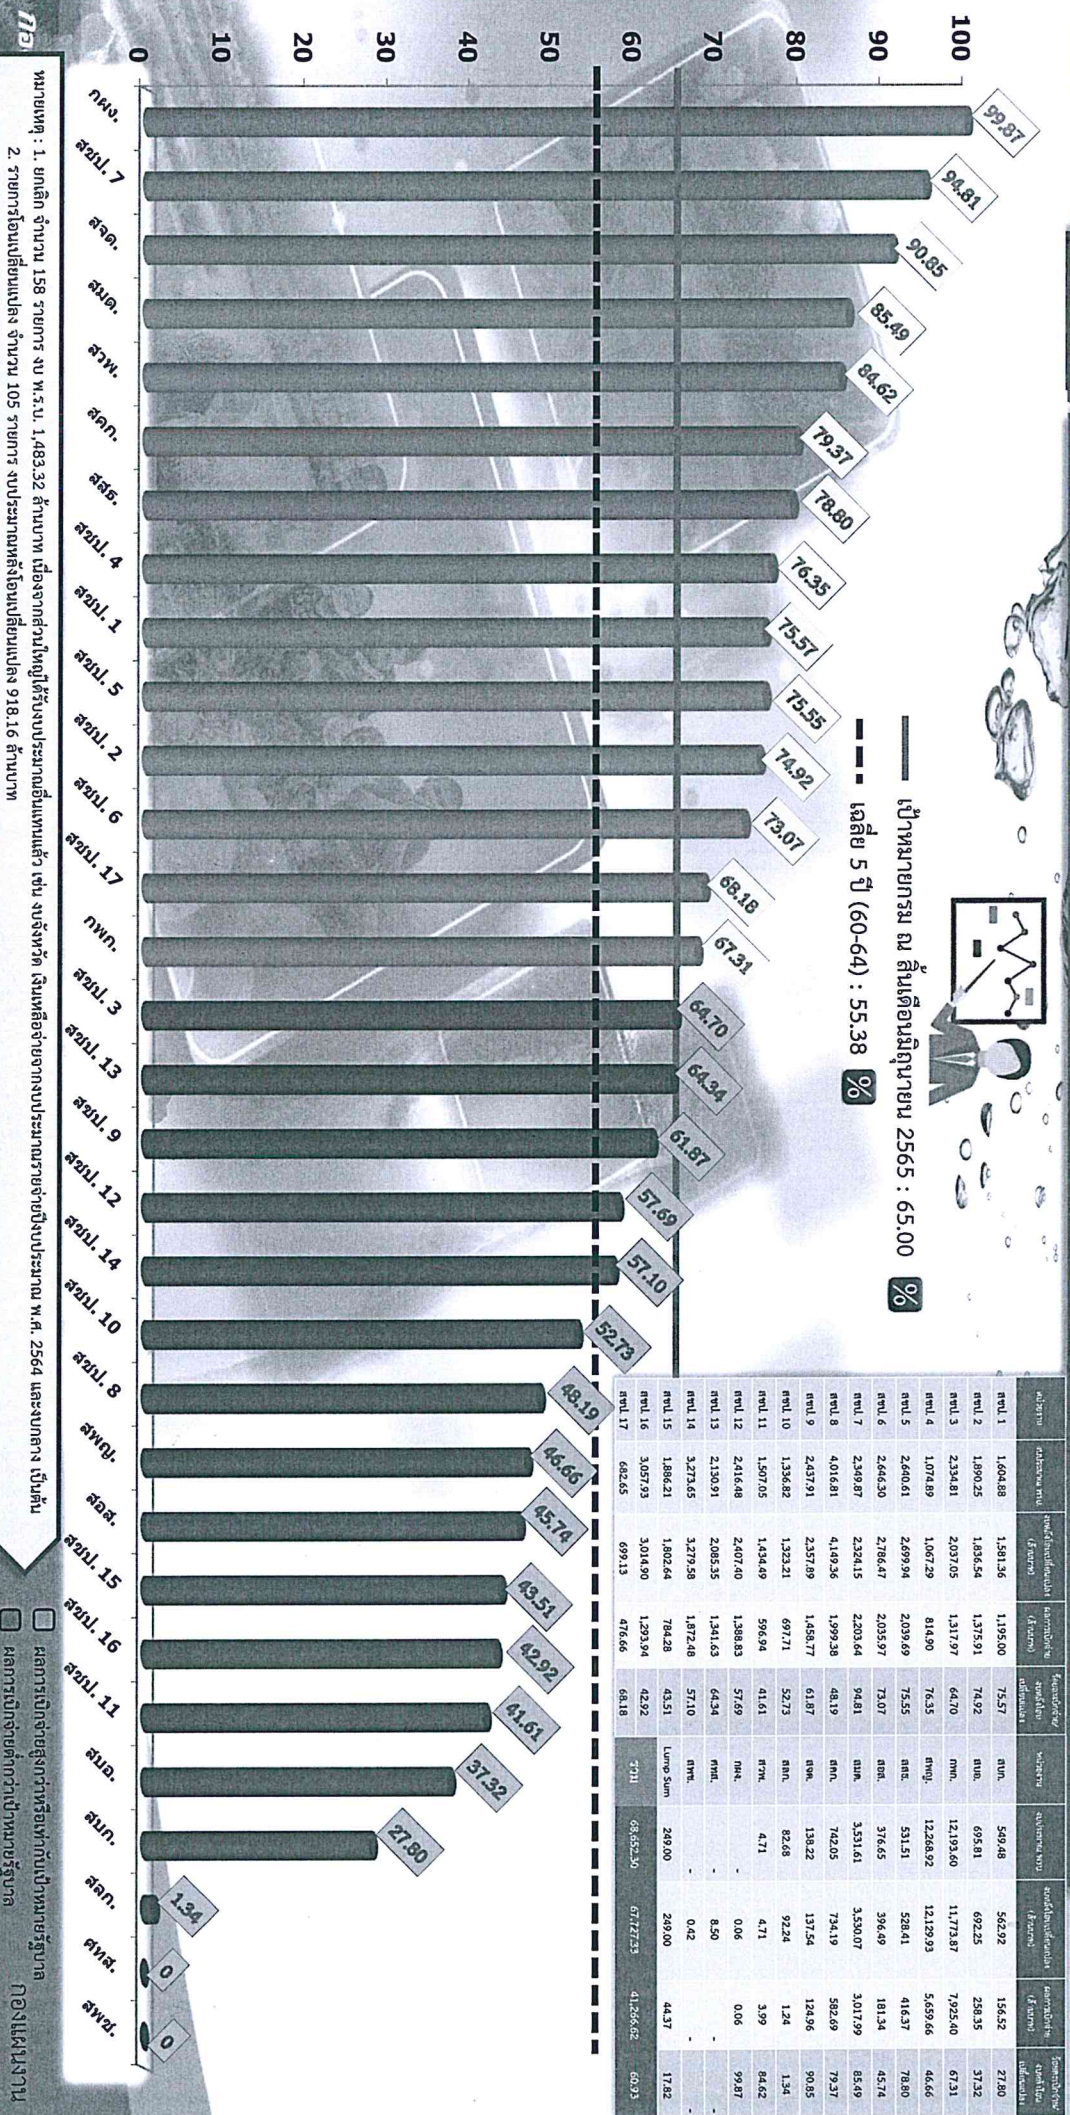

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 158 รายการ กบ.พ.ร.บ. 1,483.32 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้ใช้งบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น กิจการวิเทศ เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น
2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ งบประมาณหลักโอนเปลี่ยนแปลง 918.16 ล้านบาท

☐ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายรัฐบาล

☐ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

2.9

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
1	<u>ระดับกระทรวง</u> (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)	161,035.43	99,563.34	61.83	177,217.91	95,682.44	53.99	7.84
2	กระทรวงคมนาคม	75,084.47	44,791.74	59.66	72,204.20	42,309.86	58.60	1.06
3	กระทรวงมหาดไทย	75,727.48	30,328.13	40.05	80,618.68	27,142.13	33.67	6.38
1	<u>ระดับกรมใน กษ.</u> (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมพัฒนาที่ดิน	1,848.18	1,405.40	76.04	2,113.79	1,662.92	78.67	-2.63
2	กรมชลประทาน	69,783.21	41,987.12	60.17	66,184.79	38,524.44	58.21	1.96
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,272.34	254.57	20.01	1,159.16	570.65	49.23	-29.22
1	<u>ระดับกรม</u> (ผู้เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)							
1	กรมทางหลวงชนบท	44,275.39	28,909.66	65.30	47,151.29	25,301.10	53.66	11.64
2	กรมทางหลวง	107,554.34	67,020.46	62.31	119,988.64	67,417.53	56.19	6.12
3	กรมชลประทาน	69,783.21	41,987.12	60.17	66,184.79	38,524.44	58.21	1.96
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	29,841.10	9,601.45	32.18	27,512.17	11,337.91	41.21	-9.03

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 54.09%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (45 หน่วยงาน) เฉลี่ย 53.69%

ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้ยืมเบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

1,068 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

8,126.58 ล้านบาท 72.02 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

257.01 ล้านบาท 2.28 %

เหลือจ่าย/ยกเลิก

112.69 ล้านบาท 1.00 %

เบิกจ่ายไม่ทัน แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ

792.47 ล้านบาท 7.02 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

1,995.01 ล้านบาท

17.68 %

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากระบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,068 รายการ

(เงินต้น 1,067 รายการ โอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ

838 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

226 รายการ

ยกเลิกรายการ

4 รายการ

หมายเหตุ: รายการโอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ คือ เงินทดรองค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ล้านบาท

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ยืมเบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

รวม

แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95	11,283.76
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	839.80	1,330.56	866.19	879.60	463.75	671.17				8,126.58
ผลต่าง	-	-428.49	-1,221.49	-746.44	-3.28	-580.67	351.53	139.47	327.54				

ต.ค.64 พ.ย.64

ธ.ค.64

ม.ค.65

ก.พ.65

มี.ค.65

เม.ย.65

พ.ค.65

มิ.ย.65

ก.ค.65

ส.ค.65

ก.ย.65

กองแผนงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย 100%

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
 มติ คร.ม./คำสั่งนายก อบม.ต.งบกลาง 64
 รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ
 งบประมาณ 4,605.14 ล้านบาท
 เบิก 3,386.56 ล้านบาท 73.54%

ผลสำเร็จ
 1,123 รายการ 94.53 %
 ยกเลิก
 2 รายการ 0.17 %

ตัวชี้วัดของโครงการ
 1. พื้นที่งบประมาณ 900 ไร่
 ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่
 พื้นที่งบประมาณ 992,298 ไร่
 ผลสัมฤทธิ์ = 860,965 ไร่ 86.76 %
 2. ปริมาณน้ำ 16.74 ล้าน ลบ.ม.
 ผลสัมฤทธิ์ = 11.28 ล้าน ลบ.ม. 67.38 %
 3. ค่าใช้จ่าย 141,057 ล้านบาท
 ผลสัมฤทธิ์ = 126,203 ล้านบาท 89.47 %

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565



มติ คร.ม.
 8 มิ.ย. 64
 ครุภัณฑ์

มติ คร.ม.
 15 มิ.ย. 64

มติ คร.ม.
 14 ก.ย. 64

คำสั่งนายก
 29 ก.ย. 64

คำสั่งนายก
 29 ก.ย. 64

คำสั่งนายก
 29 ก.ย. 64

กปร.
 ปี 2564

24 รายการ

426.47 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่างดำเนินการ

24 รายการ

(ส่งมอบ)

- %

44 รายการ

1,183.31 ล้านบาท

เบิกจ่าย 746.83 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 63.11

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

22 รายการ

• แล้วเสร็จ 22 รายการ

55.98 %

1,046 รายการ

1,562.30 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,505.56 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 96.37

• แล้วเสร็จ 1,044 รายการ

• ยกเลิก 2 รายการ

97.63 %

1 รายการ

94.70 ล้านบาท

เบิกจ่าย 0.10 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 0.11

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

55.00 %

1 รายการ

83.09 ล้านบาท

เบิกจ่าย 67.17 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 80.84

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

85.00 %

1 รายการ

70.00 ล้านบาท

เบิกจ่าย 38.76 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 55.37

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

75.00 %

71 รายการ

1,185.27 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,028.14 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 86.74

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

14 รายการ

• แล้วเสร็จ 57 รายการ

84.13 %

ให้เบิกจ่ายงบกลางงบกลาง สม.ปี 64

ให้เบิกจ่ายงบกลางงบกลาง สม.ปี 64

ให้เบิกจ่ายงบกลางงบกลาง สม.ปี 64

ให้เบิกจ่ายงบกลางงบกลาง สม.ปี 64

ให้เบิกจ่ายงบกลางงบกลาง สม.ปี 64

ให้เบิกจ่ายงบกลางงบกลาง สม.ปี 64

ให้เบิกจ่ายงบกลางงบกลาง สม.ปี 64

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ปี 2564

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำชลประทานฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหัวแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ปี 2564

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำชลประทานฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหัวแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ผลการดำเนินงาน

มีมติ ค.ร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี 65 รวม
2 ครั้ง จำนวน 663 รายการ

งบประมาณ 1,965.54 ล้านบาท เบิก 283.48 ล้านบาท 14.42 %

ผลการดำเนินงาน

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 84 รายการ 12.67 %
จัดซื้อ-จัดจ้าง 90 รายการ 13.57 %
ดำเนินการก่อสร้าง 477 รายการ 71.95 %

แก้ไข/แก้ใ้เสร็จ 10 รายการ 1.51 %
ยกเลิก 2 รายการ 0.30 %

ตัวชี้วัดของโครงการ

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = - ส่วน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = 75 ครั้ง/เรียน 0.05 %

ครัวเรือน 130,088 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 75 ครั้ง/เรียน 0.05 %



งานติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน

มติ ค.ร.ม.
65

กปร.
ปี 2565

620 รายการ
1,126.19 ล้านบาท

เบิกจ่าย 136.30 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 12.10

■ แก้ใ้เสร็จ 10 รายการ
■ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 448 รายการ
■ จัดซื้อ-จัดจ้าง 83 รายการ
■ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 77 รายการ
■ ยกเลิก 2 รายการ

2.54 %

■ ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
■ พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่
■ ครัวเรือนรับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้ง ปี 2565

43 รายการ
839.35 ล้านบาท


เบิกจ่าย 147.18 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 17.53

■ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 29 รายการ
■ จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 รายการ
■ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ

7.61 %

■ ดำเนินงานก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่ง
น้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ
โครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ประจำปี 2565



ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Hoject
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565





เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการเงินฟิวเจอร์ธุรกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



UP ภาพรวมโครงการเงินกู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเบิกจ่ายงบประมาณ 4,224.82 ล้านบาท

เบิกจ่าย 3,977.08 ล้านบาท 94.14%

เหลือจ่าย 212.63 ล้านบาท 5.03%

ถูกพับ 35.11 ล้านบาท 0.83%

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง 1 รายการ = 0.26%
แล้วเสร็จ 380 รายการ = 98.96%
ยกเลิก 3 รายการ = 0.78%

KPI ตัวชี้วัดของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ :

- ซ่อมแซม/ปรับปรุง 207 รายการ - ฝ่าย 21 รายการ
- อาคารบังคับน้ำ 12 รายการ - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 10 รายการ
- ระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรกรรม 30 รายการ
- ชุดลอก 61 รายการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ)
- แก้มลิง 40 รายการ
- อื่น ๆ เช่น ประตูปะบายน้ำ ท่อหัวดิน 3 รายการ

ผลลัพธ์ของโครงการ :

พพ. 19,667 ไร่
= 19,667 ไร่ 100%


เบี่ยงเบน 26.98 ล้านคน.
= 26.98 ล้านคน. 100%

พพ. 209,653 ไร่
= 208,783 ไร่ 99.59%

ครัวเรือน 64,952 ครัวเรือน
= 64,552 ครัวเรือน 99.38%


การจ้างงาน 9,716 คน
= 10,918 คน 112.37%

ป้องกันภัย

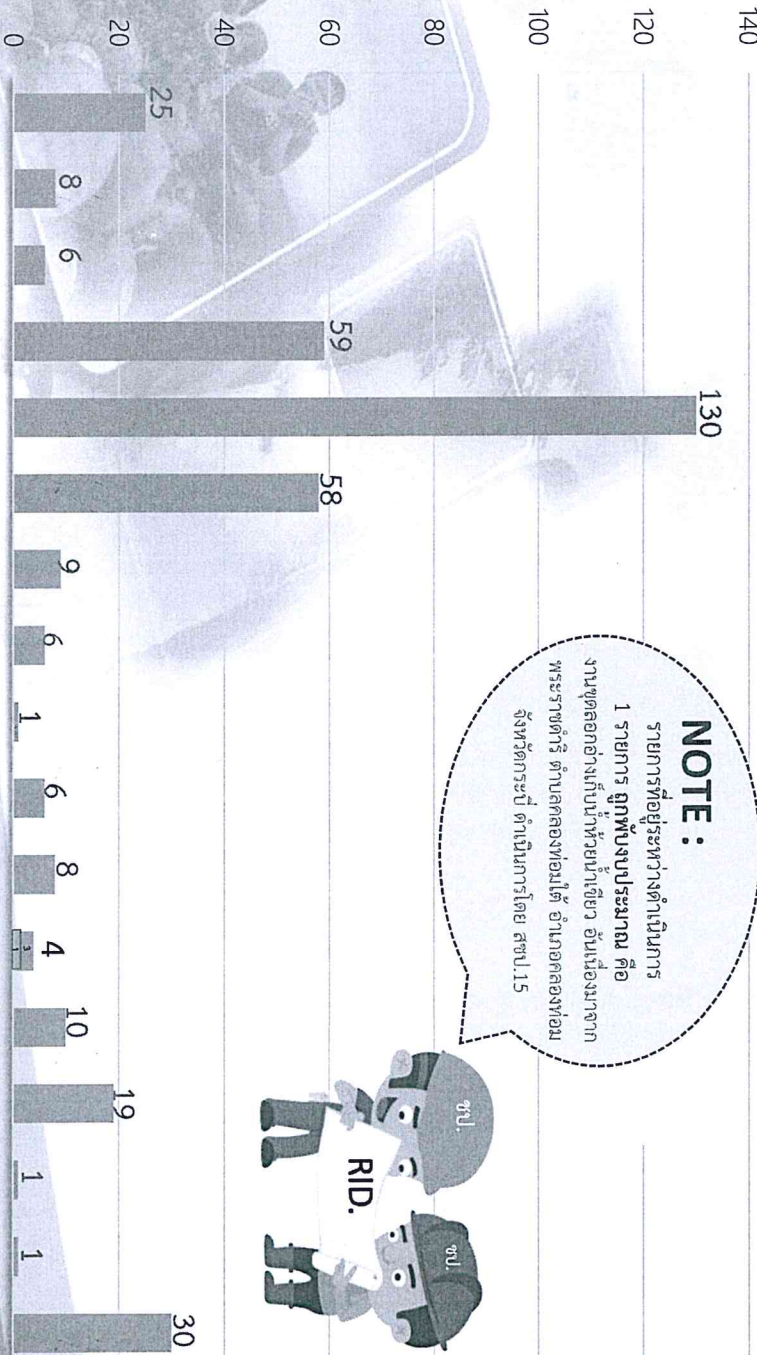

NOTE :

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 รายการ ถูกพับงบประมาณ คือ
งานชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ดำเนินการโดย สขบ.15




สรุป
สำนัก/กอง


รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565)

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร

งานกองทุน
จัดรูปที่ดิน

ภาพรวม

งบประมาณ 935.00 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 717.55 ล้านบาท
76.74 %

ผลการดำเนินงาน : 100 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 67 รายการ

แล้วเสร็จ 32 รายการ

ยกเลิก 1 รายการ

เนื่องจากทางก่อสร้างจะเปลี่ยนรูปแบบการปลูกพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร



ผลสัมฤทธิ์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

พื้นที่เกษตรกรรม 68,991 ไร่

ครัวเรือนรับประโยชน์ 6,200 ครัวเรือน

เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



งบประมาณ 806.12 ล้านบาท
งบจัดสรร 741.82 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 540.43 ล้านบาท 67.04 %

ผลการดำเนินงาน : 1,541 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 216 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,320 รายการ

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณค.ม. พ.ศ. 2565 (บาท)	งบประมาณหลังเงินเปลี่ยนแปลง (บาท)	สถานะดำเนินการ	ประเภท
รวมทั้งสิ้น จำนวน 32 รายการ					1,725,213,400	1,728,218,110		
1	กทก.	(1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง) - [9550]	โครงการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซาก (ระยะที่ 1)	งานพิเศษ	79,780,000	79,780,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	ทรบ.
2	กทก.	(230) ประดิษฐานน้ำดื่มและอาหารประกอบโครงการประติมากรรมน้ำคลองกลายบ้านนาถุน ตำบลสระแก้วอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9490]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานผูกพันใหม่	137,600,000	137,600,000	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
3	กทก.	(367) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำธรรม จังหวัดยะลา - [9013]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	137,550,000	137,550,000	5.เปิดซอง	ทรบ.
4	สมค.	(11) ค้ำยันดิน ค้ำยันดิน ในการจัดทำคันดิน จังหวัดสิงห์บุรี - [8589]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานพิเศษ	62,292,400	22,338,050	2.อนุมัติแผน	ทรบ.
5	สมค.	(1.12) ค้ำยันดิน ค้ำยันดิน ในการจัดทำคันดิน จังหวัดอ่างทอง - [8560]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานพิเศษ	598,500	598,500	2.อนุมัติแผน	ทรบ.
6	สมค.	(1.2) ค้ำยันดิน ค้ำยันดิน ในการจัดทำคันดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา - [8550]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานพิเศษ	3,000,000	3,000,000	2.อนุมัติแผน	ทรบ.
7	สชป. 10	(1.4196) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของกรมชลประทานใช้พื้นที่ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำชลประทาน จังหวัดลพบุรี - [6388]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	1,000,000	1,000,000	5.เปิดซอง	ทรบ.
8	สชป. 10	(1.4005) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของกรมชลประทานใช้พื้นที่ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานนทราชมรรคา จังหวัดลพบุรี - [6197]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	1,000,000	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
9	สชป. 11	(1.4295) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [6487]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	1,000,000	999,999	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
10	สชป. 11	(1.164) ปรับปรุงก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางแก กม.7+700 ของพื้นที่ตำบลบางโพธิ์-เสนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบางโพธิ์ อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [1920]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	4,500,000	3,776,011	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
11	สชป. 11	(33) เชื่อมป้องกันก้นตื้นและขุดลอกคลองลัดโพธิ์ ทั้ง 2 ฝั่งระยะทาง 100 เมตร ตำบลพรหมคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ - [1660]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานพิเศษ	220,000,000	220,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ทรบ.
12	สชป. 13	(1.102) บำรุงรักษาแหล่งเลี้ยงปลา คลอง 1R-3L-1R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสป.13 ระยะทาง 8.400 กม. ตำบลเขาสวนกัญ จังหวัดกาญจนบุรี - [1858]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	902,200	902,200	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
13	สชป. 13	(1.94) ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 4ขวา-1ซ้าย-2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำชลประทาน จังหวัดลพบุรี - [662]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานพิเศษ	1,500,000	1,500,000	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
14	สชป. 17	(1.186) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ คลองระบายนน้ำ D1-11.3R กม.8+347 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาศรีปิตินันท์ ตำบลปัว อำเภอแม่จัน จังหวัดน่าน - [1942]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	4,500,000	2,247,150	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
15	สชป. 14	(1.1477) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเพชรบุรี - [3669]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	49,100	49,100	2.อนุมัติแผน	ทรบ.
16	สชป. 14	(1.1463) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดชุมพร - [3655]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	240,000	240,000	2.อนุมัติแผน	ทรบ.
17	สชป.	(10) อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [557]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานผูกพันใหม่	46,742,000	46,742,000	5.เปิดซอง	ทรบ.
18	สชป.	(1.460) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [548]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานพิเศษ	842,200	842,200	5.เปิดซอง	ทรบ.
19	สบอ.	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8250]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ	3,000,000	3,000,000	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
20	สบอ.	(1.370) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [458]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานพิเศษ	117,000	117,000	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
21	สพญ.	(8) งานชุดคลองระบายนน้ำหลักหรืออาคารประกอบ ฝายอุทกที่ 4 - [9528]	โครงการคลองระบายนน้ำหลักบางนา - บางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานผูกพันใหม่	676,200,000	676,200,000	5.เปิดซอง	ทรบ.
22	สพญ.	(6) ประดิษฐานน้ำและสถานีสูบน้ำหนองทองหล่อ - [9514]	โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	งานผูกพันใหม่	228,000,000	228,000,000	5.เปิดซอง	ทรบ.
23	สพญ.	(364) สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำ หรืออาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำทุ่งแสงหรือระบบส่งน้ำ ตำบลชุมแสง อำเภอรังสิต จังหวัดระยอง พื้นที่ชลประทาน 7,450 ไร่ - [9010]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	74,800,000	74,800,000	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
24	สอ.	(29) ค่าจ้างสำรวจออกแบบโครงการคลองระบายนน้ำหลัก-อำเภอ-อำเภอไทย ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [9045]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	40,000,000	40,000,000	5.เปิดซอง	ทรบ.
25	ศท.	โครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมชลประทาน	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานพิเศษ		8,500,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
26	สอ.	จ้างสำรวจออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำมูลตอนล่างฝั่งซ้าย (ระยะที่ 1) จังหวัดอุตรดิตถ์	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานพิเศษ		9,950,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
27	สชป. 14	ปรับปรุงถนนดินลูกรังจากบ้านกุ่มน้ำกระหวางสามระยะทาง 4.00 กม. ตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานพิเศษ		6,000,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
28	สชป. 9	ซ่อมแซมคันโอป ปตร.แม่น้ำนอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานนทราชมรรคา ตำบลบางปลากรด อำเภอหลักชัย จังหวัดนครนายก	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานพิเศษ		494,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
29	สพญ.	ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในกรมชลประทานสามเสน อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นที่ 4 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานพิเศษ		1,144,000	2.อนุมัติแผน	โอนเปลี่ยนแปลง
30	สชป. 11	ซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำทางราชการชั้นเอก (อ.3/24) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานพิเศษ		568,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
31	สชป. 17	ปรับปรุงฝายคอนกรีตไธสง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 50 ไร่ ตำบลภูเขาทอง อำเภอคูคต จังหวัดนนทบุรี	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานพิเศษ		9,890,000	6.อนุมัติรับราคา	โอนเปลี่ยนแปลง
32	สอ.	ปรับปรุงห้องอาหารและนิทรรศน์ กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานพิเศษ		9,389,900	3.ประกาศร่าง TOR	โอนเปลี่ยนแปลง
