



บันทึกข้อความ

5012

ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพบ ๐๖/๕๔๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งม.๕๔๑๖

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันมาด้วยแล้ว

อวิฬ อวิฬ

(นางสาวอวิฬ ด้วงน่ม)

ตบ.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตบ.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๒ กค ๒๕๖๕

- ทราบ

- อ.สมน พอ.สวน., พอ.ท.ก., ทน.๑-๗ มอ.

// ลจ ผมท.มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๕ กค ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 7 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 101,089.91 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 66,919.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.20 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 14,607 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 52 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.36 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 213 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.46 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6,505 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.53 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7,664 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.47 และยกเลิก จำนวน 173 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.18 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 77,143.44 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 49,388.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.02 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,392.42 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 5,896.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.76 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 69,751.02 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 43,491.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.35 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,659 รายการ (รายการ พ.ร.บ. 65 จำนวน 9,554 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ) ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.04 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.21 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5,611 รายการ คิดเป็นร้อยละ 58.09 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3,864 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 และยกเลิก จำนวน 160 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.66 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น

2. งบเงินกู้เบิกเหลี่ยมปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 8,333.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.86 งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 1,144.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.14 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 406.69 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 83.23 ล้านบาท และเบิกไม่ทันตามกำหนด 654.56 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,805.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.00 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,068 รายการ (รายการเงินกู้เบิกเหลี่ยมปี จำนวน 1,067 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 209 รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.57 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 854 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.96 และยกเลิก จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.47 ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เนื่องจากราษฎรบางรายเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ และเกิดข้อพิพาทเรื่องมรดก เนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่ดินได้

3. งบกลาง พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 4,605.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,411.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.08 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,188 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 63 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.30 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,123 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.53 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 เนื่องจากมีการแก้ไขสถานที่การดำเนินงานจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

4. งบกลาง พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 2,091.63 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 465.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.26 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 667 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ จำนวน 48 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.19 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 41 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.15 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 557 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.51 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.85 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.30 เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

5. เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 งบประมาณ จำนวน 4,224.82 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,977.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.14 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 384 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 380 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.96 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 806.12 ล้านบาท เบิกจ่าย 595.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.87 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,541 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 152 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.86 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.26 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,385 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89.88

7. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 747.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.96 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 100 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 60 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 39 รายการ คิดเป็นร้อยละ 39.00 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.00 คือ รายการ จัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ระยะที่ 2 เนื่องจากการก่อสร้างจะมีผลกระทบกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดข้อมูล

1 วัตถุประสงค์ดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลิตภัณฑ์/โครงการ

2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

3 งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	101,038.91	66,919.47	66.20	14,607	52	213	6,505	7,664	ยกเลิก 173 รายการ
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (งบปฏิบัติการ)	77,143.44	49,388.48	64.02	9,659	4	20	5,611	3,864	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,392.42	5,896.56	79.76						
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	69,751.02	43,491.92	62.35	9,659	4	20	5,611	3,864	ยกเลิก 160 รายการ
2. งบเงินกู้ยืมไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563	11,283.76	8,333.70	73.86	1,068			209	854	- ยกเลิก 5 รายการ - ตัดไม่ขาย/สลาย PO/ยกเลิกไม่ทัน จำนวน 1,144.48 ล้านบาท - คงเหลือต้องดำเนินการต่อ จำนวน 1,805.58 ล้านบาท
3. งบกลาง พ.ศ. 2564	4,605.14	3,411.56	74.08	1,188			63	1,123	
3.1 รายการเงินสำรองเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น	3,419.87	2,376.10	69.48	1,117			49	1,066	
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรถบรรทุกหนักหกล้อและรถบรรทุก 24	426.47			24			24		
คณะกรรมการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183.31	756.05	63.89	44			22	22	
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้ง ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564	1,562.30	1,505.56	96.37	1,046				1,044	ยกเลิก 2 รายการ
- โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาทางชลนํ้า	94.70	0.10	0.11	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ผู้ขงว 3 และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	83.09	71.85	86.47	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจักษ์ จังหวัดแพร่บุรี	70.00	42.54	60.77	1			1		
3.2 โครงการอื่น ๆ	1,185.27	1,035.46	87.36	71			14	57	
4. งบกลาง พ.ศ. 2565	2,091.63	465.55	22.26	667	48	41	557	19	
- โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565	1,126.19	290.75	25.82	620	43	29	527	19	ยกเลิก 2 รายการ
- โครงการอื่น ๆ	965.44	174.80	18.11	47	5	12	30		
5. เงินกู้ ประจำปี พ.ศ. 2564	4,224.82	3,977.08	94.14	384			1	380	ยกเลิก 3 รายการ
6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565	806.12	595.51	73.87	1,541		152	4	1,385	
7. จัดซื้อที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565	935.00	747.59	79.96	100			60	39	ยกเลิก 1 รายการ


ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจาก ระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

รวม		งบ พ.ร.บ.	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง
รายการ	9,659	70,135.62 ล้านบาท	67,578.62 ล้านบาท
✗ ยังไม่ดำเนินการ	4	79.78	94.77
➢ พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง	1	79.78	79.78
➢ โอนเปลี่ยนแปลง	3	14.99	14.99
💣 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20	1,499.99	1,493.87
➢ พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง	17	1,500.00	1,473.45
➢ โอนเปลี่ยนแปลง	3	20.42	20.42
✓ ก่อหนี้ผูกพัน	9,475	66,786.05	65,989.98
➢ พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง	9,377	66,786.05	65,119.96
➢ โอนเปลี่ยนแปลง	98	870.02	870.02
CANCEL สำนึก/กอง ยกเลิก	160	1,769.80	

ผลการก่อหนี้ผูกพัน




ก่อนหนี้ผูกพัน (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 9,475 รายการ (99.75%)
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 65,989.98 ล้านบาท (97.65%)

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 20 รายการ (0.21%)

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,493.87 ล้านบาท (2.21%)	
- อนุมัติแผน	4 รายการ งบประมาณ 2.03 ล้านบาท
- ประกาศร่าง TOR	1 รายการ งบประมาณ 9.39 ล้านบาท
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	1 รายการ งบประมาณ 196.43 ล้านบาท
- เติบของ	6 รายการ งบประมาณ 1,129.49 ล้านบาท
- อนุมัติรับราคา	8 รายการ งบประมาณ 156.53 ล้านบาท

✗ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 4 รายการ (0.04%)
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 94.77 ล้านบาท (0.14%)

พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	9,554	70,135.62	66,673.18	ล้านบาท
รายการ	รายการ	ล้านบาท			
105	งบประมาณ	905.44	ล้านบาท		
รายการ	งบประมาณ	905.44	ล้านบาท		

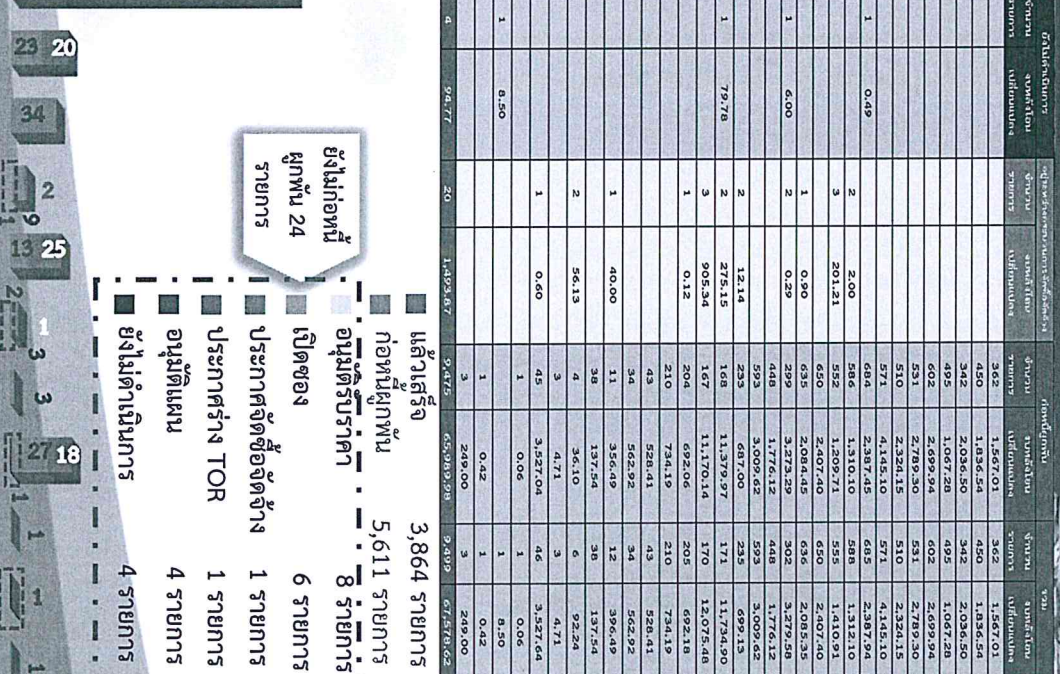

■ แล้วยังเหลือ	3,864 รายการ
■ ก่อนที่ผู้ถือหุ้น	5,611 รายการ
■ อนุมัติรับราคา	8 รายการ
■ เปิดซอง	6 รายการ
■ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	1 รายการ
■ ประกาศร่าง TOR	1 รายการ
■ ออกใบชี้แจง	4 รายการ
■ ยังไม่ดำเนินการ	4 รายการ

[illegible]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Gen Project ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

หน่วยงาน	งบรวมตาม พ.ร.บ.	งบเหลือโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน รายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำสัญญาแล้ว							
						จำนวนรายการ	งบเหลือโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบเหลือโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)							
										0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%		
รวม	68,365.82	67,578.62	42,745.39	63.25	9,499	4	94.77	20	1,493.87	9,475	65,989.98	1,380	425	590	1,013	2,203	3,864
สพ. 1	1,604.88	1,567.01	1,206.76	77.01	362					362	1,567.01	4	3	16	41	155	143
สพ. 2	1,890.25	1,836.54	1,394.42	75.93	450					450	1,836.54	82	22	22	42	176	106
สพ. 3	2,334.81	2,036.50	1,394.48	68.47	342					342	2,036.50	38	14	25	62	111	92
สพ. 4	1,074.89	1,067.28	827.22	77.51	495					495	1,067.28	132	58	63	43	82	117
สพ. 5	2,640.61	2,699.94	2,058.86	76.26	602					602	2,699.94	24	24	37	48	183	286
สพ. 6	2,646.30	2,789.30	2,072.01	74.28	531					531	2,789.30	10	3	24	41	139	314
สพ. 7	2,349.87	2,324.15	2,214.27	95.27	510					510	2,324.15	9	14	35	29	112	311
สพ. 8	4,016.81	4,145.10	2,039.53	49.20	571					571	4,145.10	63	29	38	68	83	290
สพ. 9	2,437.91	2,387.94	1,518.46	63.59	685	1	0.49			684	2,387.45	19	37	47	115	172	294
สพ. 10	1,336.82	1,312.10	748.99	57.08	588			2	2.00	586	1,310.10	103	13	25	45	158	242
สพ. 11	1,507.05	1,410.91	625.41	44.33	555			3	201.21	552	1,209.71	290	19	22	36	93	92
สพ. 12	2,416.48	2,407.40	1,449.01	60.19	650					650	2,407.40	49	40	44	65	178	274
สพ. 13	2,130.91	2,085.35	1,379.50	66.15	636			1	0.90	635	2,084.45	31	34	42	85	232	211
สพ. 14	3,273.65	3,279.58	1,950.03	59.46	302	1	6.00	2	0.29	299	3,273.29	20	23	29	46	49	132
สพ. 15	1,886.21	1,776.12	807.89	45.49	448					448	1,776.12	230	22	18	41	61	76
สพ. 16	3,057.93	3,009.62	1,331.50	44.24	593					593	3,009.62	29	26	28	51	35	424
สพ. 17	682.65	699.13	483.97	69.22	235			2	12.14	233	687.00	4		11	27	32	159
กวม.	12,193.60	11,734.90	8,203.57	69.91	171	1	79.78	2	275.15	168	11,379.97	92	6	13	27	18	12
สพ. ญ.	11,985.44	12,075.48	6,063.52	50.21	170			3	905.34	167	11,170.14	78	16	30	14	15	14
สพ. ๐.	695.81	692.18	273.38	39.50	205			1	0.12	204	692.06	11	10	7	79	61	36
สค. ๐.	742.05	734.19	589.48	80.29	210					210	734.19	3	5	6	4	19	173
สค. ๑.	531.51	528.41	433.48	82.04	43					43	528.41	6			2	15	20
สค. ๒.	549.48	562.92	216.98	38.55	34					34	562.92	34					
สค. ๓.	376.65	396.49	182.69	46.08	12			1	40.00	11	356.49	4	2	1	1	1	2
สค. ๔.	138.22	137.54	125.17	91.01	38					38	137.54		1		1		25
สค. ๕.	82.68	92.24	1.34	1.46	6			2	56.13	4	36.10	3					1
สพ. ๖.	4.71	4.71	4.24	90.08	3					3	4.71	3					
สค. ๗.	3,528.61	3,527.64	3,100.82	87.90	46			1	0.60	45	3,527.04	4	4	6		13	18
กค. ๘.		0.06	0.06	100.00	1					1	0.06	1					
กค. ๙.		8.50			1	1	8.50										
สพ. ๑๐.		0.42			1					1	0.42	1					
Lump Sum	249.00	249.00	48.33	19.41	3					3	249.00	3					

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 160 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,769.80 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณคืนแทนแล้ว เช่น งบจัดซื้อ เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น

2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ งบประมาณเหลือโอนเปลี่ยนแปลง 905.44 ล้านบาท



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
จากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565


หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบทั้งสิ้น เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่ดำเนินการ			อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			ทำสัญญาแล้ว						
					จำนวน รายการ	จำนวน รายการ	งบทั้งสิ้น เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบทั้งสิ้น เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบทั้งสิ้น เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,365.82	67,578.62	42,745.39	63.25	9,499	4	94.77	20	1,493.87	9,475	65,999.98	1,380	425	590	1,013	2,203	3,864
โครงการเรือมหาสมุทรหลวง จังหวัดอุดรธานี	809.00	789.57	484.84	61.41	10					10	789.57	2	2	2	3	1	
โครงการคลองระบายน้ำหาลาบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,561.63	2,763.14	1,464.49	53.00	14			1	676.20	13	2,086.94	8	1	1		1	2
โครงการจัดหาและติดตั้งที่จอดรถ	27,289.02	26,815.00	18,306.47	68.27	626			3	178.15	623	26,636.85	164	46	88	96	158	71
โครงการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะที่ 1)	499.74	419.35	247.83	59.10	9	1	79.78			8	339.57	7					1
โครงการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจังหวัดนครราชสีมา	505.89	811.89	274.23	33.78	12					12	811.89	6	2	4			
โครงการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	141.06	141.06	0.00		1					1	141.06					1	
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ จังหวัดสมุทรสาคร	99.56	69.39	67.09	96.69	4					4	69.39	2		1		1	
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	312.00	312.00	124.01	39.75	4					4	312.00	2		2			
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	72.00	91.19	44.81	49.15	4					4	91.19		1	2			1
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	275.66	220.72	13.56	6.14	6					6	220.72	4		2			
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	6,308.96	6,343.97	3,302.84	52.06	380	1	6.00			379	6,337.97	70	39	46	56	103	65
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	10,895.81	10,665.96	5,505.85	51.62	296			1	137.60	295	10,528.36	77	31	41	58	56	32
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	1,033.27	1,061.23	395.22	37.24	14			1	228.00	13	833.23	8	2		2	1	
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	1,298.06	862.30	656.85	76.17	12					12	862.30	4	3	2	1	1	1
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	2,193.40	2,155.86	1,494.36	69.32	748			2	206.32	746	1,949.54	89	40	35	54	148	380
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	10,508.73	10,458.04	8,029.79	76.78	6,758	1	0.49	8	10.21	6,749	10,447.33	845	231	330	698	1,599	3,046
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	167.77	237.64	33.14	13.94	5					5	237.64	3		1		1	
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	108.00	108.00	100.25	92.83	2					2	108.00	1					1
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	104.14	117.34	75.58	64.41	6					6	117.34	5		1			
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	348.02	348.02	65.37	18.78	7					7	348.02	5		1		1	1
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	637.62	637.62	566.10	88.78	5					5	637.62	3					1
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	388.00	388.00	254.63	65.63	3					3	388.00						
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	525.00	404.98	339.25	83.77	3					3	404.98		1		1		1
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	313.78	361.03	311.65	86.32	6					6	361.03			1	1	1	3
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครราชสีมา	969.71	995.36	587.18	58.99	564	1	8.50	4	57.39	559	929.47	72	26	30	43	129	259

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 160 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,769.80 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณแล้ว เช่น จังหวัด จึงเหลือจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น
2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 105 รายการ งบประมาณโอนเปลี่ยนแปลง 905.44 ล้านบาท



2.5

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2565

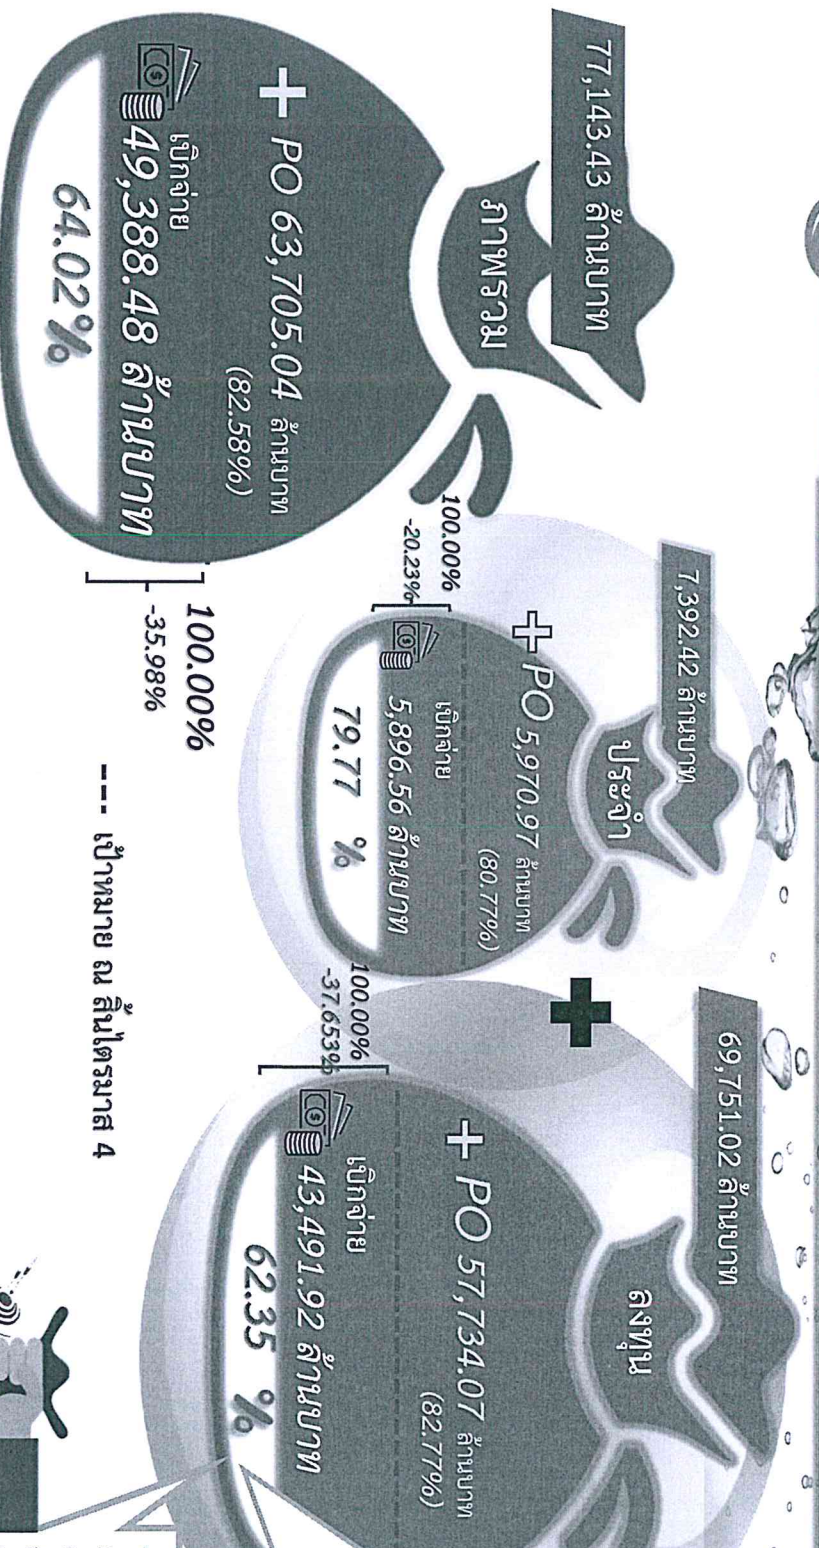


รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

- ผู้กักตุนเงิน จำนวนทั้งสิ้น 108 รายการ จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 10,755.47 ล้านบาท เบิกจ่าย 6,549.01 ล้านบาท (60.89%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 91 รายการ (84.26%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 8,653.36 ล้านบาท (80.46%) แล้วเสร็จ จำนวน 17 รายการ (15.74%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 2,102.11 ล้านบาท (19.54%)

- ผู้กักตุนเงิน จำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 2,178.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 466.11 ล้านบาท (21.40%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ (76.00%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 911.98 ล้านบาท (41.87%) โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 รายการ (24.00%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 1,266.09 ล้านบาท (58.13%)



เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 9,366 รายการ จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 56,817.48 ล้านบาท เบิกจ่าย 36,476.80 ล้านบาท (64.20%) โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 4 รายการ (0.04%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 94.77 ล้านบาท (0.17%) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 14 รายการ (0.15%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 227.78 ล้านบาท (0.40%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 5,501 รายการ (58.73%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 28,433.98 ล้านบาท (50.04%) และแล้วเสร็จ จำนวน 3,847 รายการ (41.08%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 28,060.95 ล้านบาท (49.39%)



2.6

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

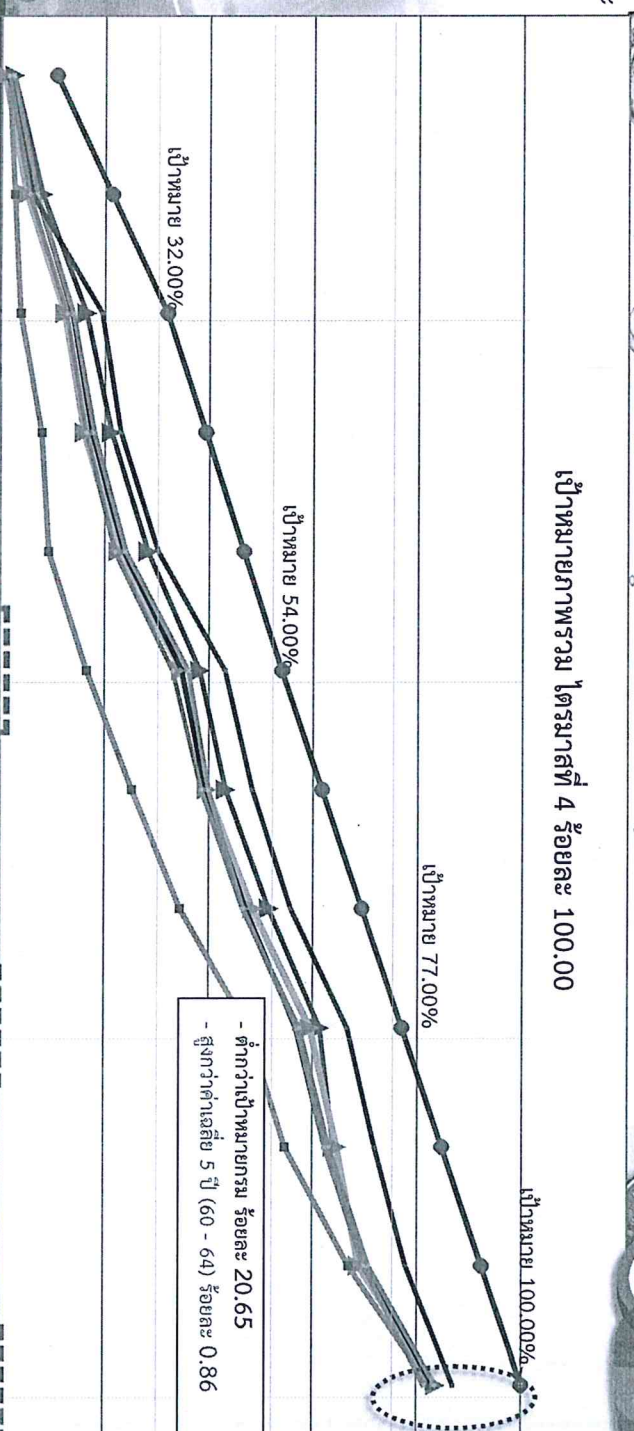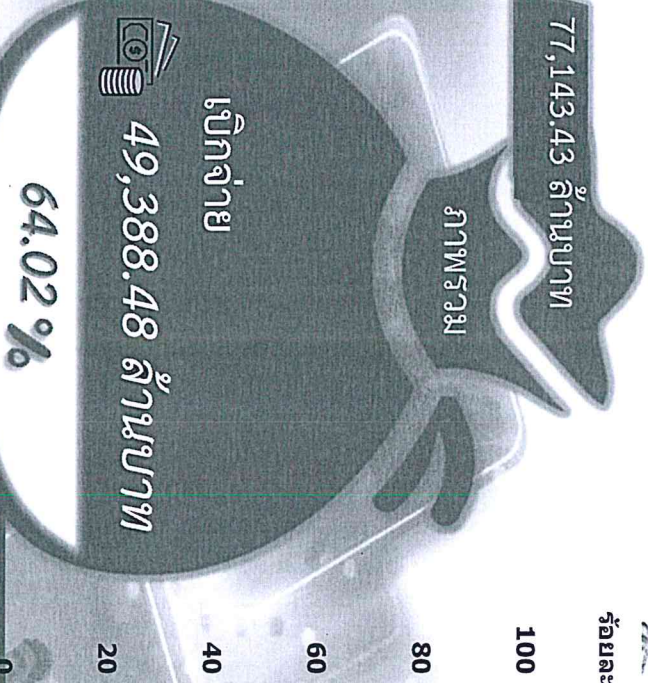

ปีงบประมาณ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายรวม ปี 65	10.67	21.34	32.00	39.33	46.66	54.00	61.67	69.34	77.00	84.67	92.34	100.00
ผลปี 65 (77,143.43)	2.45	7.97	16.49	21.25	28.37	38.31	43.27	51.57	61.30	64.02		
ผลปี 64 (74,106.98)	0.66	4.91	12.24	16.05	22.61	34.76	39.61	48.38	59.48	64.67	68.91	83.67
ผลปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	7.84	9.23	16.56	25.26	34.54	47.70	54.68	66.97	82.54
ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	83.17
ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
ผลปี 60 (47,004.27)	1.50	5.94	19.46	23.11	30.30	43.12	48.35	55.72	66.56	71.83	77.86	86.95
เฉลี่ย 5 ปี (60-64)	1.46	5.43	12.62	16.50	21.98	33.08	38.50	46.47	57.49	63.16	70.82	83.54

2.7

สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ร้อยละ

เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

เป้าหมายรัฐบาล 100.00%

69,751.02 ล้านบาท

ลงทุน

เบิกจ่าย

43,491.92 ล้านบาท

62.35%

ปีงบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายกรม ปี 65	6.67	13.34	20.00	28.33	36.66	45.00	51.67	58.34	65.00	76.67	88.34	100.00
ผลปี 65 (70,135.62)	1.94	7.11	15.67	20.09	27.12	37.20	41.86	50.22	60.17	62.35		
ผลปี 64 (66,423.87)	0.003	3.81	10.97	14.29	20.79	33.39	37.90	46.78	58.21	63.11	66.85	82.02
ผลปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	4.77	5.36	12.51	21.31	30.59	44.54	51.34	64.24	80.61
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
ผลปี 61 (47,566.20)	1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
ผลปี 60 (38,118.10)	0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69
เฉลี่ย 5 ปี (60 - 64)	0.68	3.98	11.07	14.27	19.39	30.90	35.95	43.78	55.38	60.52	68.10	81.38

เป้าหมาย 20.00%


เป้าหมาย 45.00%

เป้าหมาย 65.00%

- ต่ำกว่าเป้าหมายกรม ร้อยละ 14.32
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (60 - 64) ร้อยละ 1.83

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพการคลังภาคครัวเรือนโดยอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

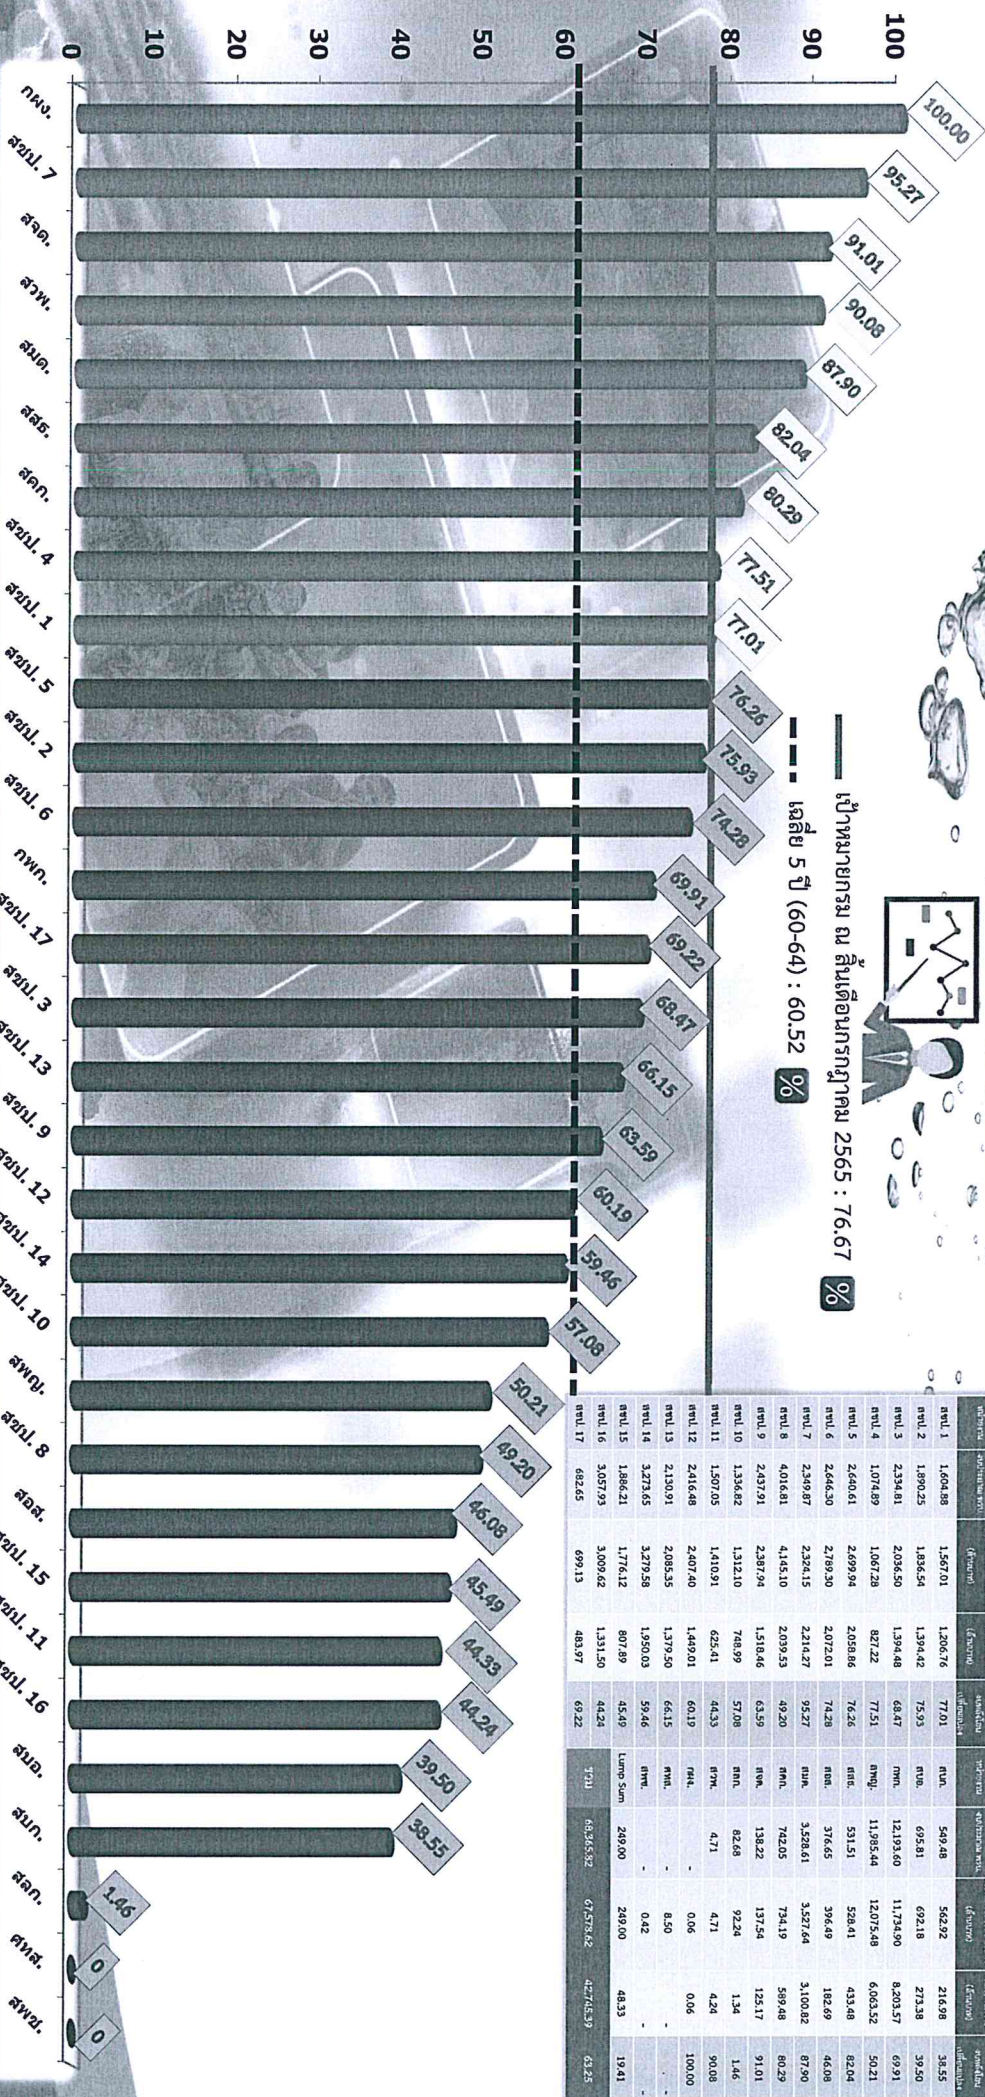

☐ ผลการเบิกจ่ายส่งกว่าหรือเท่ากับกำหนดรัฐบาล

☐ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่ากำหนดรัฐบาล

กองแม่ฝูจัน

- ☐ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายรัฐบาล
- ☐ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

2.9

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคูเทียม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
1	<u>ระดับกระทรวง</u> (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)	160,986.31	103,305.02	64.17	177,215.86	102,128.76	57.63	6.54
2	กระทรวงคมนาคม	75,047.10	46,433.08	61.87	72,187.96	44,444.16	61.57	0.30
3	กระทรวงมหาดไทย	75,725.14	31,943.59	42.18	80,564.03	30,735.02	38.15	4.03
1	<u>ระดับกรมใน กษ.</u> (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมพัฒนาที่ดิน	1,842.61	1,474.86	80.04	2,112.51	1,739.70	82.35	-2.31
2	กรมชลประทาน	69,751.02	43,491.92	62.35	66,177.64	40,486.42	61.18	1.17
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,272.34	254.59	20.01	1,159.16	595.65	51.39	-31.38
1	<u>ระดับกรม</u> (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)							
1	กรมทางหลวงชนบท	44,275.39	30,095.76	67.97	47,151.29	27,162.65	57.61	10.36
2	กรมทางหลวง	107,505.22	69,421.65	64.58	119,988.99	71,523.83	59.61	4.97
3	กรมชลประทาน	69,751.02	43,491.92	62.35	66,177.64	40,486.42	61.18	1.17
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	29,841.10	9,959.84	33.38	27,512.17	12,122.51	44.06	-10.68

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

2. ค่าเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 56.25%

3. ค่าเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (45 หน่วยงาน) เฉลี่ย 55.58%

งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

1,068 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

8,333.70 ล้านบาท 73.86 %

คิด/ไม่ขยาย + สลยา PO

406.69 ล้านบาท 3.60 %

เหลือจ่าย/ยกเลิก

83.23 ล้านบาท 0.74 %

เบิกจ่ายไม่ทัน แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ

654.56 ล้านบาท 5.80 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ
1,805.58 ล้านบาท

16.00 %

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่ไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,068 รายการ
(เงินกู้ 1,067 รายการ โอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ

854 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

209 รายการ

ยกเลิกรายการ

5 รายการ

หมายเหตุ: รายการโอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ
คือ เงินทดรองจ่ายก่อสร้างตามสัญญาแบบรับ
ราคาได้ (ค่า K)

ล้านบาท

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

รวม

แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95	11,283.76
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	839.80	1,330.56	866.19	879.60	463.75	671.17	207.12			8,333.70
ผลต่าง	-	-428.49	-1,221.49	-746.44	-3.28	-580.67	351.53	139.47	327.54	119.83			

ต.ค.64 พ.ย.64

ธ.ค.64

ม.ค.65

ก.พ.65

มี.ค.65

เม.ย.65

พ.ค.65

มิ.ย.65

ก.ค.65

ส.ค.65

ก.ย.65

กองแผนงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย
100%

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีมติ ค.ร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี 64

รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ

งบประมาณ 4,605.14 ล้านบาท

เบิก 3,411.56 ล้านบาท 74.08 %

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 1,123 รายการ 94.53 %

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ 63 รายการ 5.30 %

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ลดประมาณ 900 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่

พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 860,965 ไร่ 86.76 %

ปริมาณน้ำ 16,74 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์ = 11.28 ล้าน ลบ.ม. 67.38 %

ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 126,203 ครัวเรือน 89.47 %

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565



มติ ครม.
8 มิ.ย. 64
ครุภัณฑ์

24 รายการ

426.47 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ -

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตรวจรับครุภัณฑ์

24 รายการ

- %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สบ.เมื่อวันที่ 16

มติ ครม.
15 มิ.ย. 64

44 รายการ

1,183.31 ล้านบาท

เบิกจ่าย 756.05 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 63.89

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

22 รายการ

แล้วเสร็จ 22 รายการ

56.43 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สบ.เมื่อวันที่ 16

มติ ครม.
14 ก.ย. 64

1,046 รายการ

1,562.30 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,505.56 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 96.37

แล้วเสร็จ 1,044 รายการ

ยกเลิก 2 รายการ

97.63 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สบ.เมื่อวันที่ 23

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย. 64

1 รายการ

94.70 ล้านบาท

เบิกจ่าย 0.10 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 0.11

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

1 รายการ

55.00 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สบ.เมื่อวันที่ 29 ก.ย.

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย. 64

1 รายการ

83.09 ล้านบาท

เบิกจ่าย 71.85 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 86.47

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

1 รายการ

90.00 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สบ.เมื่อวันที่ 29 ก.ย.

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย. 64

1 รายการ

70.00 ล้านบาท

เบิกจ่าย 42.54 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 60.77

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

1 รายการ

75.00 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สบ.เมื่อวันที่ 29

กปร.
ปี 2564

71 รายการ

1,185.27 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,035.46 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 87.36

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

14 รายการ

แล้วเสร็จ 57 รายการ

84.40 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สบ.เมื่อวันที่ 29

ดำเนินการงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่
ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

ปริมาณน้ำ 1.26 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งจากภัย และปัญหาภัยแล้ง ปี 2564

พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำและระบายน้ำคลองส่งน้ำในทุ่งโพธิ์โพธิ์ 3 และคลองระบายน้ำ 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

ดำเนินการงานก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565



ผลการดำเนินงาน



มีมติ ค.ร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี อนุมัติงบกลาง 65
รวม 2 ครั้ง จำนวน 667 รายการ

งบประมาณ 2,091.63 ล้านบาท เบิก 465.54 ล้านบาท 22.26%

ผลการดำเนินงาน



ตัวชี้วัดของโครงการ



มติ ครม.
29 มี.ค.
65

กปร.
ปี 2565



620 รายการ
1,126.19 ล้านบาท

47 รายการ
965.44 ล้านบาท

เบิกจ่าย 290.75 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 25.82

เบิกจ่าย 174.80 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 18.11

แล้วเสร็จ 19 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 527 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 รายการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 43 รายการ
ยกเลิก 2 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 30 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 รายการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ

10.24%

9.32%

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน


ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน
จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอัน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565



ส่วนติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน





เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



UP ภาพรวมโครงการเงินกู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเบิกจ่ายงบประมาณ 4,224.82 ล้านบาท

เบิกจ่าย 3,977.08 ล้านบาท 94.14%

เหลือจ่าย 212.63 ล้านบาท 5.03%

ถูกพับ 35.11 ล้านบาท 0.83%

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง 380 รายการ
1 รายการ = 0.26%
แล้วเสร็จ 98.96%
ยกเลิก 3 รายการ
= 0.78%

ตัวชี้วัดโครงการ
ผลผลิตของโครงการ :

- ซ่อมแซม/ปรับปรุง 207 รายการ - ฝ่าย 21 รายการ
- อาคารบังคับน้ำ 12 รายการ - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 10 รายการ
- ระบบกระจายน้ำชลประทาน 30 รายการ
- ชุดลอก 61 รายการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ)
- แม่น้ำ 40 รายการ
- อื่น ๆ เช่น ประตูระบายน้ำ ท่อผันน้ำ 3 รายการ

ผลลัพธ์ของโครงการ :

พท. 19,667 ไร่
= 19,667 ไร่ 100%

ปริมาณน้ำ 26.98 ล้าน ลบ.ม.
= 26.98 ล้าน ลบ.ม. 100%


พท. 64,952 ไร่
= 208,783 ไร่ 99.59%

ค่าที่ดิน
= 64,552 ไร่ 99.59%


ค่าจ้างแรงงาน 9,716 คน
= 10,918 คน 112.37%



ผลการดำเนินงานจำแนกตามสำนัก/กอง มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

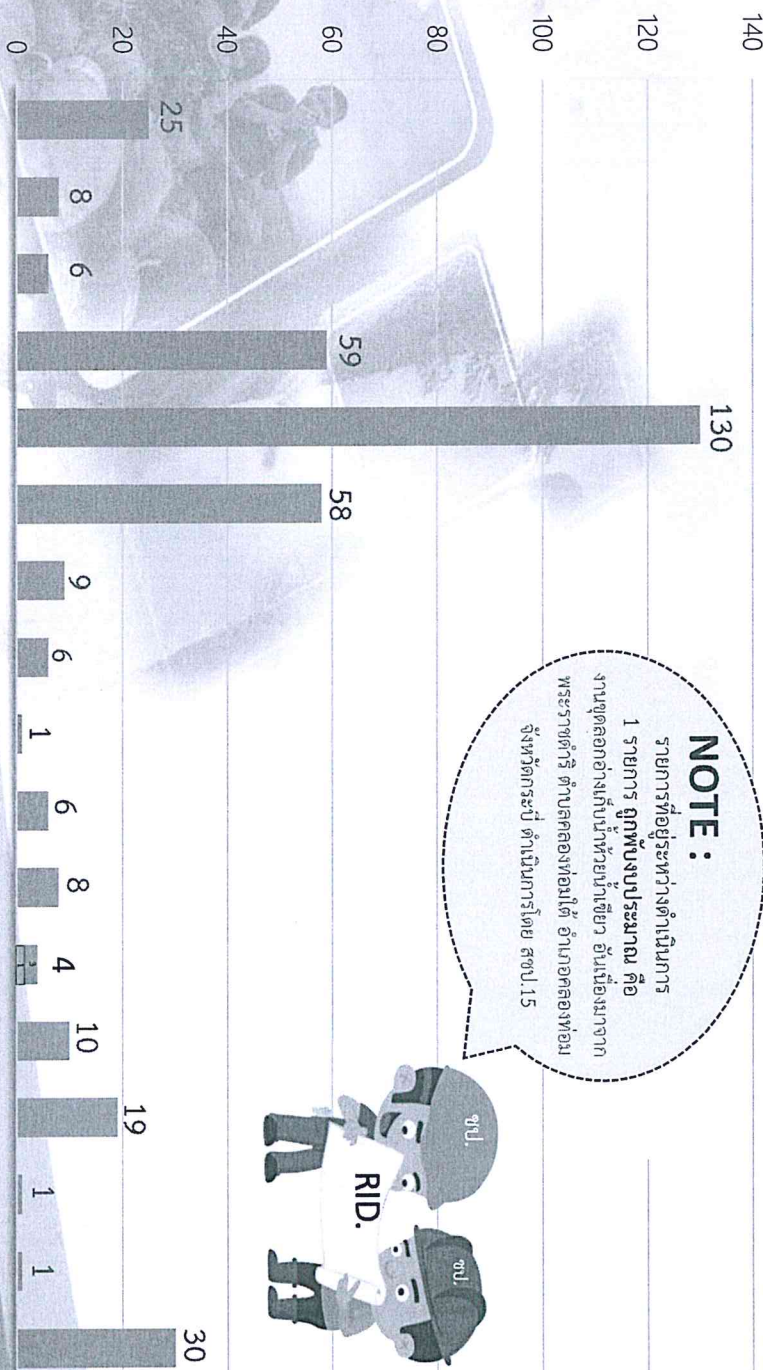

NOTE :
รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 รายการ ถูกพับงบประมาณ คือ
งานชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ คับคั่งของท่อไม่ได้ อากาศของท่อ
จึงหวั่นระบู่ ดำเนินการโดย สชป.15



ภาพรวมงาน

สำนักงาน

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	สำนัก	รายการงาน	แหล่งเงิน/รายการ	ประเภทงาน	งบประมาณค.บ.จ.บ. 2565 (บาท)	งบประมาณคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 65 (บาท)	สถานะดำเนินการ	ประเภท
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 24 รายการ			1,579,778,800	1,588,648,941		
1	กทท.	(1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง) - [9550]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	งานปศุสัตว์	79,780,000	79,780,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	ทรบ.
2	กทท.	(230) ประตูปรับน้ำห้วยงานและอาคารประกอบโครงการประตูปรับน้ำคลองกลาย บ้านนาบุญ ตำบลสระแก้วอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9490]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานผูกพันใหม่	137,600,000	137,600,000	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
3	กทท.	(367) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขมร จังหวัดยะลา - [9013]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	137,550,000	137,550,000	5.เปิดซอง	ทรบ.
4	สมด.	(1.12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าตอบแทน ค่าเรือยืมในการจัดหาริที่ดิน จังหวัดอำนาจ - [8560]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ที่ชลประทาน	งานปศุสัตว์	598,500	598,500	2.อนุมัติแผน	ทรบ.
5	สขป. 10	(1.4196) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี - [6388]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	1,000,000	1,000,000	5.เปิดซอง	ทรบ.
6	สขป. 10	(1.4005) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาธาร จังหวัดลพบุรี - [6197]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	1,000,000	999,650	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
7	สขป. 11	(1.4295) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บายเย็น ตำบลบ้านม้า อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [6487]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	1,000,000	999,999	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
8	สขป. 11	(1.164) ปรับปรุงก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางกม กม.7+700 ของคันกันน้ำสายบางโพธิ์-เสนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บายเย็น ตำบลบางโพธิ์ อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [1920]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	4,500,000	3,776,011	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
9	สขป. 11	(33) เชื้อเพลิงป้องกันและขุดลอกคลองลัดโพธิ์ ทั้ง 2 ฝั่งระยะทาง 100 เมตร ตำบลทรงคนอง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ - [1660]	โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอื่นนอกเหนือจากพระราชดำริ	งานปศุสัตว์	220,000,000	196,429,431	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ทรบ.
10	สขป. 13	(1.102) บำรุงรักษาทางหลวงใหญ่ คลอง 1R-3L-1R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สขป.13 ระยะทาง 8.400 กม. ตำบลเขาสามสิบหอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี - [1858]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	902,200	902,200	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
11	สขป. 17	(1.186) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ คลองระบายน้ำ D1-11.3R กม.8+347 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี - [1942]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	4,500,000	2,247,150	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
12	สขป. 14	(1.1477) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเพชรบุรี - [3669]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	49,100	49,100	2.อนุมัติแผน	ทรบ.
13	สขป. 14	(1.1463) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสมุทร - [3655]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	240,000	240,000	2.อนุมัติแผน	ทรบ.
14	สขก.	(10) อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [557]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานผูกพันใหม่	46,742,000	46,742,000	5.เปิดซอง	ทรบ.
15	สขบ.	(1.370) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาสถาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [458]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปศุสัตว์	117,000	117,000	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
16	สขญ.	(8) งานชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 - [9528]	โครงการคลองระบายน้ำหลักบางบาล - บางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานผูกพันใหม่	676,200,000	676,200,000	5.เปิดซอง	ทรบ.
17	สขญ.	(6) ประตูปรับน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง - [9514]	โครงการพัฒนาพื้นที่หนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย	งานผูกพันใหม่	228,000,000	228,000,000	5.เปิดซอง	ทรบ.
18	สขส.	(29) ค่าจ้างสำรวจออกแบบโครงการคลองระบายน้ำหลักปากปลัก-อ่าวไทย ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [9045]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	40,000,000	40,000,000	5.เปิดซอง	ทรบ.
19	สขส.	โครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมชลประทาน	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปศุสัตว์		8,500,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
20	สขป. 14	ปรับปรุงถนนคันคลองอ่างเก็บน้ำกระวังสามระยะทาง 4.00 กม. ตำบลบ้านเตา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปศุสัตว์		6,000,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
21	สขป. 9	ซ่อมแซมคันไอบ ประตูแม่บ้านนอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลาเกศ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปศุสัตว์		494,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	โอนเปลี่ยนแปลง
22	สขญ.	ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในกรมชลประทานสามเสน อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ห้องน้ำชา-หญิง ชั้นที่ 4 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปศุสัตว์		1,144,000	2.อนุมัติแผน	โอนเปลี่ยนแปลง
23	สขป. 17	ปรับปรุงฝายคลองโอรไป่อ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พื้นที่ประโคนชัย 50 ไร่ ตำบลสุรนารี อำเภอสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา	โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอื่นนอกเหนือจากพระราชดำริ	งานปศุสัตว์		9,890,000	6.อนุมัติรับราคา	โอนเปลี่ยนแปลง
24	สขก.	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และบัญชี กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปศุสัตว์		9,389,900	3.ประกาศร่าง TOR	โอนเปลี่ยนแปลง
