



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๓๓๗/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จ.ม. ๗๕๖๕

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันมาด้วยแล้ว

(นางสาววรารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

- ทราบ

- เรียน ผอ.ส่วน., ผอ.ร.ทอ., ทน.๑-๓ ผอ.

||ลว ผมท.ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

12 ก.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 7 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 102,435.57 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 75,709.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.91 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 15,152 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 411 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.71 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 121 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.80 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5,543 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.58 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8,901 รายการ คิดเป็นร้อยละ 58.75 และยกเลิก จำนวน 176 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.16 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 77,100.73 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 56,578.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.38 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,566.01 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 6,655.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.97 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 69,534.72 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 49,922.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.80 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,792 รายการ (รายการ พ.ร.บ. 65 จำนวน 9,554 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 238 รายการ) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.20 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรายการผูกพันใหม่ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4,787 รายการ คิดเป็นร้อยละ 48.89 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4,822 รายการ คิดเป็นร้อยละ 49.24 และยกเลิก จำนวน 163 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.67 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น

หมายเหตุ : กรมได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. 65 จำนวน 77,143.43 ล้านบาท โอนงบประมาณ รายการบุคลากรภาครัฐระหว่างหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 42.1448 ล้านบาท และโอนงบประมาณภายใต้ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ สททช. จำนวน 0.5563 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 35 (3) ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว103 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่าง หน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คงเหลืองบประมาณที่กรม ได้รับจำนวน 77,100.7328 ล้านบาท

2. งบเงินกู้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 9,077.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.45 งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 1,051.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.32 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 843.39 ล้านบาท งบประมาณเหลือ จ่าย/ยกเลิก 5.02 ล้านบาท และเบิกไม่ทันตามกำหนด 203.32 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,154.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.23 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,068 รายการ (รายการเงินกู้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 1,067 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 169 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.82 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 894 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.71 และยกเลิก จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ

0.47 เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดิน โดยราษฎรบางรายเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ และเกิดข้อพิพาทเรื่องมรดก เนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่ดินได้

3. งบกลาง พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 4,605.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,627.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.77 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,188 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.46 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,133 รายการ คิดเป็นร้อยละ 95.37 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 เนื่องจากมีการแก้ไขสถานที่ดำเนินการจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

4. งบกลาง พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 3,381.88 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,007.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.78 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,078 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ จำนวน 411 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.13 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.46 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 484 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.89 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 176 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.33 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.19 เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

5. เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 งบประมาณ จำนวน 4,224.82 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,977.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.14 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 384 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ซึ่งถูกพับงบประมาณ คือ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ดำเนินการโดย สขป.15 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 380 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.96 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 904.24 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 646.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.44 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,542 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 96 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.23 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.19 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,443 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.58

7. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 795.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.10 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 100 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 53 รายการ คิดเป็นร้อยละ 53.00 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.00 คือ รายการ จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ระยะที่ 2 เนื่องจากการก่อสร้างจะมีผลกระทบกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย
ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565

รายละเอียดข้อมูล



1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

3 งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	102,435.58	75,714.41	73.91	15,152	411	121	5,542	8,902	ยกเลิก 176 รายการ
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (กรมบัญชีกลาง)	77,100.73	56,578.89	73.38	9,792		20	4,787	4,822	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,566.01	6,655.97	87.97						
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	69,534.72	49,922.92	71.80	9,792		20	4,787	4,822	ยกเลิก 163 รายการ
2. งบเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2563	11,283.76	9,077.75	80.45	1,068			169	894	- ยกเลิก 5 รายการ - ตัดไม่ขยาย/สลาย PO/เบิกไม่ทัน จำนวน 1,051.73 ล้านบาท - คงเหลือต้องดำเนินการต่อ จำนวน 1,154.28 ล้านบาท
3. งบกลาง พ.ศ. 2564	4,605.14	3,627.30	78.77	1,188			53	1,133	
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	3,419.87	2,513.95	73.51	1,117			43	1,072	
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	426.47	70.70	16.58	24			21	3	
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183.31	758.79	64.12	44			20	24	
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564	1,562.30	1,534.23	98.20	1,046				1,044	ยกเลิก 2 รายการ
- โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	94.70	20.12	21.25	1				1	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	83.09	74.91	90.16	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	70.00	55.20	78.86	1			1		
3.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี พ.ศ. 2564	1,185.27	1,113.35	93.93	71			10	61	
4. งบกลาง พ.ศ. 2565	3,381.88	1,007.13	29.78	1,078	411	5	484	176	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565	1,126.19	673.09	59.77	620		3	439	176	ยกเลิก 2 รายการ
- จัดหารถปั้นจั่นลอยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกขับไปตามกฎหมาย	97.92	48.96	50.00	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566	1,137.66			407	407				
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565	1,020.11	285.08	27.95	50	4	2	44		
5. เงินกู้ ประจำปี พ.ศ. 2564	4,224.83	3,981.63	94.24	384				381	ยกเลิก 3 รายการ
6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565	904.24	646.02	71.44	1,542		96	3	1,443	
7. จัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565	935.00	795.69	85.10	100			46	53	ยกเลิก 1 รายการ

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจาก ระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565

พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ (พ.ร.บ.)

9,554



70,135.62



65,120.51 ล้านบาท

รายการ

ล้านบาท

โอนเปลี่ยนแปลง

238

รายการ

งบประมาณ
หลังโอนจัดสรร

2,891.16 ล้านบาท

ผลการก่อหนี้ผูกพัน

แล้วเสร็จ จำนวน 4,822 รายการ
งบประมาณ 13,514.49 ล้านบาท

ก่อหนี้ผูกพัน (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 9,609 รายการ (99.79%)
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 66,450.78 ล้านบาท (97.70%)

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 20 รายการ (0.21%)
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,560.89 ล้านบาท (2.30%)

- อนุมัติแผน 2 รายการ งบประมาณ 53.92 ล้านบาท
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ งบประมาณ 137.05 ล้านบาท
- เปิดซอง 2 รายการ งบประมาณ 177.55 ล้านบาท
- อนุมัติรับราคา 10 รายการ งบประมาณ 1,192.37 ล้านบาท

รวม

งบ พ.ร.บ.

70,135.62

ล้านบาท

งบหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

68,011.67

ล้านบาท

9,792

รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

20

1,266.09

1,560.89

6

1,266.09

1,266.09

โอนเปลี่ยนแปลง

14

294.80

ก่อหนี้ผูกพัน

9,609

67,018.45

66,450.78

9,386

67,018.45

63,854.42

โอนเปลี่ยนแปลง

223

2,596.36

CANCEL

สำนัก/กอง ยกเลิก


163

1,851.08



2.2

สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

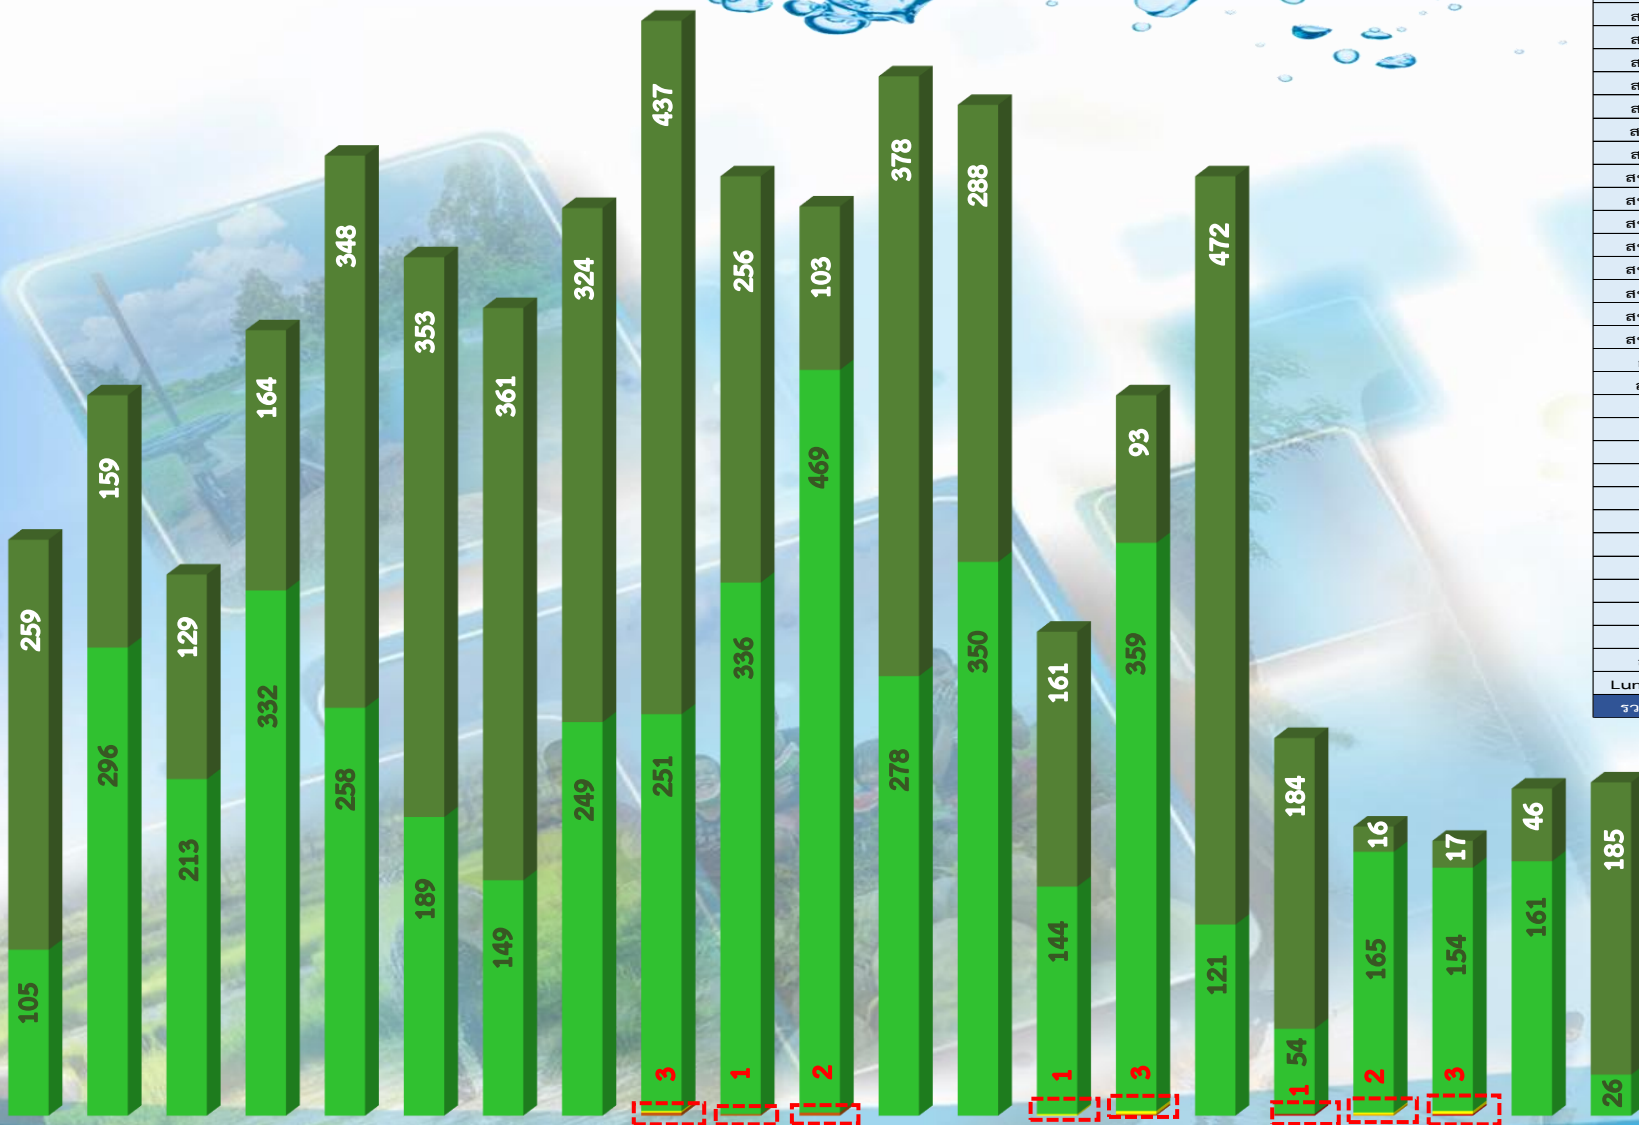

หน่วยงาน	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ก่อหนี้ผูกพัน		รวม	
	จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง
สขบ. 1			364	1,550.47	364	1,550.47
สขบ. 2			455	1,930.46	455	1,930.46
สขบ. 3			342	1,985.54	342	1,985.54
สขบ. 4			496	1,048.36	496	1,048.36
สขบ. 5			606	2,865.07	606	2,865.07
สขบ. 6			542	2,837.39	542	2,837.39
สขบ. 7			510	2,369.40	510	2,369.40
สขบ. 8			573	4,029.67	573	4,029.67
สขบ. 9	3	89.99	688	2,398.63	691	2,488.62
สขบ. 10	1	1.43	592	1,309.86	593	1,311.28
สขบ. 11	2	36.27	572	1,524.82	574	1,561.09
สขบ. 12			656	2,383.39	656	2,383.39
สขบ. 13			638	2,062.45	638	2,062.45
สขบ. 14	1	22.00	305	3,238.74	306	3,260.74
สขบ. 15	3	70.87	452	1,777.00	455	1,847.87
สขบ. 16			593	2,986.38	593	2,986.38
สขบ. 17	1	44.00	238	719.34	239	763.34
กพก.	2	275.15	181	11,723.69	183	11,998.84
สพญ.	3	914.12	171	10,754.86	174	11,668.98
สบอ.			207	697.95	207	697.95
สคก.			211	731.67	211	731.67
สสธ.			44	537.40	44	537.40
สบก.			38	584.76	38	584.76
สอศ.	1	40.00	11	356.49	12	396.49
สจต.			40	152.00	40	152.00
สลก.	2	58.57	10	46.06	12	104.62
สวพ.			3	4.55	3	4.55
สมด.			65	3,594.82	65	3,594.82
กผง.			2	0.14	2	0.14
ศทส.	1	8.50			1	8.50
สฟช.			1	0.42	1	0.42
Lump Sum			3	249.00	3	249.00
รวมทั้งสิ้น	20	1,560.89	9,609	66,450.78	9,629	68,011.67

แล้วเสร็จ	4,822 รายการ
ก่อหนี้ผูกพัน	4,787 รายการ
อนุมัติรับราคา	10 รายการ
เปิดซอง	2 รายการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	6 รายการ
อนุมัติแผน	2 รายการ

ยังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน 20
รายการ

สขบ. 1 สขบ. 2 สขบ. 3 สขบ. 4 สขบ. 5 สขบ. 6 สขบ. 7 สขบ. 8 สขบ. 9 สขบ. 10 สขบ. 11 สขบ. 12 สขบ. 13 สขบ. 14 สขบ. 15 สขบ. 16 สขบ. 17 กพก. สพญ. สบอ. สคก. สสธ. สบก. สอศ. สจต. สลก. สวพ. สมด. กผง. ศทส. สฟช.



2.3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนรายการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อมูล							
						จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
										0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,284.54	68,011.67	49,185.67	72.32	9,629	20	1,560.89	9,609	66,450.78	1,232	302	350	522	2,381	4,822
สขป. 1	1,604.88	1,550.47	1,310.67	84.53	364			364	1,550.47	2	2	1	17	83	259
สขป. 2	1,890.25	1,930.46	1,665.45	86.27	455			455	1,930.46	91	16	11	7	171	159
สขป. 3	2,334.81	1,985.54	1,587.93	79.97	342			342	1,985.54	30	12	19	25	127	129
สขป. 4	1,074.89	1,048.36	930.93	88.80	496			496	1,048.36	123	42	49	26	92	164
สขป. 5	2,640.61	2,865.07	2,374.43	82.88	606			606	2,865.07	21	16	21	29	171	348
สขป. 6	2,646.30	2,837.39	2,235.89	78.80	542			542	2,837.39	17	4	10	13	145	353
สขป. 7	2,349.87	2,369.40	2,264.13	95.56	510			510	2,369.40	4	10	32	14	89	361
สขป. 8	4,016.81	4,029.67	2,507.25	62.22	573			573	4,029.67	50	23	26	40	110	324
สขป. 9	2,437.91	2,488.62	1,705.31	68.52	691	3	89.99	688	2,398.63	13	26	20	42	150	437
สขป. 10	1,336.82	1,311.28	904.07	68.95	593	1	1.43	592	1,309.86	81	15	8	26	206	256
สขป. 11	1,507.05	1,561.09	803.38	51.46	574	2	36.27	572	1,524.82	290	12	11	28	128	103
สขป. 12	2,416.48	2,383.39	1,779.80	74.67	656			656	2,383.39	15	34	22	44	163	378
สขป. 13	2,130.01	2,062.45	1,557.08	75.50	638			638	2,062.45	20	16	22	36	256	288
สขป. 14	3,273.65	3,260.74	2,362.64	72.46	306	1	22.00	305	3,238.74	13	16	18	34	63	161
สขป. 15	1,886.21	1,847.87	980.12	53.04	455	3	70.87	452	1,777.00	182	15	14	33	115	93
สขป. 16	3,057.93	2,986.38	1,723.11	57.70	593			593	2,986.38	11	4	17	23	66	472
สขป. 17	682.65	763.34	546.76	71.63	239	1	44.00	238	719.34	3	1	3	9	38	184
กพท.	12,113.82	11,998.84	9,196.03	76.64	183	2	275.15	181	11,723.69	95	6	9	25	30	16
สพญ.	11,985.44	11,668.98	7,040.97	60.34	174	3	914.12	171	10,754.86	77	15	24	15	23	17
สบอ.	695.81	697.95	312.01	44.70	207			207	697.95	10	11	2	24	114	46
สคก.	742.05	731.67	666.55	91.10	211			211	731.67	3	3	5	3	12	185
สสธ.	531.51	537.40	460.29	85.65	44			44	537.40	5			1	7	31
สบก.	549.48	584.76	340.11	58.16	38			38	584.76	38					
สอส.	376.65	396.49	262.49	66.20	12	1	40.00	11	356.49	4	2	1	1	1	2
สจต.	138.22	152.00	139.60	91.84	40			40	152.00			2	1	10	27
สลก.	82.68	104.62	7.80	7.45	12	2	58.57	10	46.06	9					1
สวพ.	4.71	4.55	4.51	99.25	3			3	4.55	3					
สมด.	3,528.01	3,594.82	3,427.60	95.35	65			65	3,594.82	18	1	3	6	11	26
กผง.		0.14	0.14	99.29	2			2	0.14	1					1
ศทส.		8.50			1	1	8.50								
สพช.		0.42	0.42	100.00	1			1	0.42						1
Lump Sum	249.00	249.00	88.18	35.41	3			3	249.00	3					

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 163 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,851.08 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น

2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 238 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,891.16 ล้านบาท





2.4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ [GFMIS](#) และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม [Cen Project](#) ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน รายการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อมูลกัน							
						จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
										0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,284.54	68,011.67	49,185.67	72.32	9,629	20	1,560.89	9,609	66,450.78	1,232	302	350	522	2,381	4,822
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรดิต	809.00	731.05	545.72	74.65	10			10	731.05	1	1	4	1	3	
โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,561.63	2,755.90	1,636.80	59.39	14	1	676.20	13	2,079.70	8	1	1		1	2
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	27,288.42	27,236.80	20,662.83	75.86	667	4	267.05	663	26,969.75	174	29	50	59	223	128
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	419.96	332.68	314.03	94.39	8			8	332.68	7					1
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	505.89	810.55	279.64	34.50	12			12	810.55	6	2	4			
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่2) จังหวัดสงขลา	141.06	141.06	0.00		1			1	141.06					1	
โครงการประดูระบายน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	99.56	84.83	82.88	97.71	4			4	84.83	1		1		1	1
โครงการประดูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	312.00	293.01	151.35	51.65	5			5	293.01	3		1	1		
โครงการประดูระบายน้ำศรีสงครามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย	72.00	93.72	59.62	63.61	4			4	93.72		1	2			1
โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย	275.66	93.71	20.03	21.37	6			6	93.71	3		1	1	1	
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,308.96	6,493.11	4,148.11	63.88	394	3	41.78	391	6,451.33	64	21	25	46	118	117
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	10,895.81	10,863.20	6,915.30	63.66	315	6	278.88	309	10,584.32	64	22	27	50	90	56
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	1,033.27	1,061.23	463.92	43.72	14	1	228.00	13	833.23	8	2		1	2	
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	1,298.06	841.53	728.81	86.61	12			12	841.53	4	2	2	1	1	2
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,193.40	2,184.08	1,687.08	77.24	759			759	2,184.08	92	21	19	17	151	459
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,507.83	10,423.10	8,839.88	84.81	6,790	1	0.49	6,789	10,422.60	706	179	189	306	1,676	3,733
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	167.77	130.11	58.67	45.09	5			5	130.11	2	1		1	1	
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	108.00	107.99	105.61	97.79	2			2	107.99	1					1
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	104.14	123.85	82.96	66.99	6			6	123.85	5		1			
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	348.02	348.02	76.95	22.11	7			7	348.02	5		1		1	
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำซันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	637.62	637.62	596.61	93.57	5			5	637.62	2		1		1	1
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	388.00	383.54	296.50	77.31	3			3	383.54	3					
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	525.00	402.96	364.54	90.46	3			3	402.96			1	1		1
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิต	313.78	429.85	419.51	97.59	7			7	429.85	1				2	4
ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	969.71	1,008.20	648.32	64.30	576	4	68.50	572	939.70	72	20	20	37	108	315

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 163 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,851.08 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น

2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 238 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,891.16 ล้านบาท






2.5

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565

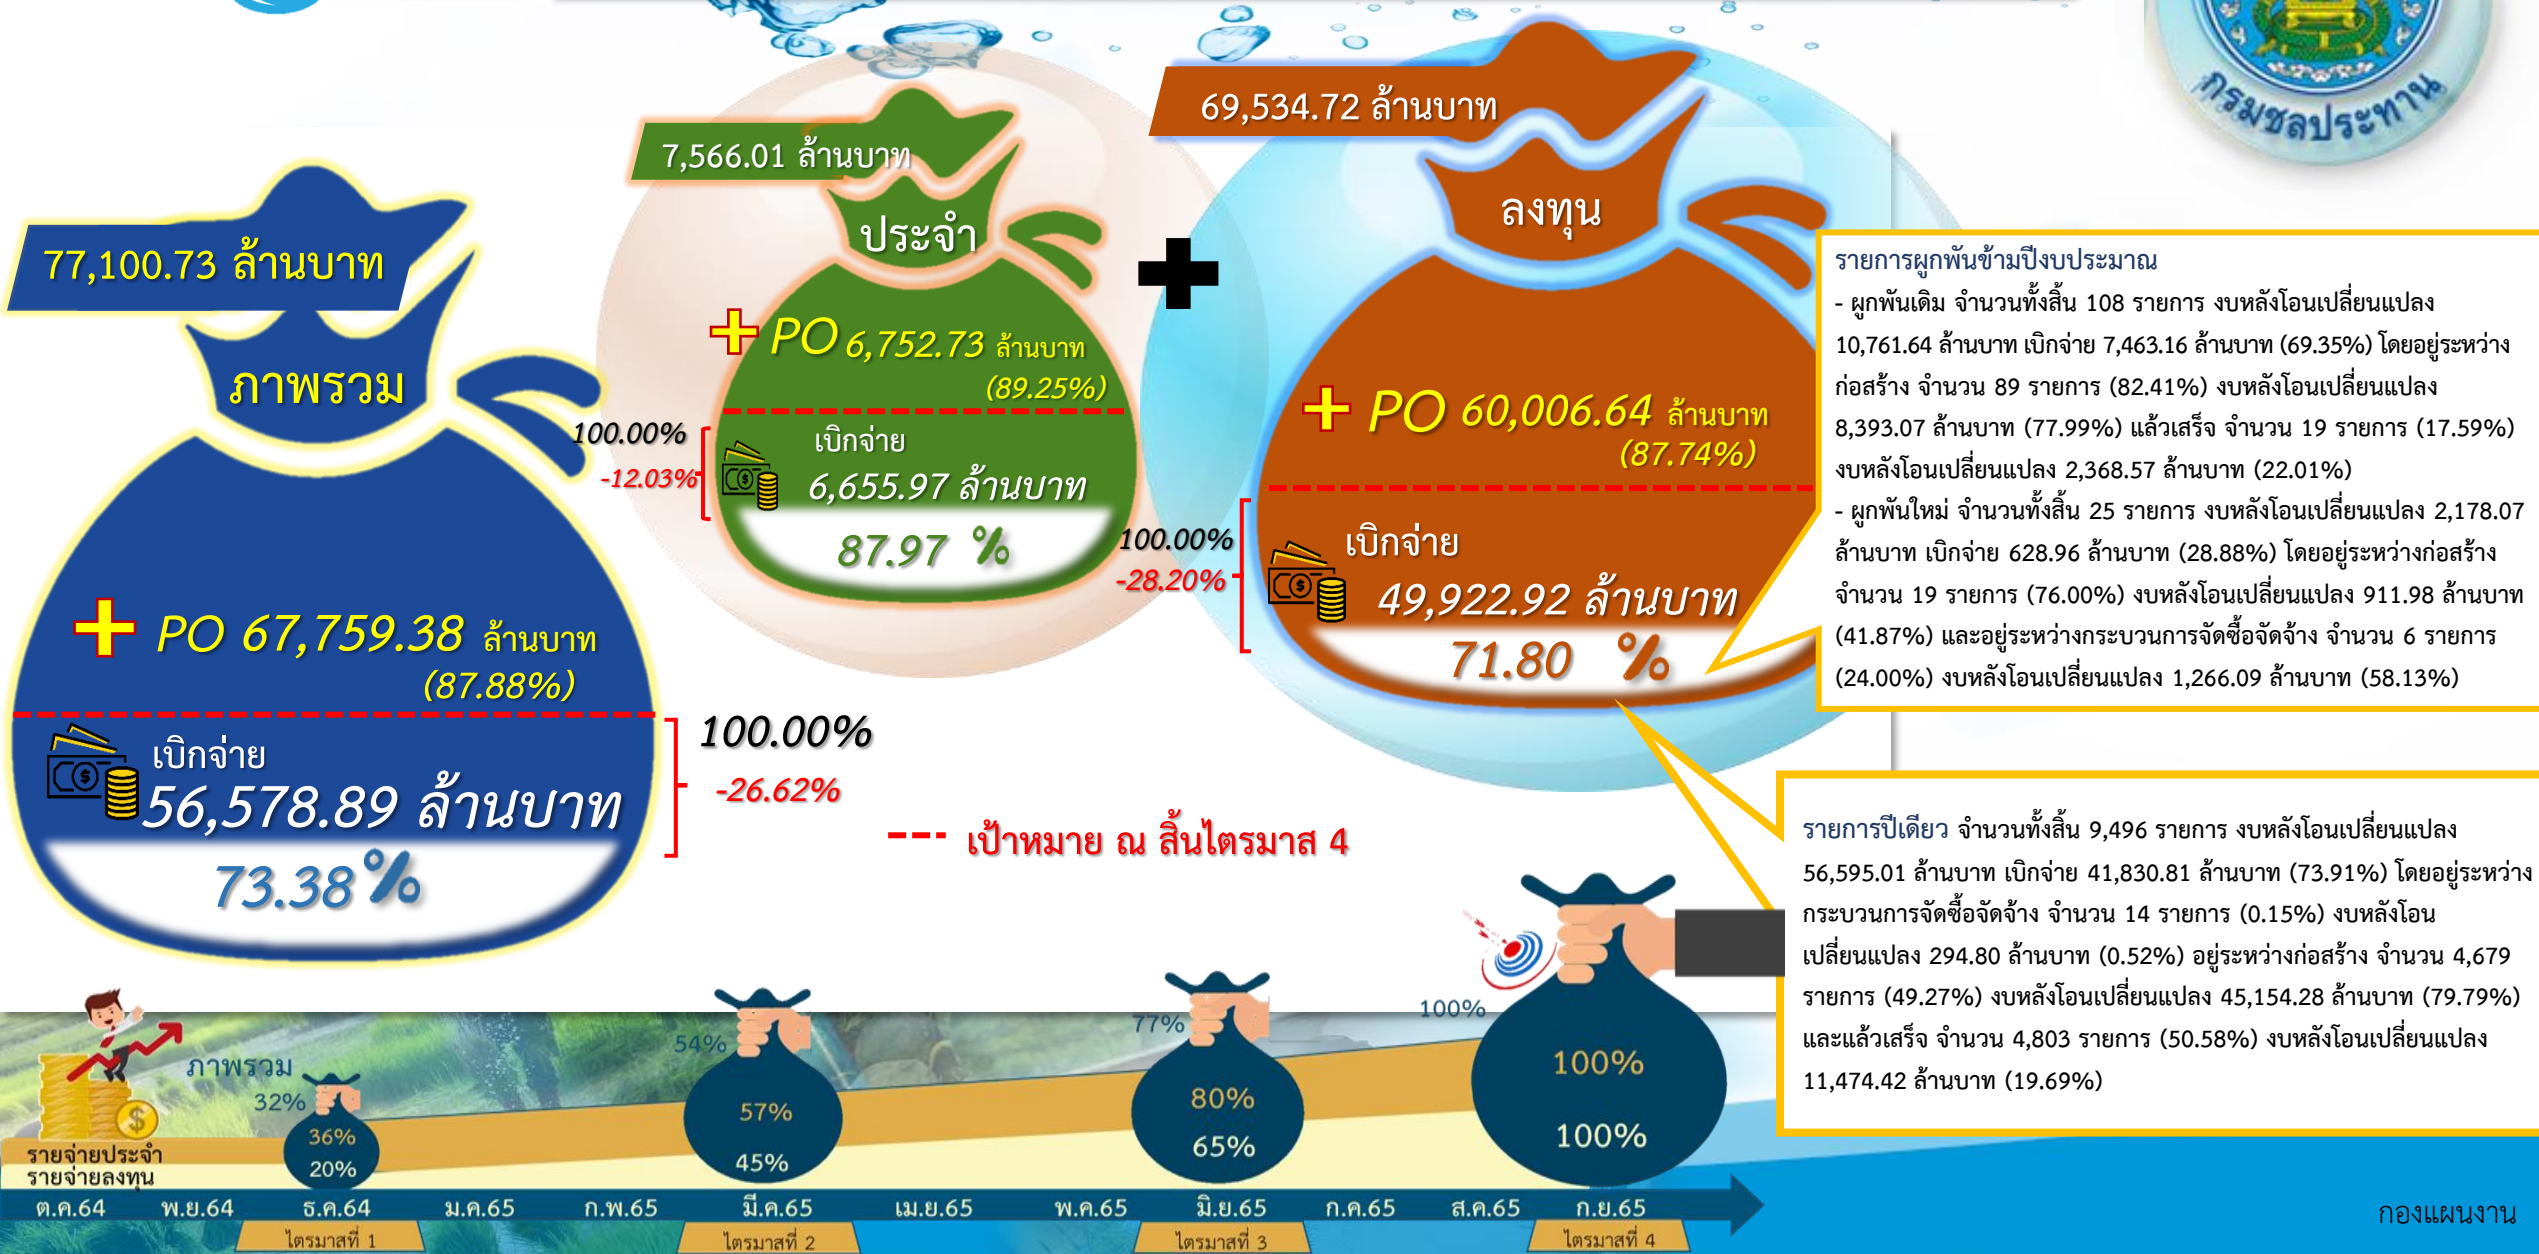

2.6

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565

77,100.73 ล้านบาท

ภาพรวม

เบิกจ่าย



56,578.89 ล้านบาท

73.38 %

ร้อยละ

เป้าหมายภาพรวม ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

100

เป้าหมาย 100.00%

เป้าหมาย 77.00%

เป้าหมาย 54.00%

เป้าหมาย 32.00%

- ต่ำกว่าเป้าหมายกรม ร้อยละ 18.96

- สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (60 - 64) ร้อยละ 2.56

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
● เป้าหมายกรม ปี 65	10.67	21.34	32.00	39.33	46.66	54.00	61.67	69.34	77.00	84.67	92.34	100.00
▲ ผลปี 65 (77,143.43)	2.45	7.97	16.49	21.25	28.37	38.31	43.27	51.57	61.30	66.15	73.38	
▲ ผลปี 64 (74,106.98)	0.66	4.91	12.24	16.05	22.61	34.76	39.61	48.38	59.48	64.67	68.91	83.67
■ ผลปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	7.84	9.23	16.56	25.26	34.54	47.70	54.68	66.97	82.54
■ ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	83.17
■ ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
■ ผลปี 60 (47,004.27)	1.50	5.94	19.46	23.11	30.30	43.12	48.35	55.72	66.56	71.83	77.86	86.95
■ เฉลี่ย 5 ปี (60-64)	1.46	5.43	12.62	16.50	21.98	33.08	38.50	46.47	57.49	63.16	70.82	83.54



2.7

สถิติการเบิกจ่าย งบรายจ่ายลงทุน ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565

ร้อยละ

เป้าหมายงบรายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

100

80

60

40

20

0

เป้าหมายรัฐบาล 100.00%

เป้าหมาย 65.00%

เป้าหมาย 45.00%

เป้าหมาย 20.00%

69,534.72 ล้านบาท

ลงทุน

เบิกจ่าย


49,922.92 ล้านบาท

71.80%

- ต่ำกว่าเป้าหมายกรม ร้อยละ 16.54
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (60 - 64) ร้อยละ 3.70

เป้าหมายกรม ปี 65	6.67	13.34	20.00	28.33	36.66	45.00	51.67	58.34	65.00	76.67	88.34	100.00
ผลปี 65 (70,135.62)	1.94	7.11	15.67	20.09	27.12	37.20	41.86	50.22	60.17	64.59	71.80	
ผลปี 64 (66,423.87)	0.003	3.81	10.97	14.29	20.79	33.39	37.90	46.78	58.21	63.11	66.85	82.02
ผลปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	4.77	5.36	12.51	21.31	30.59	44.54	51.34	64.24	80.61
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
ผลปี 61 (47,566.20)	1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
ผลปี 60 (38,118.10)	0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69
เฉลี่ย 5 ปี (60 - 64)	0.68	3.98	11.07	14.27	19.39	30.90	35.95	43.78	55.38	60.52	68.10	81.38

ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6.67	13.34	20.00	28.33	36.66	45.00	51.67	58.34	65.00	76.67	88.34	100.00
1.94	7.11	15.67	20.09	27.12	37.20	41.86	50.22	60.17	64.59	71.80	
0.003	3.81	10.97	14.29	20.79	33.39	37.90	46.78	58.21	63.11	66.85	82.02
0.73	0.96	1.27	4.77	5.36	12.51	21.31	30.59	44.54	51.34	64.24	80.61
0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69
0.68	3.98	11.07	14.27	19.39	30.90	35.95	43.78	55.38	60.52	68.10	81.38

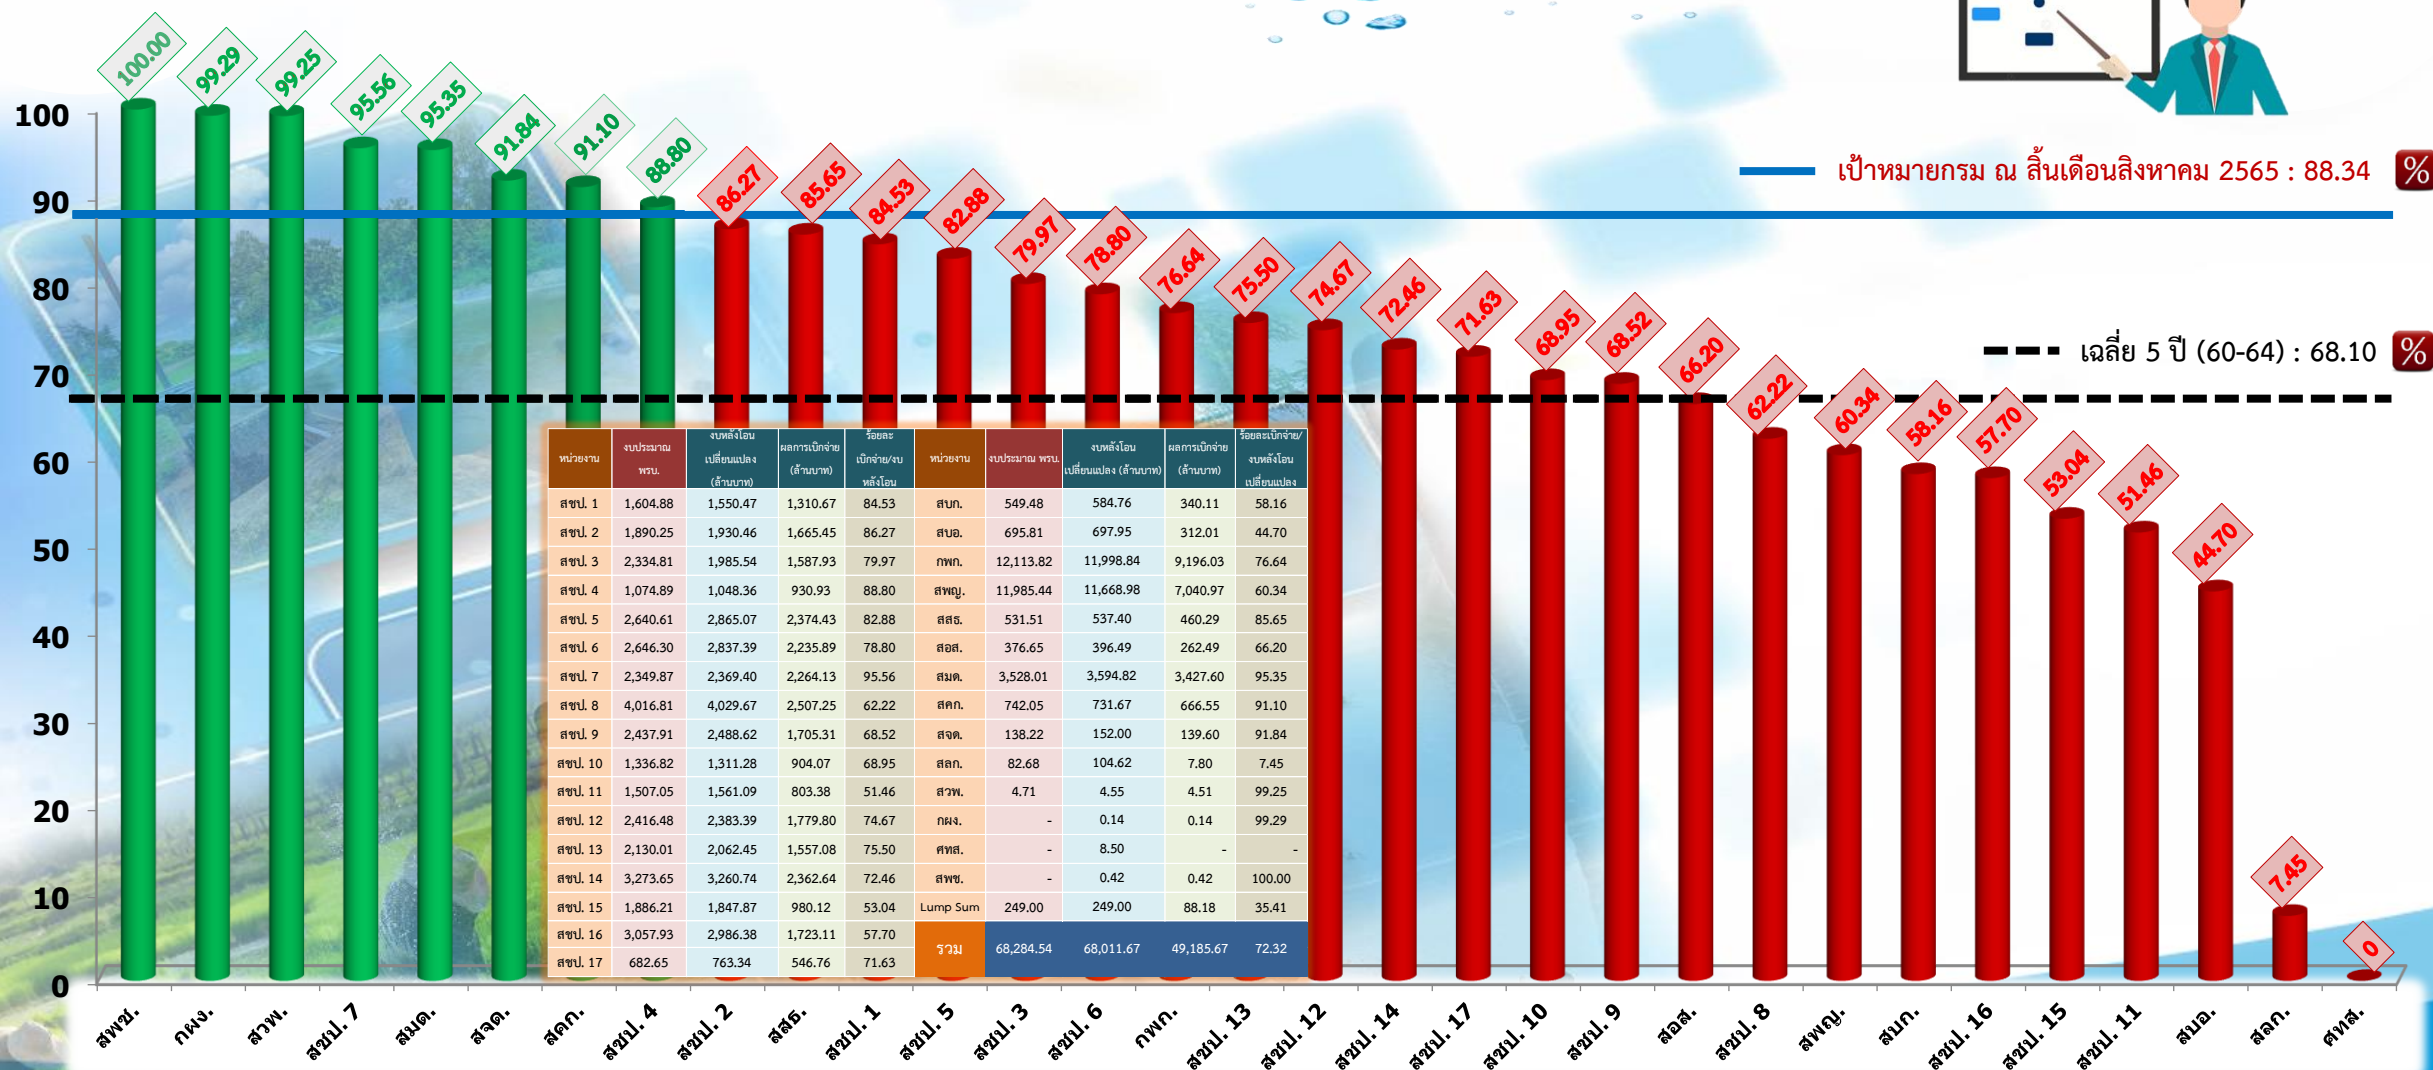

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 163 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,851.08 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น
2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 238 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,891.16 ล้านบาท

■ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายรัฐบาล
■ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)							
1	กระทรวงคมนาคม	160,819.34	125,374.01	77.96	177,168.82	125,238.53	70.69	7.27
2	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	74,855.29	53,256.67	71.15	72,068.36	51,459.52	71.40	-0.25
3	กระทรวงมหาดไทย	75,684.27	38,371.52	50.70	80,078.40	39,044.44	48.76	1.94
	ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมพัฒนาที่ดิน	1,858.87	1,639.31	88.19	2,113.67	1,881.00	88.99	-0.80
2	กรมชลประทาน	69,534.72	49,922.92	71.80	66,003.63	47,091.17	71.35	0.45
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,272.68	263.38	20.69	1,165.83	605.36	51.92	-31.23
	ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)							
1	กรมทางหลวงชนบท	44,163.46	35,593.71	80.60	47,150.01	35,372.38	75.02	5.58
2	กรมทางหลวง	107,486.58	84,794.63	78.89	119,947.25	85,540.97	71.32	7.57
3	กรมชลประทาน	69,534.72	49,922.92	71.80	66,003.63	47,091.17	71.35	0.45
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	29,841.10	11,860.66	39.75	27,511.54	14,020.77	50.96	-11.21



หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 65.24%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (45 หน่วยงาน) เฉลี่ย 65.44%



3

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564



1,068 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

9,077.75 ล้านบาท 80.45 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

843.39 ล้านบาท 7.48 %

เหลือจ่าย/ยกเลิก

5.02 ล้านบาท 0.04 %

เบิกจ่ายไม่ทัน แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ

203.32 ล้านบาท 1.80 %

งบประมาณที่หมดความจำเป็น/
เบิกจ่ายไม่ทัน
สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้

รวม 1,051.73 ล้านบาท 9.32 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

1,154.28 ล้านบาท

10.23 %

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565



สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,068 รายการ

(เงินกัน 1,067 รายการ โอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ



894 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง



169 รายการ

ยกเลิกรายการ



5 รายการ

หมายเหตุ: รายการโอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ
คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

ล้านบาท



แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

รวม

แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95	11,283.76
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	839.80	1,330.56	866.19	879.60	463.75	671.17	304.54	646.63		9,077.75
ผลต่าง	-	- 428.49	- 1,221.49	- 746.44	- 3.28	- 580.67	351.53	139.47	327.54	217.24	528.54		

ต.ค.64

พ.ย.64

ธ.ค.64

ม.ค.65

ก.พ.65

มี.ค.65

เม.ย.65

พ.ค.65

มิ.ย.65

ก.ค.65

ส.ค.65

ก.ย.65

กองแผนงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย
100%



เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



UP ภาพรวมโครงการเงินกู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



การเบิกจ่ายงบประมาณ 4,224.83 ล้านบาท



เบิกจ่าย 3,981.63 ล้านบาท 94.24%



เหลือจ่าย 243.20 ล้านบาท 5.76%



สถานะการดำเนินงานทั้งสิ้น 384 รายการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ 381 รายการ ผลสัมฤทธิ์ตามแผน 100%

หมายเหตุ : ยกเลิก 3 รายการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564



ตัวชี้วัดของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ :

- ซ่อมแซม/ปรับปรุง 207 รายการ
- อาคารบังคับน้ำ 12 รายการ
- ระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรกรรม 30 รายการ
- ขุดลอก 61 รายการ
- แก้มลิง 40 รายการ
- อื่น ๆ เช่น ประตูปรับน้ำ ทานบหัวดิน 3 รายการ
- ฝาย 21 รายการ
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 10 รายการ

ผลผลิตของโครงการ :

พท.ขป. 19,667 ไร่ = 19,667 ไร่ 100%
ปริมาณน้ำ 26.98 ล้าน ลบ.ม. = 26.98 ล้าน ลบ.ม. 100%
พท.รับประโยชน์ 209,653 ไร่ = 208,783 ไร่ 99.59%
ครัวเรือนรับประโยชน์ 64,952 ครัวเรือน = 64,552 ครัวเรือน 99.38%
การจ้างแรงงาน 9,716 คน = 10,076 คน 103.71%



จำแนกตามโครงการย่อย 2 โครงการ มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1.

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน



การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ 4,069.05 ล้านบาท



เบิกจ่าย 3,827.13 ล้านบาท 94.05%



เหลือจ่าย 241.92 ล้านบาท 5.95%

สถานะการดำเนินงาน

จำนวน 354 รายการ



- ดำเนินการแล้วเสร็จ 351 รายการ

ผลสัมฤทธิ์ตามแผน 100%

- ยกเลิก 3 รายการ



ตัวชี้วัดของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ :

- ซ่อมแซม/ปรับปรุง 207 รายการ (ยกเลิก 3 รายการ)
- ฝาย 21 รายการ
- อาคารบังคับน้ำ 12 รายการ
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 10 รายการ
- ขุดลอก 61 รายการ
- แก้มลิง 40 รายการ
- อื่น ๆ เช่น ประตูปรับน้ำ ทานบหัวดิน 3 รายการ

ผลผลิตของโครงการ :

พท.ขป. 19,667 ไร่ = 19,667 ไร่ 100%
ปริมาณน้ำ 26.98 ล้าน ลบ.ม. = 26.98 ล้าน ลบ.ม. 100%
พท.รับประโยชน์ 196,422 ไร่ = 195,552 ไร่ 99.56%
การจ้างแรงงาน 8,874 คน = 9,234 คน 104.06%
ครัวเรือนรับประโยชน์ 63,414 ครัวเรือน = 63,014 ครัวเรือน 99.37%

2.

โครงการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงเกษตรกรรม



การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบ 155.78 ล้านบาท



เบิกจ่าย 154.50 ล้านบาท 99.18%



เหลือจ่าย 1.28 ล้านบาท 0.82%

สถานะการดำเนินงาน

จำนวน 30 รายการ



- ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 30 รายการ

ผลสัมฤทธิ์ตามแผน 100%



ตัวชี้วัดของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ :

- ระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรกรรม 30 รายการ

ผลผลิตของโครงการ :

พท.รับประโยชน์ 13,231 ไร่ = 13,231 ไร่ 100%
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,538 ครัวเรือน = 1,538 ครัวเรือน 100%
การจ้างแรงงาน 842 คน = 842 คน 100%





ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กรมชลประทาน

การดำเนินงาน

มิตติ คร.ม./คำสั่งนายก อนุมัติงบกลาง 64

รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ

งบประมาณ 4,605.14 ล้านบาท

เบิก 3,627.30 ล้านบาท 78.77 %



ผลการดำเนินงาน



แล้วเสร็จ

1,133 รายการ 95.37 %



ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ

53 รายการ 4.46 %



ยกเลิก

2 รายการ 0.17 %

ตัวชี้วัดของโครงการ



พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่



พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 862,465 ไร่ 86.92 %



ปริมาณน้ำ 16.74 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์ = 13.16 ล้าน ลบ.ม. 78.61 %



ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 126,889 ครัวเรือน 89.96 %

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565



มติ ครม.

8 มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์

มติ ครม.

15 มิ.ย. 64

มติ ครม.

14 ก.ย. 64

คำสั่งนายก

29 ก.ย. 64

คำสั่งนายก

29 ก.ย. 64

คำสั่งนายก

29 ก.ย. 64

กปร.

ปี 2564

24 รายการ

426.47 ล้านบาท

เบิกจ่าย 70.70 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 16.58

• อยู่ระหว่างตรวจรับครุภัณฑ์

21 รายการ

• แล้วเสร็จ 3 รายการ

75.00 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 16

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาลูกหลานและภัยแล้ง

44 รายการ

1,183.31 ล้านบาท

เบิกจ่าย 758.79 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 64.12

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง/ตรวจรับ

ครุภัณฑ์ 20 รายการ

• แล้วเสร็จ 24 รายการ

58.03 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 16

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่
ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้ง ปี 2563/2564

1,046 รายการ

1,562.30 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,534.23 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 98.20

• แล้วเสร็จ 1,044 รายการ

• ยกเลิก 2 รายการ

98.70 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 23

ปริมาณน้ำ 1.26 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้ง ปี 2564

1 รายการ

94.70 ล้านบาท

เบิกจ่าย 20.12 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 21.25

• แล้วเสร็จ

100 %

*อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย.

พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

1 รายการ

83.09 ล้านบาท

เบิกจ่าย 74.91 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 90.16

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

95.00 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย.

พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

1 รายการ

70.00 ล้านบาท

เบิกจ่าย 55.20 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 78.85

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

95.00 %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 29

พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

71 รายการ

1,185.27 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,113.35 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 93.93

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

10 รายการ

• แล้วเสร็จ 61 รายการ

89.46 %

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



กรมชลประทาน

การดำเนินงาน

มีมติ คร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี 65

รวม 4 ครั้ง จำนวน 1,078 รายการ

งบประมาณ 3,381.88 ล้านบาท

เบิก 1,007.13 ล้านบาท 29.78%

ผลการดำเนินงาน

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
411 รายการ 38.13 %

จัดซื้อ-จัดจ้าง
5 รายการ 0.45 %

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ
484 รายการ 44.90 %

แล้วเสร็จ
176 รายการ 16.33 %

ยกเลิก
2 รายการ 0.19 %

ตัวชี้วัดของโครงการ

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์ 2,250,439 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 156,121 ไร่ 6.94 %

ครัวเรือน 199,943 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 24,599 ครัวเรือน 12.30 %



ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565

มติ ครม.
29 มี.ค.
65

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
4 ส.ค.
65

มติ ครม.
8 ส.ค.
65

กปร.
ปี 2565



620 รายการ
1,126.19 ล้านบาท

เบิกจ่าย 673.09 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 59.77

- แล้วเสร็จ 176 รายการ
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 439 รายการ
- จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 รายการ
- ยกเลิก 2 รายการ

56.16 %



ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.



พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่



ครัวเรือนรับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565



1 รายการ
97.92 ล้านบาท

เบิกจ่าย 48.96 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 50.00

- อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ

50.00 %

ดำเนินการจัดหาถักปั่นขึ้น เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จัดหาถักปั่นขึ้นลอย ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกปรับไปตามกฎหมาย



407 รายการ
1,137.66 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

- เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 407 รายการ

- %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565



พื้นที่รับประโยชน์ 592,517 ไร่



ครัวเรือนรับประโยชน์ 69,855 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566



50 รายการ
1,020.11 ล้านบาท

เบิกจ่าย 285.08 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 27.95

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 44 รายการ
- จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 รายการ
- เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ

20.78 %

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565





6

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565)

งานกองทุน จัดรูปที่ดิน

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- งบประมาณ 220.30 ล้านบาท = เบิกจ่าย 173.74 ล้านบาท 78.87 %
- ผลการดำเนินงาน
 - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 10 รายการ
 - แล้วเสร็จ 23 รายการ
 - รวมทั้งสิ้นจำนวน 33 รายการ
- ผลสัมฤทธิ์
 - พื้นที่เกษตรกรรม 26,235 ไร่ = 8,620 ไร่
 - ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,627 ครัวเรือน = 877 ครัวเรือน

จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร

- งบประมาณ 714.70 ล้านบาท = เบิกจ่าย 621.95 ล้านบาท 87.02%
- ผลการดำเนินงาน
 - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 36 รายการ
 - แล้วเสร็จ 30 รายการ
 - ยกเลิก 1 รายการ
 - รวมทั้งสิ้นจำนวน 67 รายการ
- ผลสัมฤทธิ์
 - พื้นที่เกษตรกรรม 62,756 ไร่ = 19,187 ไร่
 - ครัวเรือนรับประโยชน์ 5,603 ครัวเรือน = 1,724 ครัวเรือน

ภาพรวม

- งบประมาณ 935.00 ล้านบาท
- = เบิกจ่าย 795.69 ล้านบาท
- 85.10 %



- ผลการดำเนินงาน : 100 รายการ
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 46 รายการ
- แล้วเสร็จ 53 รายการ
- ยกเลิก 1 รายการ
- เนื่องจากการก่อสร้างจะมีผลกระทบกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร



- ผลสัมฤทธิ์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
- พื้นที่เกษตรกรรม 88,991 ไร่ = 27,807 ไร่
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 7,230 ครัวเรือน = 2,601 ครัวเรือน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



- งบประมาณ 904.24 ล้านบาท
- = เบิกจ่าย 646.02 ล้านบาท
- 71.44 %

ผลการดำเนินงาน : 1,542 รายการ



- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 96 รายการ
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 รายการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,443 รายการ



รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2565 (บาท)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	สถานะดำเนินการ	ประเภท
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 รายการ			1,266,092,000	1,560,893,200		
1	กพท.	(230) ประตุระบายน้ำวังงามและอาคารประกอบโครงการประตุระบายน้ำคลองกลายบ้านนาภูกน ตำบลสระแก้วอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9490]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานผูกพันใหม่	137,600,000	137,600,000	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
2	กพท.	(367) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา - [9013]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	137,550,000	137,550,000	5.เปิดซอง	ทรบ.
3	สกล.	(10) อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [557]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานผูกพันใหม่	46,742,000	46,742,000	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
4	สพญ.	(8) งานชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 - [9528]	โครงการคลองระบายน้ำหลักบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานผูกพันใหม่	676,200,000	676,200,000	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
5	สพญ.	(6) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง - [9514]	โครงการพัฒนาสูบน้ำท้ายหลวงดอนล่าง จังหวัดหนองคาย	งานผูกพันใหม่	228,000,000	228,000,000	6.อนุมัติรับราคา	ทรบ.
6	สอส.	(29) ค่าจ้างสำรวจออกแบบโครงการคลองระบายน้ำหลักป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [9045]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานผูกพันใหม่	40,000,000	40,000,000	5.เปิดซอง	ทรบ.
7	คทส.	โครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมชลประทาน	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว		8,500,000	6.อนุมัติรับราคา	โอนเปลี่ยนแปลง
8	สขป. 9	ซ่อมแซมคันโอป พร.แม่น้ำนอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากรด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว		494,000	6.อนุมัติรับราคา	โอนเปลี่ยนแปลง
9	สขป. 11	ประตุระบายน้ำที่ถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9723]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว		21,270,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	โอนเปลี่ยนแปลง
10	สขป. 11	ประตุระบายน้ำที่ถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [9724]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว		15,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	โอนเปลี่ยนแปลง
11	สขป. 10	ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองส่งน้ำ MC กม.10+000 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลบ้านตัว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) - [9795]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว		1,427,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	โอนเปลี่ยนแปลง
12	สขป. 14	ปรับปรุงทางลำเลียงรอบอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กม. 0+000-3+000 เป็นช่วงๆ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) - [9778]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว		22,000,000	6.อนุมัติรับราคา	โอนเปลี่ยนแปลง
13	สขป. 15	อาคารป้องกันตลิ่งคลองท่าดี บ้านวัดสมอ ตำบลกำโลน อำเภอสานทราย จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) - [9762]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว		33,010,000	6.อนุมัติรับราคา	โอนเปลี่ยนแปลง
14	สขป. 15	ประตุระบายน้ำคลองชุมตลิ่ง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) - [9761]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว		28,000,000	6.อนุมัติรับราคา	โอนเปลี่ยนแปลง
15	สขป. 15	ปรับปรุงถนนแนวท่อส่งน้ำสาย RMP ฝ่ายคลองทรายขาว กม.1+053-กม.3+800 ระยะทาง 2.082 กม. ตำบลทรายขาว อำเภอคลองหอย จังหวัดกระบี่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) - [9798]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว		9,858,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	โอนเปลี่ยนแปลง
16	สขป. 17	ปรับปรุงถนนกันน้ำแม่น้ำโลก ตำบลนุโษ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) - [9763]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว		44,000,000	2.อนุมัติแผน	โอนเปลี่ยนแปลง
17	สขป. 9	อาคารบังคับน้ำบ้านเนินหย่อง ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) - [9773]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว		40,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	โอนเปลี่ยนแปลง
18	สขป. 9	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าใบ 2 คอน 4 ตำบลกระแสน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) - [9772]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว		49,496,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	โอนเปลี่ยนแปลง
19	สกล.	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก Social Media เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบริการประชาชน (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) - [9736]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว		11,826,200	6.อนุมัติรับราคา	โอนเปลี่ยนแปลง
20	สพญ.	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ MC1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) - [9800]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว		9,920,000	2.อนุมัติแผน	โอนเปลี่ยนแปลง
