



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๓๕๐/๒๕๖๕ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕)

ก.ม. ๖๒๖๓

เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๙ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๒,๐๕๐.๓๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๘๒๑.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๗๙๙.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๔ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๒,๐๖๘.๐๕ ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา ๒,๗๐๔.๑๓ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๗๖ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐๗ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ และยกเลิก จำนวน ๙ รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๑ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๖๑๔.๗๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๐๒๘.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๙ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๘๙๘.๐๔ ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา ๖๙๑.๗๔ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๓ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๗ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕๖ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รรช. รรช. รรช. รรช. และผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.
๙ ก.ย. ๒๕๖๕

- ทราบ
- บ.ผง. ผอ.ส่วน, ผอ.ภาค
เพื่อโปรดทราบ

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.ชอ.

12 ก.ย. ๒๕๖๕

โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้อย่างพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 219 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2,050.38 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,821.06 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,799.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.84 แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 2,068.05 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 2,704.13 ตัน คิดเป็นร้อยละ 130.76 ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 207 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ และยกเลิก จำนวน 9 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- **Para Asphalt Concrete** จำนวน 161 รายการ งบประมาณจัดสรร 1,332.78 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,323.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.31 แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 795.88 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,318.66 ตัน คิดเป็นร้อยละ 165.69 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 151 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างฯ ห้วยยาง (Para soil cement) ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา และซ่อมแซมถนนทำนบกดิน อ่างฯ ลำเชียงไกร (ตอนล่าง) (Para A/C) ระยะทาง 3.20 กิโลเมตร ตำบลบัลลังก์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- **Para Soil Cement** จำนวน 29 รายการ งบประมาณจัดสรร 153.95 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 153.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 1,210.73 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,324.03 ตัน คิดเป็นร้อยละ 109.36 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 28 รายการ และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คือ ซ่อมแซมถนนท้าย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลทัพราช อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3/2563 มีมติให้ชะลอแผนการดำเนินงาน โดยให้ส่วนความปลอดภัยเขื่อนของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จัดตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อศึกษาและสรุปรูปแบบในการแก้ไขและปรับปรุงเขื่อนห้วยยาง จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างเร่งด่วน

- **โครงการขยายผลทุ่นยางพาราดักผักตบชวา (Para – Log Boom-I)** จำนวน 1 รายการ งบประมาณจัดสรร 82.85 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 82.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ

- **รายการงานโอนเปลี่ยนแปลง** จำนวน 28 รายการ งบประมาณจัดสรร 251.48 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 239.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.28 แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 61.44 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 61.44 ตัน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 27 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ ปรับปรุงคันคลองพระยาบรรลือ ฝั่งเหนือ กม.7+150 ถึง กม.4+600 รวมความยาว 2.550 กิโลเมตร ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพารา ในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าหัวงาน โครงการชลประทาน รวมทั้งสิ้น 131 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท ได้รับงบประมาณ จัดสรร 1,614.77 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,028.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.69 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 898.04 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 691.74 ตัน คิดเป็นร้อยละ 77.03 ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 67 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 56 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ โดยจำแนกตามประเภทงาน ได้แก่

- **Para Asphalt Concrete** จำนวน 127 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,802.41 ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร 1,586.36 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,000.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.04 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 792.54 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 584.60 ตัน คิดเป็นร้อยละ 73.76 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 63 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 56 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

- **Para Soil Cement** จำนวน 4 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 34.27 ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร 28.41 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 28.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 105.50 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 107.14 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.55 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565

กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565





การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดำเนินการต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2565



พ.ร.บ. 2564			
ประเภท	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,821.06	219	2,068.05
ผล	1,799.88 (98.84%)	207	2,704.13 (130.76%)



Para Asphalt Concrete			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,332.78	161	795.88
ผล	1,323.58 (99.31%)	151	1,318.66 (165.69%)

Para Soil Cement			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	153.95	29	1,210.73
ผล	153.83 (99.92%)	28	1,324.03 (109.36%)

รายการโอนเปลี่ยนแปลง			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	251.48	28	61.44
ผล	239.62 (95.28%)	27	61.44 (100.00%)


Para. - Log Boom-I		
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)
แผน	82.85	1
ผล	82.85 (100%)	1



หมายเหตุ : ยกเลิกจำนวน 9 รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

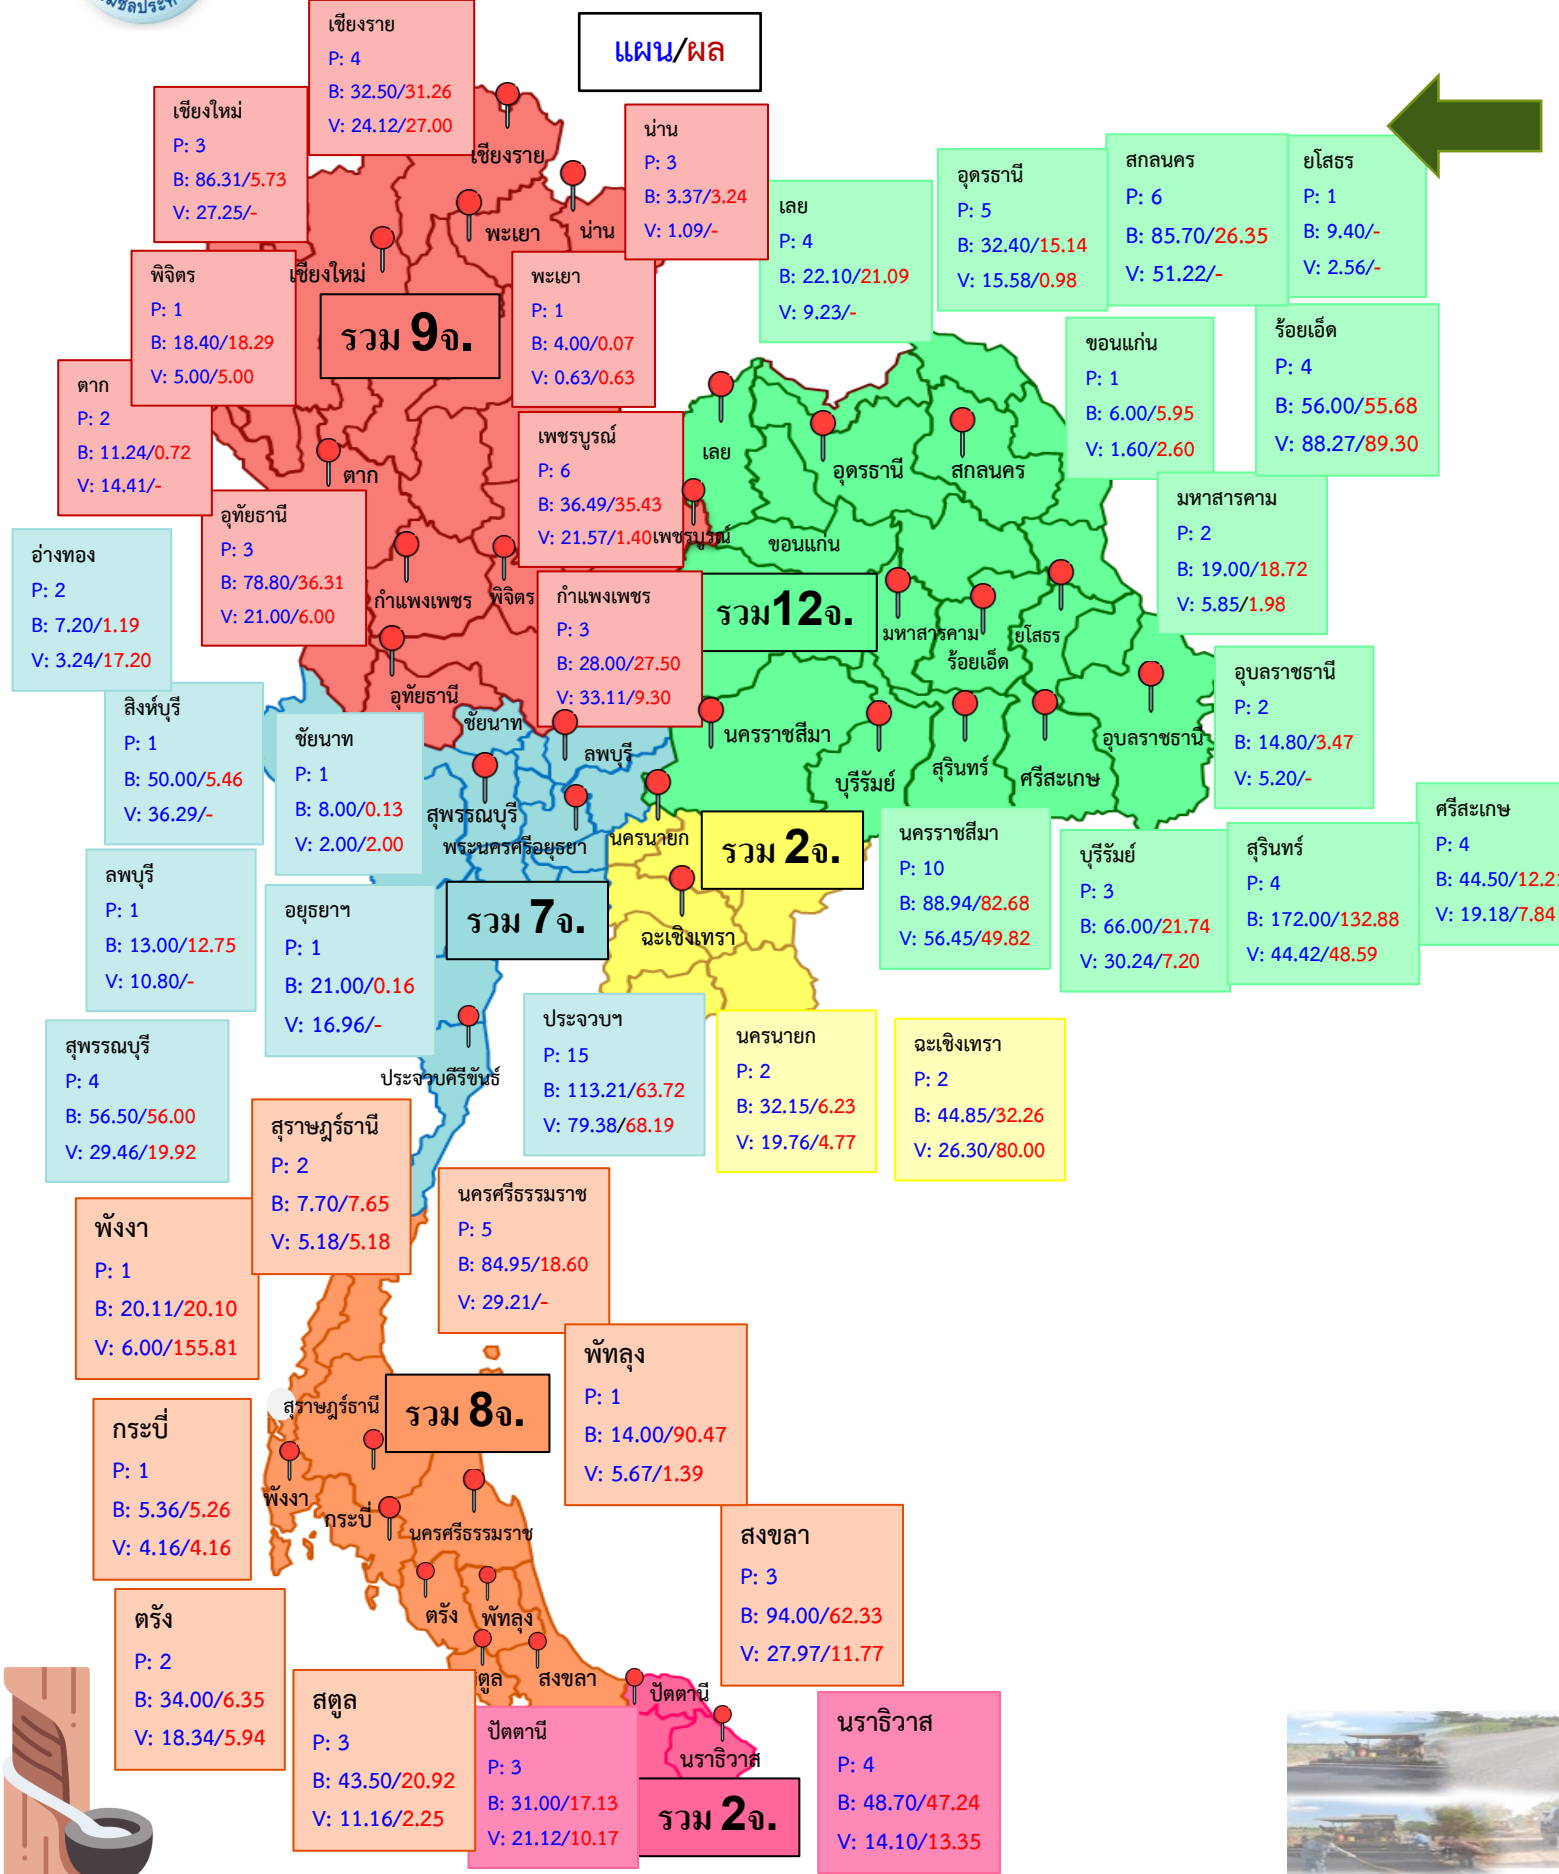

แผนการดำเนินงาน		P (PA-PS)	B	V
ภาค/จังหวัด	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	น้ำยางชั้น (ตัน)	
รวม 40 จ.	131 (127-4)	1,836.68	898.04	
เหนือ	26 (26)	299.11	148.17	
ตะวันออกเฉียงเหนือ	46 (43-3)	616.84	329.80	
กลาง	25 (25)	268.91	178.13	
ตะวันออก	4 (4)	77.00	46.06	
ใต้	23 (22-1)	495.12	160.65	
ใต้ชายแดน	7 (7)	79.70	35.22	

ผลการดำเนินงานภาพรวม				
ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,836.68	1,614.77	131	898.04
ผล	1,028.42 (55.99%)	1,028.42 (63.69%)	67	691.74 (77.03%)

PA : Para Asphalt Concrete				
ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,802.41	1,586.36	127	792.54
ผล	1,000.02 (55.48%)	1,000.02 (63.04%)	63	584.60 (73.76%)

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 56 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 63 รายการ และยกเลิก 8 รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

PS : Para Soil Cement				
ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	34.27	28.41	4	105.50
ผล	28.40 (82.89%)	28.40 (99.98%)	4	107.14 (101.55%)

หมายเหตุ

- PA : Para Asphalt Concrete
- PS : Para Soil Cement

