



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E..... ๑๗๐๐๖/๗๗๐/๒๕๖๕

๖๙๗๙

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๗๗๐/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ผง.

จ.๖.๕๖๕

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้พโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันมาด้วยแล้ว



(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ



(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

- ทราบ

- เรียน ผอ.คิว, ผอ.ภค และ ผอ.ท.มอ. (ผอ.ท.มอ., ผอ.ท.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ



(นายนนต์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.



สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 7 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 102,435.58 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 80,345.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.43 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 15,152 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 242 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.60 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 161 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.06 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4,936 รายการ คิดเป็นร้อยละ 32.58 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9,636 รายการ คิดเป็นร้อยละ 63.60 และยกเลิก จำนวน 177 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.16 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 77,100.73 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 60,284.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.19 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,719.28 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 7,123.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.28 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 69,381.45 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 53,161.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.62 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,792 รายการ (รายการ พ.ร.บ. 65 จำนวน 9,554 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 238 รายการ) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 13 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรายการผูกพันใหม่ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4,239 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.29 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5,376 รายการ คิดเป็นร้อยละ 54.90 และยกเลิก จำนวน 164 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.68 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น

หมายเหตุ : กรมได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. 65 จำนวน 77,143.43 ล้านบาท โอนงบประมาณ รายการบุคลากรภาครัฐระหว่างหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 42.14 ล้านบาท และโอนงบประมาณภายใต้ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ สททช. จำนวน 0.56 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 35 (3) ระบุว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว103 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่าง หน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คงเหลืองบประมาณที่กรม ได้รับจำนวน 77,100.73 ล้านบาท

2. งบเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 9,502.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.22 งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 1,129.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 921.93 ล้านบาท งบประมาณเหลือ จ่าย/ยกเลิก 5.01 ล้านบาท และเบิกไม่ทันตามกำหนด 202.13 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 651.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.78 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,068 รายการ (รายการเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 1,067 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 152 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.23 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 911 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.30 และยกเลิก จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.47 เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดิน โดยราษฎรบางรายเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ และเกิดข้อพิพาทเรื่อง มรดก เนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่ดินได้

3. งบกลาง พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 4,605.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,809.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.73 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,188 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.53 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,144 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.30 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 เนื่องจากมีการแก้ไขสถานที่การดำเนินงานจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

4. งบกลาง พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 3,381.88 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,243.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.78 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,078 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ จำนวน 242 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.45 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 89 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.26 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 461 รายการ คิดเป็นร้อยละ 42.76 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 284 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.34 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.19 เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

5. เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 งบประมาณ จำนวน 4,224.83 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,981.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.24 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 384 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 381 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.22 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 904.24 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 704.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.87 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,542 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 59 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.83 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.19 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,480 รายการ คิดเป็นร้อยละ 95.98

7. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 818.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.52 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 100 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ คิดเป็นร้อยละ 39.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 60 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.00 คือ รายการ จัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ระยะที่ 2 เนื่องจากการก่อสร้างจะมีผลกระทบกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

รายละเอียดข้อมูล

1 > สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลิตภัณฑ์/โครงการ

2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

3 > งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

5 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564




รายละเอียดงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)				หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	102,435.58	80,345.19	78.43	15,152	242	161	4,936	9,636	ยกเลิก 177 รายการ
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (งบปฏิบัติการ)	77,100.73	60,284.68	78.19	9,792		13	4,239	5,376	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,719.28	7,123.20	92.28						
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	69,381.45	53,161.48	76.62	9,792		13	4,239	5,376	ยกเลิก 164 รายการ
2. งบเงินกู้ใช้เงินเหลือปี พ.ศ. 2563	11,283.76	9,502.99	84.22	1,068			152	911	- ยกเลิก 5 รายการ - ตั้งไม่ขยาย/สลาย PO/ยกเลิกเกิน จำนวน 1,129.07 ล้านบาท - คงเหลือต้องดำเนินการคือ จำนวน 651.70 ล้านบาท
3. งบกลาง พ.ศ. 2564	4,605.14	3,809.62	82.73	1,188			42	1,144	
3.1 รายการเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	3,419.87	2,694.11	78.78	1,117			33	1,082	
- โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงรถจักรกลสำหรับบำรุงรักษาป่าไม้ภูเขาทุกปีและงบเลี้ยงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	426.47	183.50	43.03	24			16	8	
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183.31	824.44	69.67	44			15	29	
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดทุกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564	1,562.30	1,534.23	98.20	1,046				1,044	ยกเลิก 2 รายการ
- โครงการปรับปรุงระบบชลประทานด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษางบกลาง	94.70	20.12	21.25	1				1	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำวัด 9 พหลโยธินประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	83.09	74.92	90.17	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	70.00	56.90	81.28	1			1		
3.2 โครงการอื่นที่นอกเหนือจากพระราชดำริ (งบปร.) ประจำปี พ.ศ. 2564	1,185.27	1,115.51	94.11	71			9	62	
4. งบกลาง พ.ศ. 2565	3,381.88	1,243.85	36.78	1,078	242	89	461	284	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565	1,126.19	796.67	70.74	620			335	283	ยกเลิก 2 รายการ
- จัดหาถักปั้นจั่นอย่าง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกทับไปตามกฎหมาย	97.92	97.92	100.00	1				1	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกำกับพื้นที่ฤดูแล้ง ปี 2565/2566	1,137.66			407	239	89	79		
- โครงการสนับสนุนงบประมาณจากพระราชดำริ (งบปร.) ประจำปี 2565	1,020.11	349.26	34.24	50	3		47		
5. เงินกู้ ประจำปี พ.ศ. 2564	4,224.83	3,981.63	94.24	384				381	ยกเลิก 3 รายการ
6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565	904.24	704.14	77.87	1,542		59	3	1,480	
7. จัดซื้อที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565	935.00	818.28	87.52	100			39	60	ยกเลิก 1 รายการ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 16 กันยายน 2565


งบลงทุน	รวม	งบ พ.ร.บ.	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการ	9,792	70,135.62	67,818.67
		ล้านบาท	ล้านบาท
✓ ก่อหนี้ผูกพัน	9,615	67,913.83	67,263.41
➢ พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง	9,387	67,913.83	64,515.58
➢ โอนเปลี่ยนแปลง	228		2,747.83
✗ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	13	361.89	555.26
➢ พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง	4	361.89	361.89
➢ โอนเปลี่ยนแปลง	9		193.37
CANCEL	164	1,859.90	
ล้าน/กอง ยกเลิก			

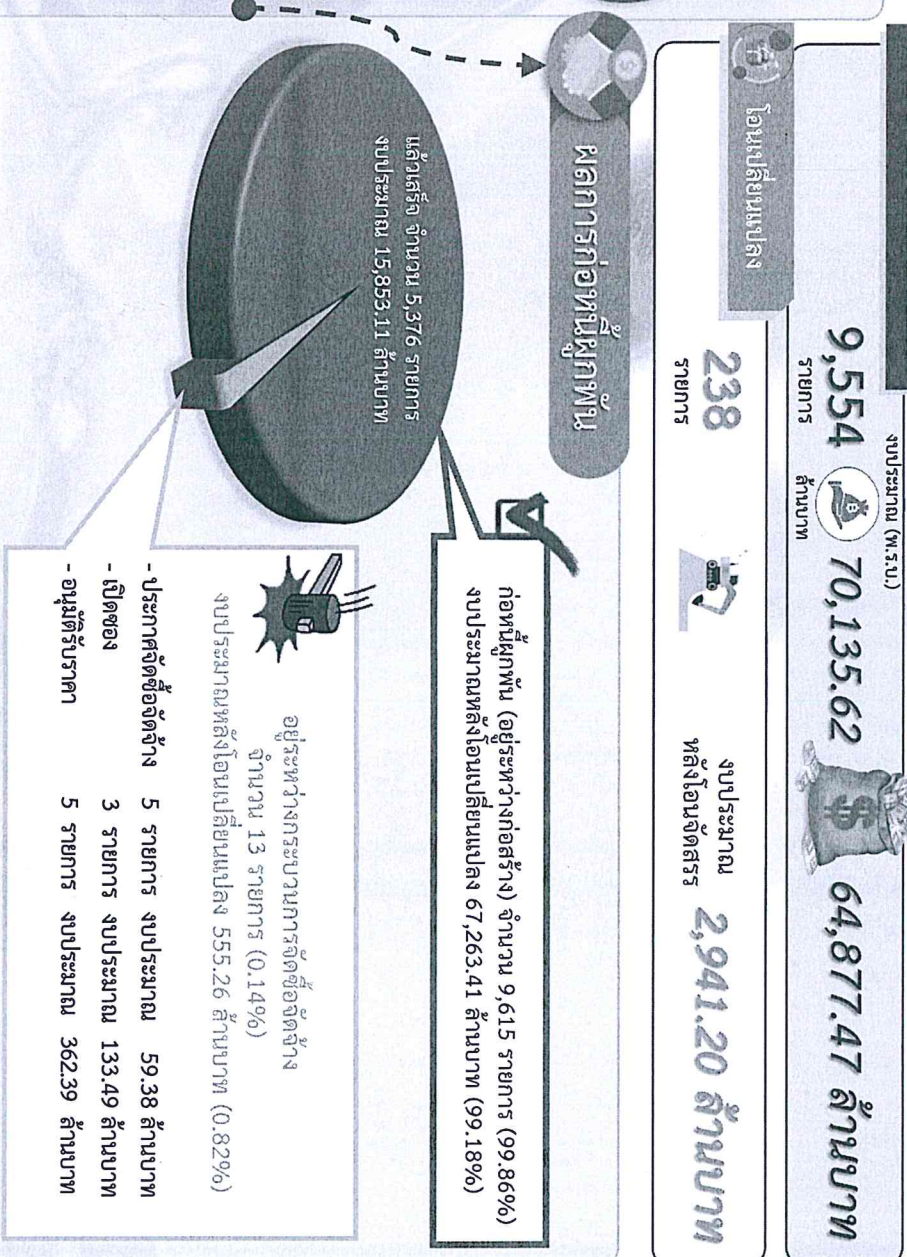

2.2

สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

งบลงทุน

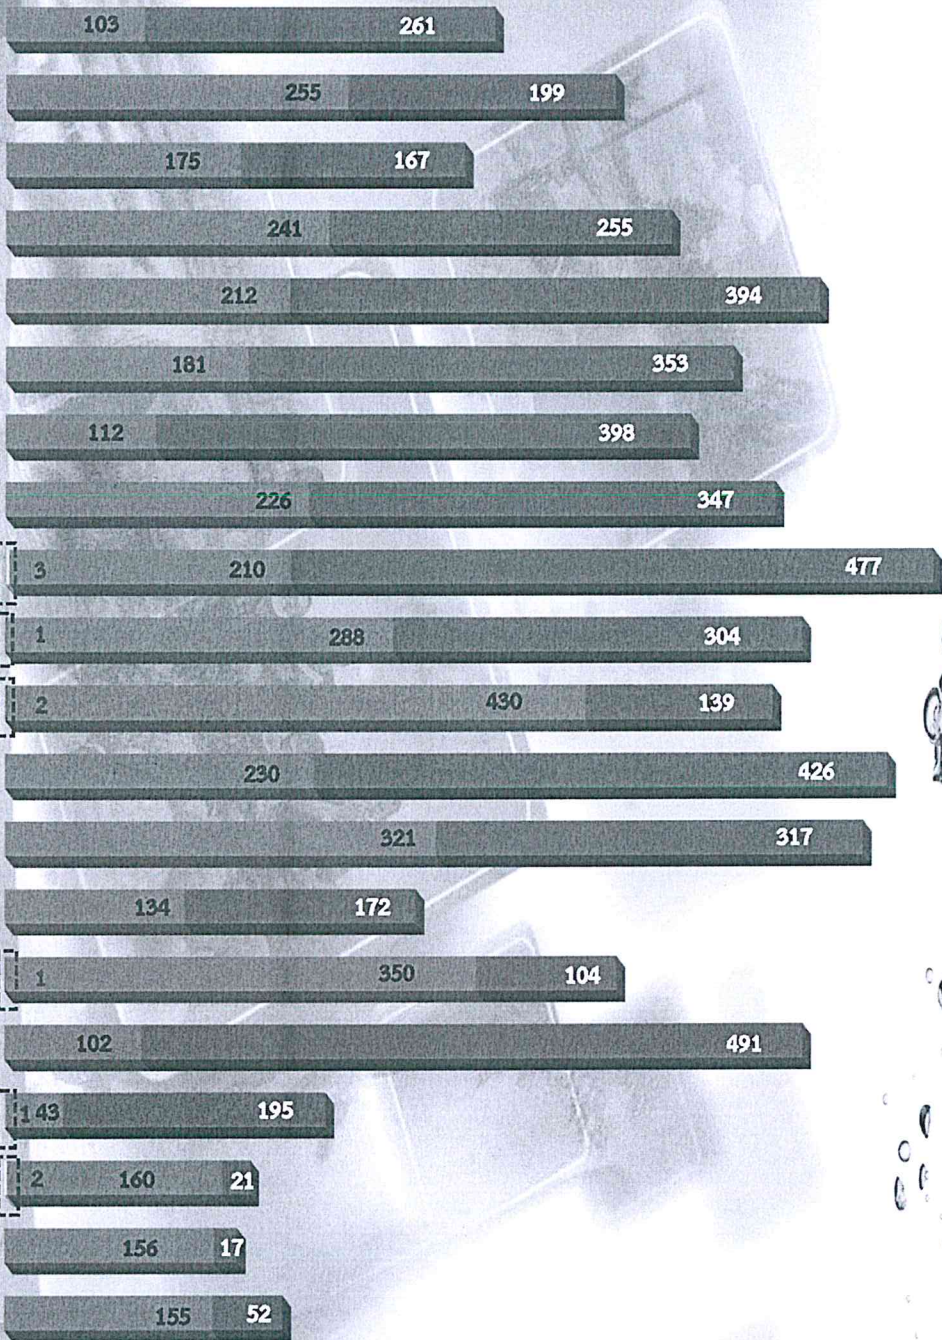

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 13 รายการ

แล้วเสร็จ 5,376 รายการ
 ก่อหนี้ผูกพัน 4,239 รายการ
 อนุมัติงบประมาณ 5 รายการ
 เปิดของ 3 รายการ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ

สช. 1 สช. 2 สช. 3 สช. 4 สช. 5 สช. 6 สช. 7 สช. 8 สช. 9 สช. 10 สช. 11 สช. 12 สช. 13 สช. 14 สช. 15 สช. 16 สช. 17 กวก. สวก. สบอ. สก. สสร. สบ. สอ. สจ. สก. สว. สผ. กผ. กท. สท.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GEMIS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
จากระบบติดตาม Gen Project ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน รายการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		จำนวนรายการ	ทำสัญญาตาม						
						งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวนรายการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
									0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%	
รวม	68,275.72	67,818.67	52,477.36	77.38	9,628	13	555.26	9,615	67,263.41	1,111	236	264	399	2,196	5,409
สพป. 1	1,604.88	1,535.02	1,349.62	87.92	364			364	1,535.02	2	2	1	15	83	261
สพป. 2	1,890.25	1,914.60	1,750.92	91.45	454			454	1,914.60	74	11	10	6	154	199
สพป. 3	2,334.81	1,978.29	1,667.33	84.28	342			342	1,978.29	27	8	16	22	99	170
สพป. 4	1,074.89	1,045.66	981.37	93.85	496			496	1,045.66	103	26	31	18	62	256
สพป. 5	2,640.61	2,859.42	2,479.46	86.71	606			606	2,859.42	18	9	14	17	152	396
สพป. 6	2,646.30	2,829.73	2,298.56	81.23	542			542	2,829.73	14	4	10	14	138	362
สพป. 7	2,349.87	2,365.37	2,274.93	96.18	510			510	2,365.37	4	10	32	14	51	399
สพป. 8	4,016.81	3,935.79	2,829.66	71.90	573			573	3,935.79	42	20	19	26	116	350
สพป. 9	2,437.91	2,462.83	1,799.16	73.05	690	3	89.99	687	2,372.84	10	26	14	28	131	478
สพป. 10	1,336.82	1,304.57	1,008.63	77.32	593	1	1.43	592	1,303.14	78	13	8	23	166	304
สพป. 11	1,506.05	1,532.45	944.94	61.66	571	2	36.27	569	1,496.18	274	11	9	23	113	139
สพป. 12	2,416.48	2,382.54	1,907.99	80.08	656			656	2,382.54	7	10	12	30	169	428
สพป. 13	2,130.01	2,035.79	1,743.39	85.64	638			638	2,035.79	15	13	17	26	247	320
สพป. 14	3,273.65	3,243.27	2,487.39	76.69	306			306	3,243.27	13	14	12	27	66	174
สพป. 15	1,886.21	1,839.43	1,050.70	57.12	455	1	9.86	454	1,829.57	166	18	12	22	126	110
สพป. 16	3,057.93	2,984.46	2,042.25	68.43	593			593	2,984.46	7	3	11	18	62	492
สพป. 17	682.65	763.27	608.60	79.74	239	1	44.00	238	719.27	2	1	2	3	29	201
กวก.	12,113.82	12,020.44	9,635.39	80.16	183	2	275.15	181	11,745.29	84	5	5	23	43	21
สพญ.	11,973.87	11,666.33	7,614.10	65.27	173			173	11,666.33	73	16	19	19	29	17
สทบ.	695.81	693.73	343.49	49.51	207			207	693.73	10	11	1	18	114	53
สศก.	742.05	731.63	687.03	93.90	211			211	731.63	3	3	5	2	12	186
สศอ.	531.51	562.50	503.92	89.59	64			64	562.50	24			1	8	31
สบก.	549.48	584.59	375.06	64.16	38			38	584.59	38					
สส.	376.65	396.48	286.02	72.14	12	1	40.00	11	356.48	4	2	1	1	1	2
สจ.	138.22	151.70	144.17	95.04	40			40	151.70	11		2		10	28
สจก.	82.68	104.67	9.20	8.79	14	2	58.57	12	46.10	11					1
สจพ.	4.71	4.55	4.55	100.00	3			3	4.55	3					
สผ.	3,531.76	3,631.59	3,529.16	97.18	48			48	3,631.59	1		1	3	15	29
ผก.		0.14	0.14	99.29	2			2	0.14	1					1
พท.		8.50			1			1	8.50	1					
สพ.		0.42	0.42	100.00	1			1	0.42						
Lump Sum	249.00	248.92	119.81	48.13	3			3	248.92	3					1

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 164 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,859.90 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ให้จ้างงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น จ้างเหมา เงินเพื่อจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น

2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 238 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,941.20 ล้านบาท



2.4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Gen Project ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบที่โอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน รายการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		จำนวน รายการ	งบที่โอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	ทำสัญญาก่อน					
						จำนวน รายการ	งบที่โอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)			อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
										0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,275.72	67,818.67	52,477.36	77.38	9,628	13	555.26	9,615	67,263.41	1,111	236	264	399	2,196	5,409
โครงการเขื่อนทดน้ำจาก จังหวัดอุตรดิตถ์	809.00	648.05	561.46	86.64	10			10	648.05	2		5	1	2	
โครงการคลองระบายน้ำห้วยหลวงบางบาล - บางไพร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,561.63	2,826.61	1,844.44	65.25	14			14	2,826.61	5	4	1	1	1	2
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	27,292.17	27,136.67	21,790.38	80.30	668	4	267.05	664	26,869.62	160	29	33	46	230	166
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	419.96	332.68	320.95	96.47	8			8	332.68	7					1
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	505.89	728.98	293.77	40.30	12			12	728.98	6	2	4			
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่2) จังหวัดสงขลา	141.06	141.06			1			1	141.06					1	
โครงการประมงระบบน้ำบ้านกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสตูล	99.56	84.83	83.82	98.81	4			4	84.83	1				2	1
โครงการประมงระบบน้ำลำทุ่ง-น้ำกุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสตูล	312.00	293.01	155.90	53.21	5			5	293.01	3				2	
โครงการประมงระบบน้ำที่คลองบ้านกุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสตูล	72.00	93.72	64.79	69.13	4			4	93.72		1	2			1
โครงการปรับปรุงคลองยม - ป่าน จังหวัดสุโขทัย	275.66	93.71	29.73	31.73	6			6	93.71	3			1	1	
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,308.96	6,469.56	4,670.68	72.19	394	1	9.86	393	6,459.70	55	20	15	38	121	144
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจากน้ำ	10,895.81	10,816.31	7,560.73	69.90	315	4	217.87	311	10,598.44	59	17	21	41	108	65
โครงการพัฒนาชุมชนน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	1,033.27	1,061.23	479.59	45.19	14			14	1,061.23	9			1	4	
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่	1,286.49	897.29	793.62	88.45	11			11	897.29	4	2	1	2	1	1
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่	2,193.40	2,171.19	1,758.42	80.99	759			759	2,171.19	76	11	11	12	146	503
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,506.83	10,409.75	9,229.19	88.66	6,789	1	0.49	6,788	10,409.25	640	131	149	220	1,473	4,175
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์	167.77	130.11	62.18	47.79	5			5	130.11	2	1		1	1	
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโหล จังหวัดระยอง	108.00	107.99	106.14	98.29	2			2	107.99	1					1
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโหล จังหวัดระยอง	104.14	121.18	92.52	76.35	6			6	121.18	5			1		
โครงการอ่างเก็บน้ำบ่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	348.02	348.02	80.56	23.15	7			7	348.02	2	1		3	1	
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำอ้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	637.62	637.62	629.56	98.74	5			5	637.62	2		1		1	1
โครงการอ่างเก็บน้ำลำละฮะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	388.00	383.54	321.12	83.73	3			3	383.54	3					
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	525.00	402.96	382.96	95.04	3			3	402.96			1		1	1
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย	313.78	477.36	473.32	99.15	7			7	477.36	1				2	4
ผลผลิตจากการจัดการงานชลประทาน	969.71	1,005.26	691.53	68.79	576	3	60.00	573	945.26	65	17	18	30	100	343

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 164 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,859.90 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น จังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น
2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 238 รายการ งบประมาณเหลือโอนเปลี่ยนแปลง 2,941.20 ล้านบาท




2.5

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมชลประทาน

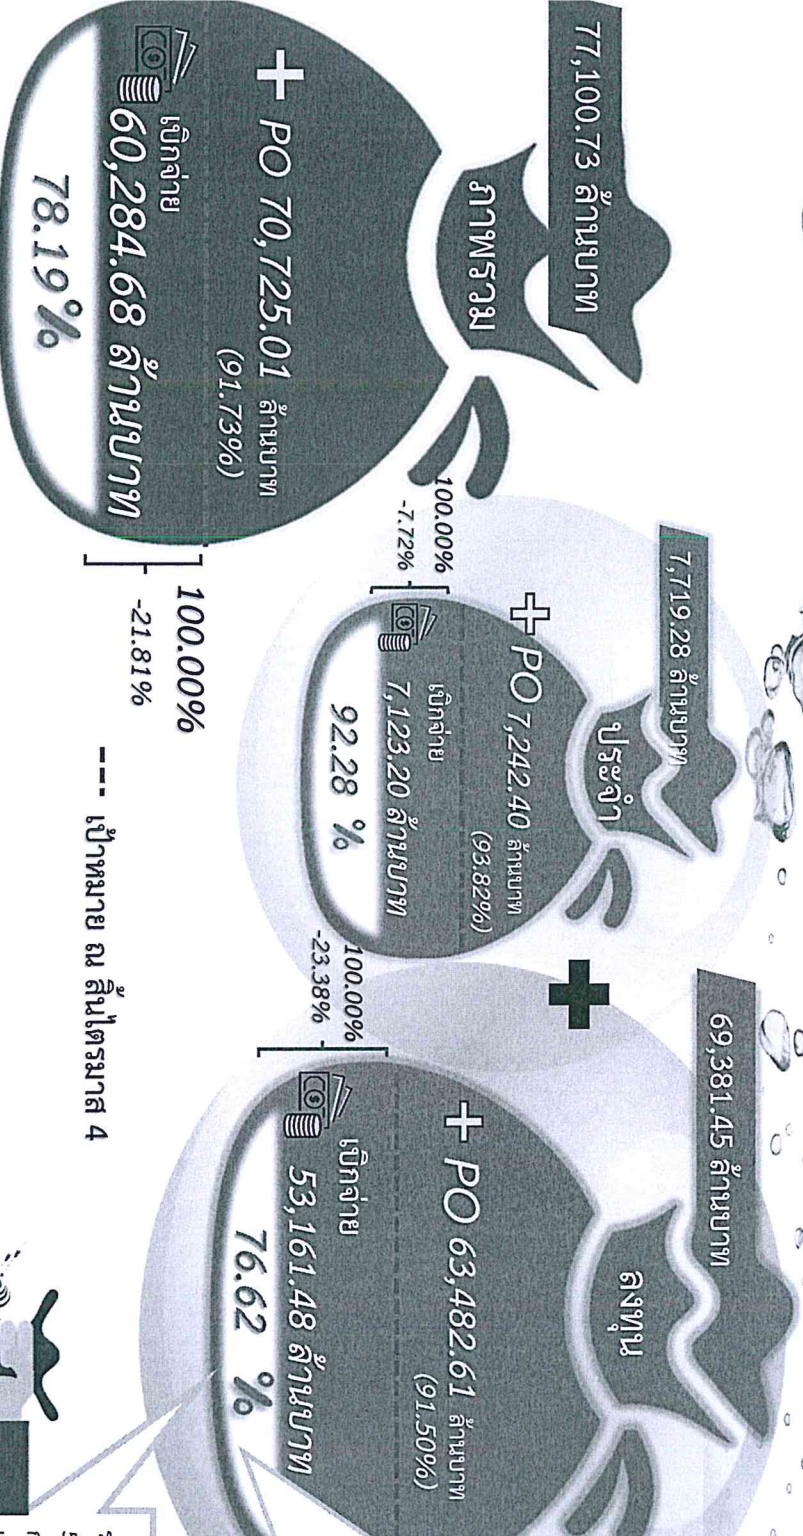


รายการผู้พ้นข้ามปีงบประมาณ

- ผู้พ้นเดิม จำนวนทั้งสิ้น 108 รายการ จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 10,773.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,929.66 ล้านบาท (73.60%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 88 รายการ (81.48%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 8,162.17 ล้านบาท (75.76%) แล้วเสร็จ จำนวน 20 รายการ (18.52%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 2,611.70 ล้านบาท (24.24%)

- ผู้พ้นใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 2,178.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 630.30 ล้านบาท (28.94%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ (84.00%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 1,816.18 ล้านบาท (83.38%) และอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ (16.00%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 361.89 ล้านบาท (16.62%)

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 9,495 รายการ จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 56,429.51 ล้านบาท เบิกจ่าย 44,601.52 ล้านบาท (79.04%) โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 รายการ (0.09%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 193.37 ล้านบาท (0.34%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 4,130 รายการ (43.50%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 41,431.93 ล้านบาท (73.42%) และแล้วเสร็จ จำนวน 5,356 รายการ (56.41%) จบทัดโอนเปลี่ยนแปลง 14,804.21 ล้านบาท (26.24%)




กองแผนงาน

2.6


สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง วันที่ 16 กันยายน 2565

77,100.73 ล้านบาท
ภาพรวม
เบิกจ่าย
60,284.68 ล้านบาท
78.19%

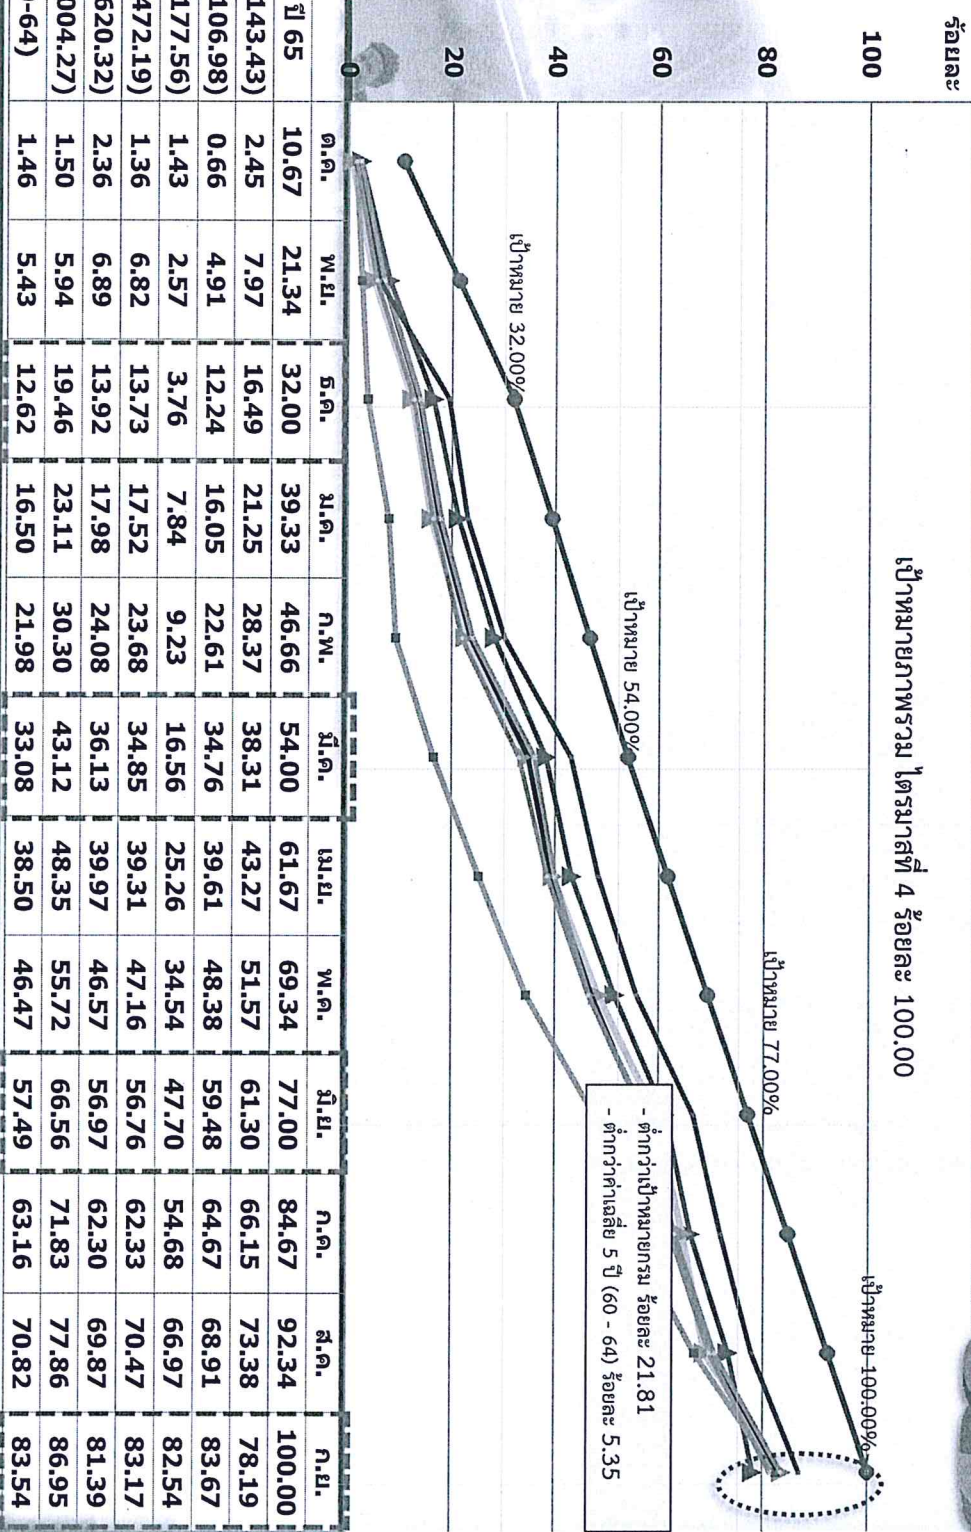

2.7

สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

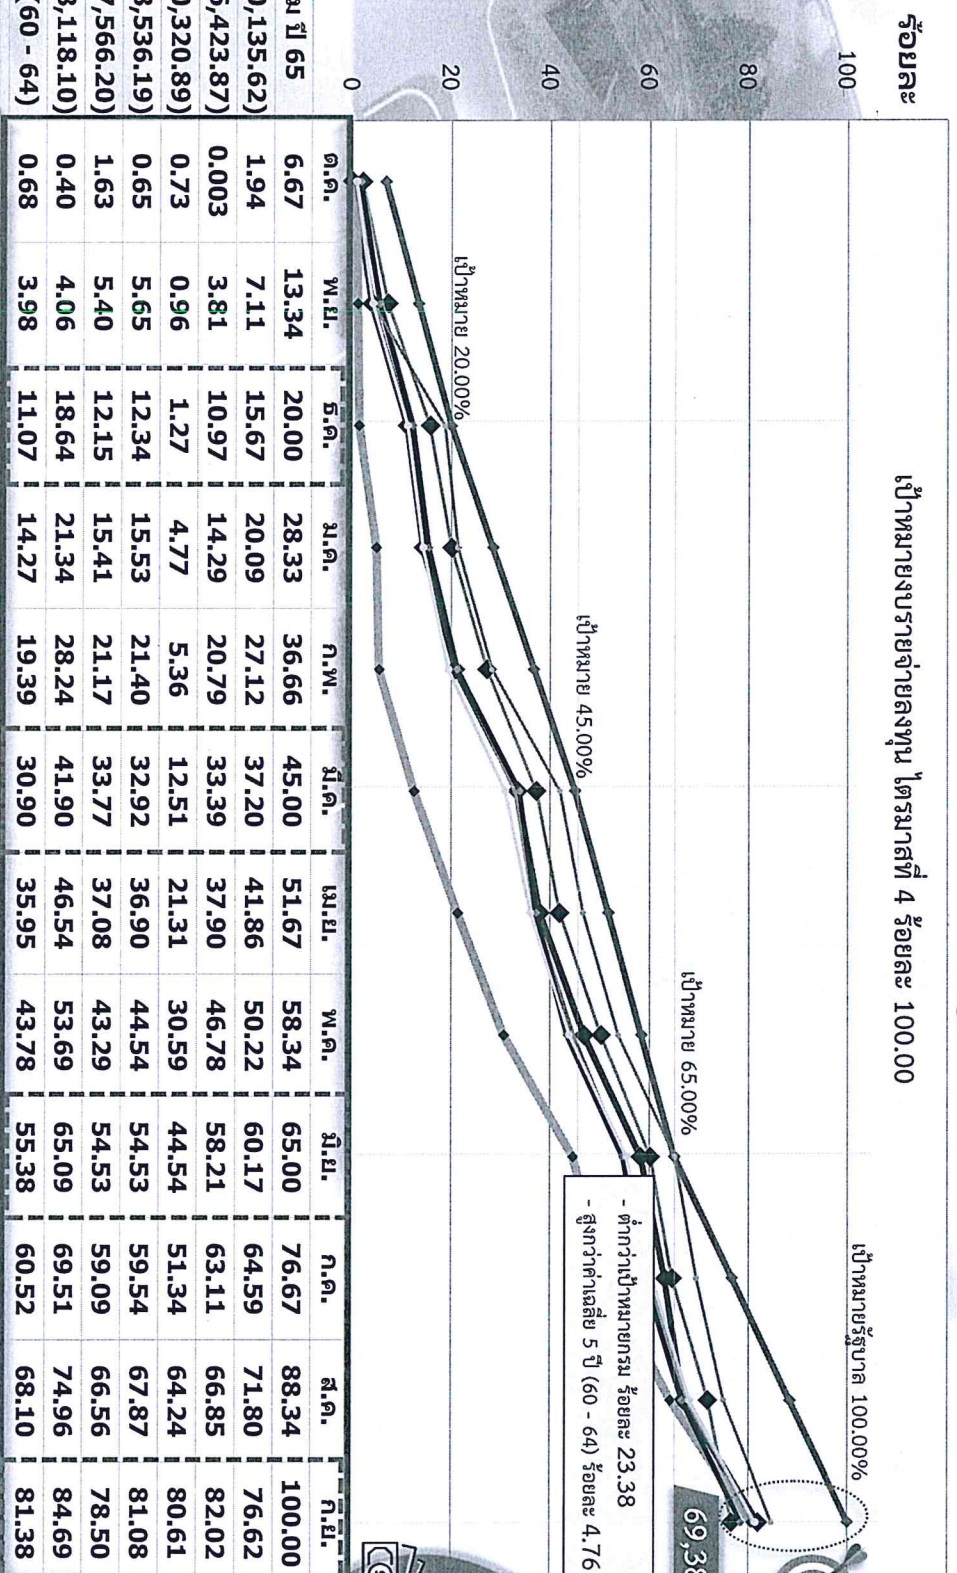


เบิกจ่าย
53,161.48 ล้านบาท
76.62%

ลงทุน

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

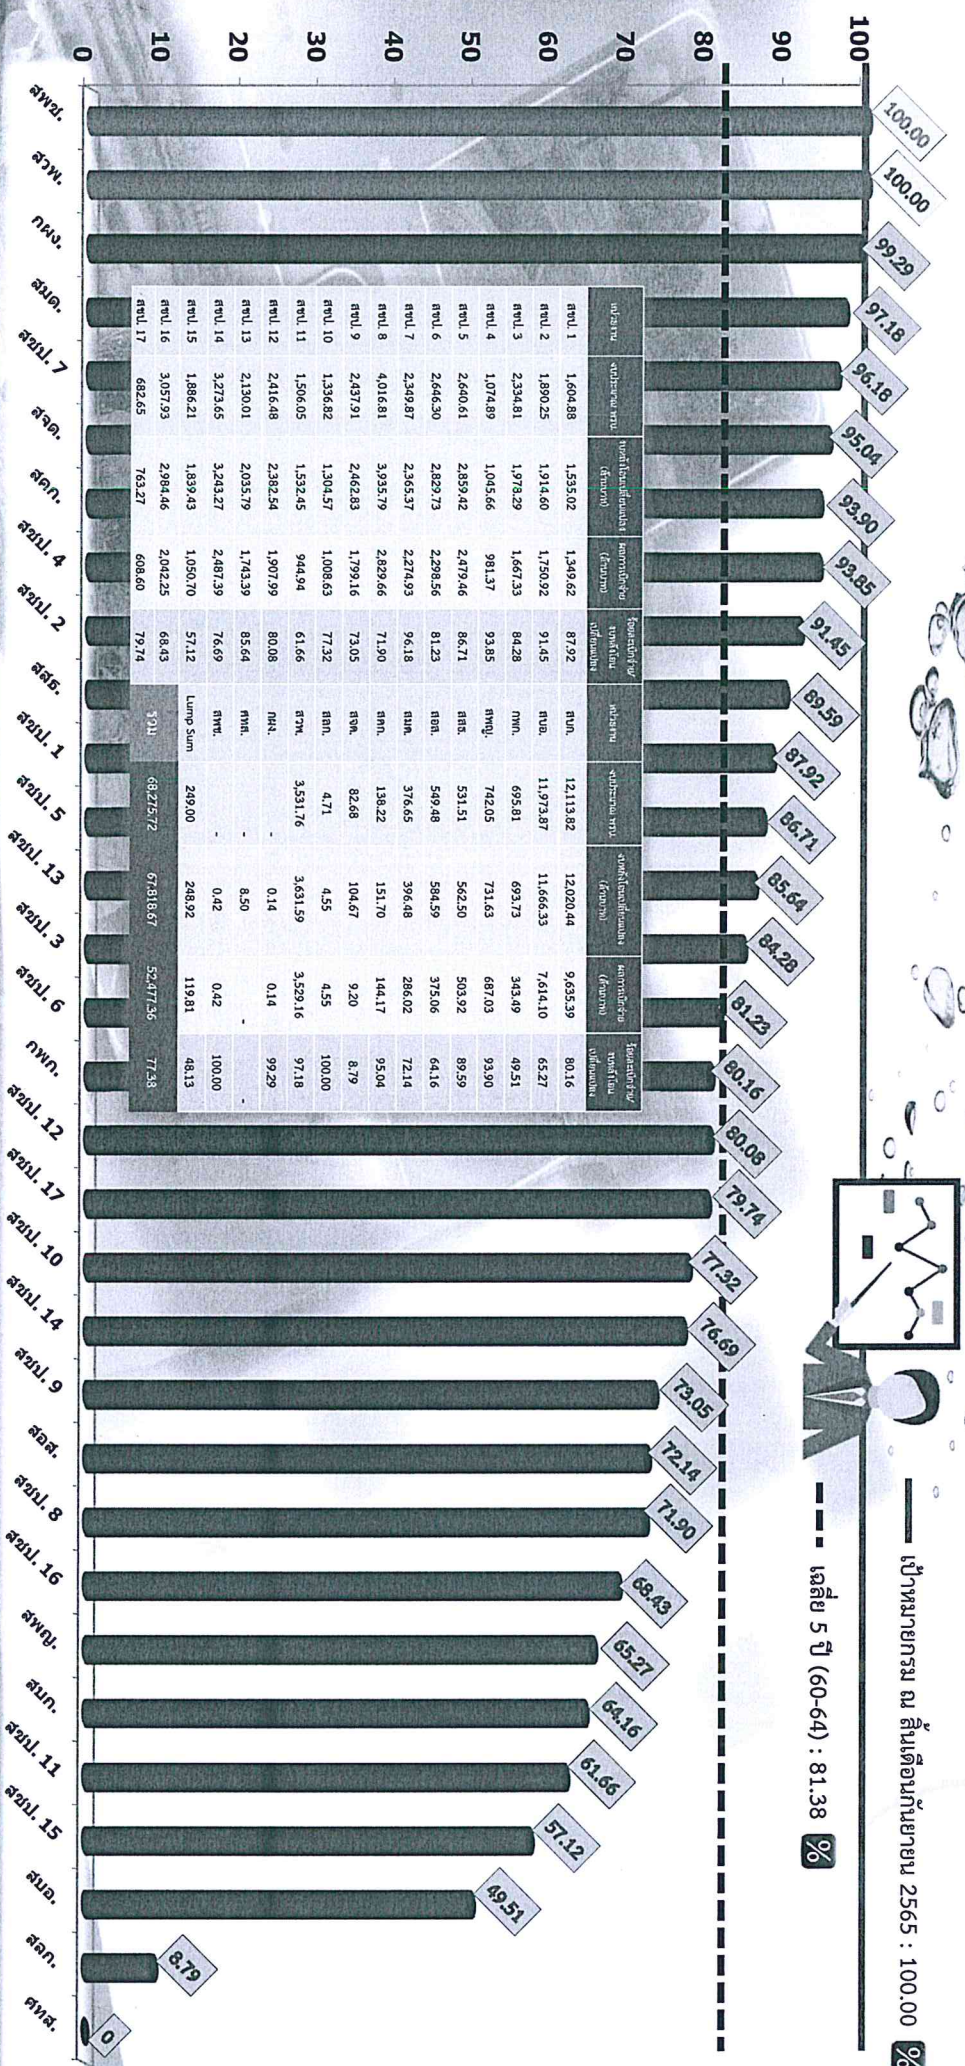

2.9

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)							
1	กระทรวงคมนาคม	160,813.31	131,143.66	81.55	177,093.92	132,863.53	75.02	6.53
2	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	74,705.70	56,843.61	76.09	72,132.42	54,956.57	76.19	-0.10
3	กระทรวงมหาดไทย	75,998.68	40,714.21	53.57	80,116.03	42,957.79	53.62	-0.05
	ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมพัฒนาที่ดิน	1,861.87	1,688.70	90.70	2,138.98	1,954.94	91.40	-0.70
2	กรมชลประทาน	69,381.46	53,161.48	76.62	65,995.03	50,328.58	76.26	0.36
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,272.68	484.10	38.04	1,165.83	673.86	57.80	-19.76
	ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)							
1	กรมทางหลวงชนบท	44,163.20	37,295.51	84.45	47,087.78	37,205.64	79.01	5.44
2	กรมทางหลวง	107,485.25	88,512.77	82.35	119,926.55	90,935.60	75.83	6.52
3	กรมชลประทาน	69,381.46	53,161.48	76.62	65,995.03	50,328.58	76.26	0.36
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	29,841.10	12,707.67	42.58	27,502.77	15,286.08	55.58	-13.00

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

2. ค่าเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 69.56%

3. ค่าเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (45 หน่วยงาน) เฉลี่ย 69.49%

၂၄၆၂၆၂၆

งบประมาณเงินกู้จากต่างประเทศปี พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

สถานการณ์ด้านงาน

รวมทั้งสิ้น 1,068 รายการ

(เงินกู้ 1,067 รายการ โอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ)

จัดการแล้วเสร็จ

911 รายการ

ระหว่างก่อสร้าง

152 ฐานการ

ສູ່ກຳລັງຢຸດການ

5. การจัดการ

หมายเหตุ: รายการโอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ
คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

ផលការវិបាកជាយ

9,502.99 ล้านบาท 84.22 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

921.93 ล้านบาท 8.17%

แหล่งจำหน่าย/ยกเลิก

5.01 ล้านบาท 0.04%

เบิกจ่ายไม่ทัน แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ

202.13 ล้านบาท 1.79 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

651.70 ล้านบาท

5.78%

ปัทมาสาร/อภิศรตภาว

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

အမေရိကန်တို့ကလွှဲစား၍ ငွေကြေးကို ချော့ချစားခဲ့သည်။ ၁၈၉၆

640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95	11,283.76
640.56	1,356.97	1,077.98	839.80	1,330.56	866.19	879.60	463.75	671.17	304.54	646.63	425.24	9,502.99
-	-428.49	-1,221.49	-746.44	-3.28	-580.67	351.53	139.47	327.54	217.24	528.54	-364.71	

Пашкину

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

សេរីកម្រៃ
100%



เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



UP ภาพรวมโครงการเงินกู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเบิกจ่ายงบประมาณ 4,224.83 ล้านบาท

เบิกจ่าย 3,981.63 ล้านบาท 94.24%

เหลือจ่าย 243.20 ล้านบาท 5.76%

สถานะการดำเนินงานทั้งสิ้น 384 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 381 รายการ ผลสัมฤทธิ์ตามแผน
หมายเหตุ : ยกเลิก 3 รายการ ตามมติ คม. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ตัวชี้วัดของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ :

- ซ่อมแซม/ปรับปรุง 207 รายการ - ฝ่าย 21 รายการ
- อาคารบังคับน้ำ 12 รายการ - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 10 รายการ
- ระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรกรรม 30 รายการ
- ชุดลอก 61 รายการ
- แก้มลิง 40 รายการ
- อื่น ๆ เช่น ประตูระบายน้ำ ท่อหน้าดิน 3 รายการ

ผลลัพธ์ของโครงการ :

พ.ร.บ. 19,667 ไร่
= 19,667 ไร่ 100%
พ.ร.บ. 200,653 ไร่
= 208,783 ไร่ 99.59%
พ.ร.บ. 26,98 ล้าน ลบ.ม.
= 26,98 ล้าน ลบ.ม. 100%
พ.ร.บ. 64,952 ครัวเรือน
= 64,552 ครัวเรือน 99.38%
พ.ร.บ. 9,716 คน
= 10,076 คน 103.71%

ภาพรวมงาน



จำแนกตามโครงการย่อย 2 โครงการ มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน

การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ 4,069.05 ล้านบาท

เบิกจ่าย 3,827.13 ล้านบาท 94.05%

เหลือจ่าย 241.92 ล้านบาท 5.95%

สถานะการดำเนินงาน จำนวน 354 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 351 รายการ
ผลสัมฤทธิ์ตามแผน

- ยกเลิก 3 รายการ

ตัวชี้วัดของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ :

ซ่อมแซม/ปรับปรุง 207 รายการ (ยกเลิก 3 รายการ)

- ฝ่าย 21 รายการ

-อาคารบังคับน้ำ 12 รายการ

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 10 รายการ

-ชุดลอก 61 รายการ

-แก้มลิง 40 รายการ

-อื่น ๆ เช่น ประตูระบายน้ำ ท่อหน้าดิน 3 รายการ

ผลลัพธ์ของโครงการ :

พ.ร.บ. 19,667 ไร่
= 19,667 ไร่ 100%

พ.ร.บ. 200,653 ไร่
= 195,552 ไร่ 99.56%

พ.ร.บ. 26,98 ล้าน ลบ.ม.
= 26,98 ล้าน ลบ.ม. 100%

พ.ร.บ. 64,952 ครัวเรือน
= 63,014 ครัวเรือน 99.37%

พ.ร.บ. 9,716 คน
= 9,234 คน 104.06%

2. โครงการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงเกษตรกรรม

การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบ 155.78 ล้านบาท

เบิกจ่าย 154.50 ล้านบาท 99.18%

เหลือจ่าย 1.28 ล้านบาท 0.82%

สถานะการดำเนินงาน จำนวน 30 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 รายการ
ผลสัมฤทธิ์ตามแผน

ตัวชี้วัดของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ :


ระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรกรรม 30 รายการ

ผลลัพธ์ของโครงการ :

พ.ร.บ. 13,231 ไร่
= 13,231 ไร่ 100%

พ.ร.บ. 1,538 ครัวเรือน
= 1,538 ครัวเรือน 100%

พ.ร.บ. 842 คน
= 842 คน 100%



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



การดำเนินงาน

มีมติ ค.ร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี 64
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ
งบประมาณ 4,605.14 ล้านบาท
เบิก 3,809.62 ล้านบาท 82.73 %

ผลการดำเนินงาน

ตรวจสอบครุภัณฑ์
31 รายการ 2.61 %
แล้วเสร็จ
1,144 รายการ 96.29 %
ยกเลิก
2 รายการ 0.17 %

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ลดภาระงาน 900 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 900 ไร่ 100 %
พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 918,485 ไร่ 92.56 %
ปริมาณน้ำ 16,74 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = 13,57 ล้าน ลบ.ม. 81.06 %
ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 918,485 ครัวเรือน 91.51 %

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

มติ ครม.
8 มิ.ย. 64
ครุภัณฑ์

มติ ครม.
15 มิ.ย. 64

มติ ครม.
14 ก.ย. 64

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย. 64

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย. 64

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย. 64

กปร.
พ. 2564

24 รายการ

44 รายการ

1,046 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

71 รายการ

426.47 ล้านบาท
เบิกจ่าย 183.50 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 43.03

1,183.31 ล้านบาท
เบิกจ่าย 824.44 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 69.67

1,562.30 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1,534.23 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 98.20

94.70 ล้านบาท
เบิกจ่าย 20.12 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 21.25

83.09 ล้านบาท
เบิกจ่าย 74.92 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 90.17

70.00 ล้านบาท
เบิกจ่าย 56.90 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 81.28

1,185.27 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1,115.51 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 94.11

อยู่ระหว่างตรวจรับครุภัณฑ์
16 รายการ
แล้วเสร็จ 8 รายการ
75.00 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง/ตรวจรับ
ครุภัณฑ์ 15 รายการ
แล้วเสร็จ 29 รายการ
63.25 %

แล้วเสร็จ 1,044 รายการ
ยกเลิก 2 รายการ
98.70 %

อยู่ระหว่างเปิดใช้งานประมาณ
แล้วเสร็จ
100 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
95.00 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
95.00 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 62 รายการ
89.90 %

ให้สำนักงานจัดสรรงบประมาณฯ สม.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

ให้สำนักงานจัดสรรงบประมาณฯ สม.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

ให้สำนักงานจัดสรรงบประมาณฯ สม.เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64

ให้สำนักงานจัดสรรงบประมาณฯ สม.เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64

ให้สำนักงานจัดสรรงบประมาณฯ สม.เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64

ให้สำนักงานจัดสรรงบประมาณฯ สม.เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64

ให้สำนักงานจัดสรรงบประมาณฯ สม.เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ
เคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมป้องกันและบรรเทาภัยในต่าง
ฤดูในปี 2564

พื้นที่ลดภาระงาน 900 ไร่ / 900 ไร่
ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม. / 12.31 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ / 36,291 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน / 12,13 ครัวเรือน

ปริมาณน้ำ 1.26 ล้าน ลบ.ม. / 1.26 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่ / 826,174 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 123,399 ครัวเรือน / 123,376 ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่ / 56,020 ไร่
ปริมาณน้ำ 1,088 ครัวเรือน / 1,088 ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่ / ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน / ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่ / ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน / ครัวเรือน

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน
จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการจัดซื้อรถเก็บเครื่องจักรกล
สำหรับรองรับการแก้ไขปัญหายากภัย
และภัยแล้ง

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหายากภัย
ปี 2563/2564

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันภัยแล้งจากภัย
และปัญหายากภัย ปี 2564

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า 4 สถานี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและ
ระบบน้ำ กอปรกับแหล่งน้ำเดิมในเขต 3
และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคาร
ประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ำท้ายแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) ประจำปี 2564

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



การดำเนินงาน

มีมติ ค.ร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรีถึงบกลาง 65
รวม 4 ครั้ง จำนวน 1,078 รายการ

งบประมาณ 3,381.88 ล้านบาท
เบิก 1,243.85 ล้านบาท 36.78 %

ผลการดำเนินงาน

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 242 รายการ 22.45 %
จัดซื้อ-จัดจ้าง 89 รายการ 8.26 %
ดำเนินการก่อสร้าง 461 รายการ 42.76 %
แล้วเสร็จ 284 รายการ 26.34 %
ยกเลิก 2 รายการ 0.19 %

ตัวชี้วัดของโครงการ

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 2,246,310 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 283,791 ไร่ 12.63 %
ครัวเรือน 199,268 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 37,892 ครัวเรือน 19.02 %



ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

มติ ครม.
29 มี.ค.
65

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
4 ต.ค.
65

มติ ครม.
8 ต.ค.
65

กปร.
ปี 2565

620 รายการ
1,126.19 ล้านบาท

เบิกจ่าย 796.67 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 70.74

■ แล้วยเสร็จ 283 รายการ
■ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 335 รายการ
■ ยกเลิก 2 รายการ

70.05 %

1 รายการ
97.92 ล้านบาท

เบิกจ่าย 97.92 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100

■ แล้วยเสร็จ

100 %

407 รายการ
1,137.66 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

■ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 239 รายการ
■ จัดซื้อ-จัดจ้าง 89 รายการ
■ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 79 รายการ

10.00 %

50 รายการ
1,020.11 ล้านบาท

เบิกจ่าย 349.26 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 34.24

■ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ
■ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 47 รายการ

26.81 %


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วม ปี 2565

■ ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม. / ล้าน ลบ.ม.
■ พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่ / 283,791 ไร่
■ ครัวเรือนรับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน / 37,892 ครัวเรือน

จัดการน้ำในลุ่มน้ำโขง ขนาด 50 ตัน (All Tons) Camo) หลากหลายประเภทที่ถูกนำไปใช้ในทุกภาค

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในลุ่มน้ำโขง ปี 2565 และภารกิจเก็บน้ำเพื่ออุปโภค

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ประจำปี 2565




ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 16 กันยายน 2565)

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร

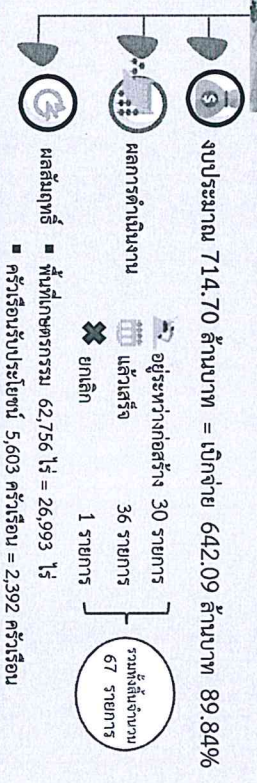

งานกองทุน จัดรูปที่ดิน



ภาพรวม

งบประมาณ 935.00 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 818.28 ล้านบาท
87.52 %

ผลการดำเนินงาน : 100 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 39 รายการ
แล้วเสร็จ 60 รายการ
ยกเลิก 1 รายการ

งบประมาณ 935.00 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 818.28 ล้านบาท
87.52 %

ผลสัมฤทธิ์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
พื้นที่เกษตรกรรม 62,756 ไร่ = 26,993 ไร่
ครึ่งไร่รับประโยชน์ 5,603 ครึ่งไร่ = 2,392 ครึ่งไร่

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ 904.24 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 704.14 ล้านบาท
77.87 %

ผลการดำเนินงาน : 1,542 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 59 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 รายการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,480 รายการ

[illegible]
