



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๕๔๗/ ๒๕๖๕ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผอ.ผง.

929884

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแห่ง
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่
แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

2/11/20

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธ)

ដតប.ដទ.

เรียน อรช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ



(นายวิทยา แก้วมี)

ដង្កូវ

အ. ၁၂. ၁၃၁၃

→ 457M

6-8 н. во. жм., во в. ма., тн. 9-8 н.

1177 N.H.N.

เจ้าพระยาสุรสีห์

21. 5. 56

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณจำนวน 5 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 96,462.73 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 11,365.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.78 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 13,271 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 829 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.25 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2,320 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.48 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 9,093 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.52 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 940 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.08 และยกเลิก จำนวน 89 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.67 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 77,494.49 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 7,400.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.55 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 6,859.07 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,078.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.72 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 70,635.42 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 6,322.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.95 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 10,065 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.16 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2,099 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.85 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7,865 รายการ คิดเป็นร้อยละ 78.14 และยกเลิก จำนวน 85 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.85 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้น

2. งบเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 12,009.82 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 2,015.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.78 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 9,994.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.22 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,015 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 755 รายการ คิดเป็นร้อยละ 74.38 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 258 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.42 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.20 คือ ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

3. งบกลาง พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 4,896.45 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,923.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.29 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,087 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.55 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 397 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.53 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 682 รายการ คิดเป็นร้อยละ 62.74 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.18 คือ ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำบ้านหนองขาม โครงการชลประทานสุพรรณบุรี และซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำบ้านจิกรากฆ่า โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เนื่องจากเมื่อตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายพบว่ามูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 1,026.97 ล้านบาท มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,012 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 807 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.74 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 205 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.26

5. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 1,035.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 25.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.50 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 92 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.52 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.87 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 76 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.61



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดทำโดย
ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565



รายละเอียดข้อมูล

1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ.)

- 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง
- 2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง
- 2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
- 2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566
- 2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566
- 2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่มือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566


3 งบประมาณเงินกันไว้เบิกเลื่อนปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	96,462.73	11,365.52	11.78	13,271	829	2,320	9,093	940	ยกเลิก 89 รายการ
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (กรมบัญชีกลาง)	77,494.49	7,400.32	9.55	10,065	16	2,099	7,865		
1.1 งบรายจ่ายประจำ	6,859.07	1,078.32	15.72						
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	70,635.42	6,322.00	8.95	10,065	16	2,099	7,865		ยกเลิก 85 รายการ
2. งบเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2563	12,009.82	2,015.55	16.78	1,015			755	258	ยกเลิก 2 รายการ
3. งบกลาง พ.ศ. 2565	4,896.45	1,923.78	39.29	1,087		6	397	682	
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	3,872.34	1,424.55	36.79	1,036		6	362	666	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565	1,126.19	1,029.77	91.44	620			28	590	ยกเลิก 2 รายการ
- จัดหารถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกปรับไปตามกฎหมาย	97.92	97.92	100.00	1				1	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566	1,137.66	286.71	25.20	407			332	75	
- โครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาคูทกภัยและภัยแล้ง	663.88			3		3			
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพิ่มเติม	190.14	10.15	5.34	4		2	2		
- โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง	656.55			1		1			
3.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565	1,024.11	499.23	48.75	51			35	16	
4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565	1,026.97			1,012	807	205			
5. จัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565	1,035.00	25.87	2.50	92	6	10	76		



2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



10,065 รายการ



70,688.06 ล้านบาท

✗ 0.16%
16

✗ 20.85%
2,099

✓ 78.14%
7,865

✗ 0.85%
85

179.89


15,324.03

54,747.09

437.05

ผลการก่อหนี้ผูกพัน

ข้อมูลจาก ระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565



อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 2,099 รายการ (21.03%)

งบประมาณ 15,324.03 ล้านบาท (21.81%)

- อนุมัติแผน 1,075 รายการ งบประมาณ 5,556.92 ล้านบาท
- ประกาศ TOR 10 รายการ งบประมาณ 245.47 ล้านบาท
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 168 รายการ งบประมาณ 4,207.91 ล้านบาท
- เปิดซอง 77 รายการ งบประมาณ 2,060.76 ล้านบาท
- อนุมัติรับราคา 769 รายการ งบประมาณ 3,252.97 ล้านบาท

✓ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7,865 รายการ (78.81%)
งบประมาณ 54,747.09 ล้านบาท (77.93%)

✗ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 16 รายการ (0.16%)
งบประมาณ 179.89 ล้านบาท (0.26%)

✗ ยังไม่ดำเนินการ

✓ ก่อหนี้ผูกพัน

✗ อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

✗ ยกเลิก

เป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐ

ภาพรวม
32%

36%

20%

54%

57%

45%

77%

80%

65%

100%

100%

100%

รายจ่ายประจำ
รายจ่ายลงทุน

ต.ค.65

พ.ย.65

ธ.ค.65

ม.ค.66

ก.พ.66

มี.ค.66

เม.ย.66

พ.ค.66

มิ.ย.66

ก.ค.66

ส.ค.66

ก.ย.66

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

2.2

สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

- ส่วนกลาง



ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 65

ภาพรวม

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการภายในวันที่ 14 ต.ค. 2565

7,864

78.82%

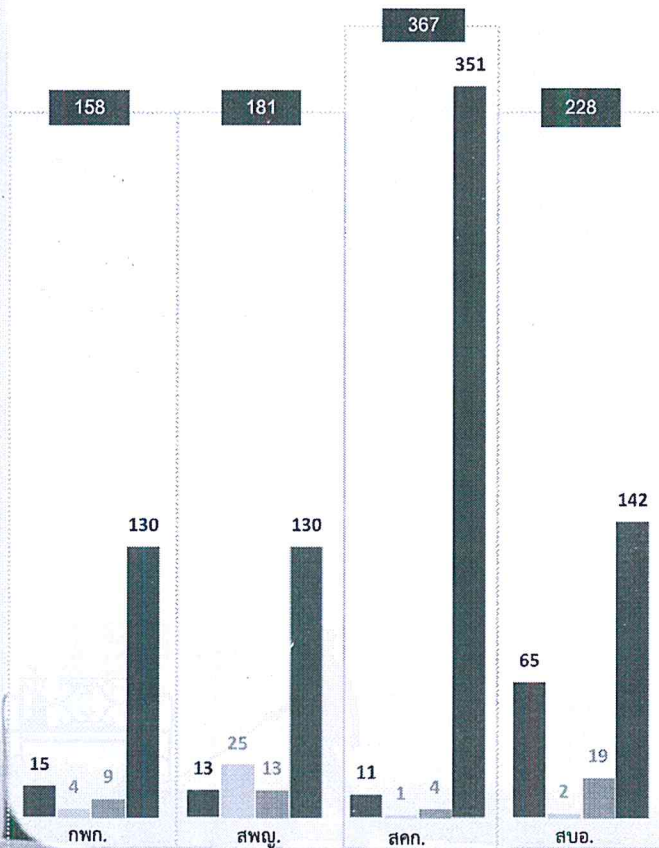

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,977	70,022.01	1,099	5,933.28	168	4,207.91	846	5,313.73	7,864	54,567.09
กพท.	158	13,162.81	15	542.71	4	414.00	9	1,102.78	130	11,103.32
สพญ.	181	11,182.31	13	312.89	25	2,060.76	13	490.66	130	8,318.00
สคก.	367	1,421.19	11	113.13	1	21.12	4	66.91	351	1,220.03
สบอ.	228	706.59	65	272.65	2	20.48	19	95.14	142	318.33
สบก.	32	598.70					12	94.87	20	503.83
สจด.	49	272.55	7	57.27	1	9.80	15	70.71	26	134.77
สลก.	4	99.97				0	3	50.89	1	49.08
สสร.	39	513.24	4	26.61	7	56.63	11	136.54	17	293.46
สอ.	13	331.04			5	74.00	2	50.00	6	207.04
ศท.	1	3.00	1	3.00						
สม.	48	5,538.62							48	5,538.62

หมายเหตุ

ไม่รวมรายการ จำนวน 88 รายการ งบประมาณ 666.05 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 85 รายการ งบประมาณ 437.05 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

■ ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR
 ■ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ■ เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา
 ■ ทำผูกพัน

2.2

สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

- ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 65


หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ ทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึง ประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึง อนุมัติรับราคา		ทำผูกพัน		สำนัก/กอง	จำนวนรายการ ทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึง ประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึง อนุมัติรับราคา		ทำผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ				จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	419	1,522.66	7	12.49	5	5.50	12	45.01	395	1,459.67	สขป. 10	609	1,044.83	260	413.16	5	5.95	45	129.73	299	496.00
สขป. 2	405	1,293.45	21	40.45	9	18.35	37	67.02	338	1,167.63	สขป. 11	582	1,575.14	40	330.53	15	101.98	113	104.50	414	1,038.13
สขป. 3	360	2,212.09	19	93.76	1	1.00	27	101.30	313	2,016.04	สขป. 12	675	1,476.89	140	242.07	10	65.84	93	384.69	432	784.28
สขป. 4	534	1,571.89	8	44.23	4	220.99	20	58.50	502	1,248.17	สขป. 13	612	1,321.78	54	401.84	2	20.50	41	25.87	515	873.57
สขป. 5	494	2,660.15	17	113.94	1	16.00	17	63.36	459	2,466.85	สขป. 14	356	3,006.75	40	593.41	2	1.43	46	323.99	268	2,087.92
สขป. 6	500	2,834.39	17	97.51	3	52.00	33	228.62	447	2,456.26	สขป. 15	503	1,217.34	144	286.61	5	155.00	19	208.31	335	567.41
สขป. 7	654	5,051.26	5	182.50	8	41.40	7	10.20	634	4,817.17	สขป. 16	521	3,212.46	61	955.05	16	576.30	75	461.27	369	1,219.84
สขป. 8	625	3,421.90	40	427.84	12	105.42	26	346.44	547	2,542.21	สขป. 17	265	1,082.67	13	90.24	5	61.90	76	481.13	171	449.40
สขป. 9	743	1,686.34	97	279.40	20	101.55	71	115.32	555	1,190.07											

หมายเหตุ

ไม่รวมรายการ จำนวน 88 รายการ งบประมาณ 666.05 ล้านบาท ดังนี้

- ยกเลิก จำนวน 85 รายการ งบประมาณ 437.05 ล้านบาท
- รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

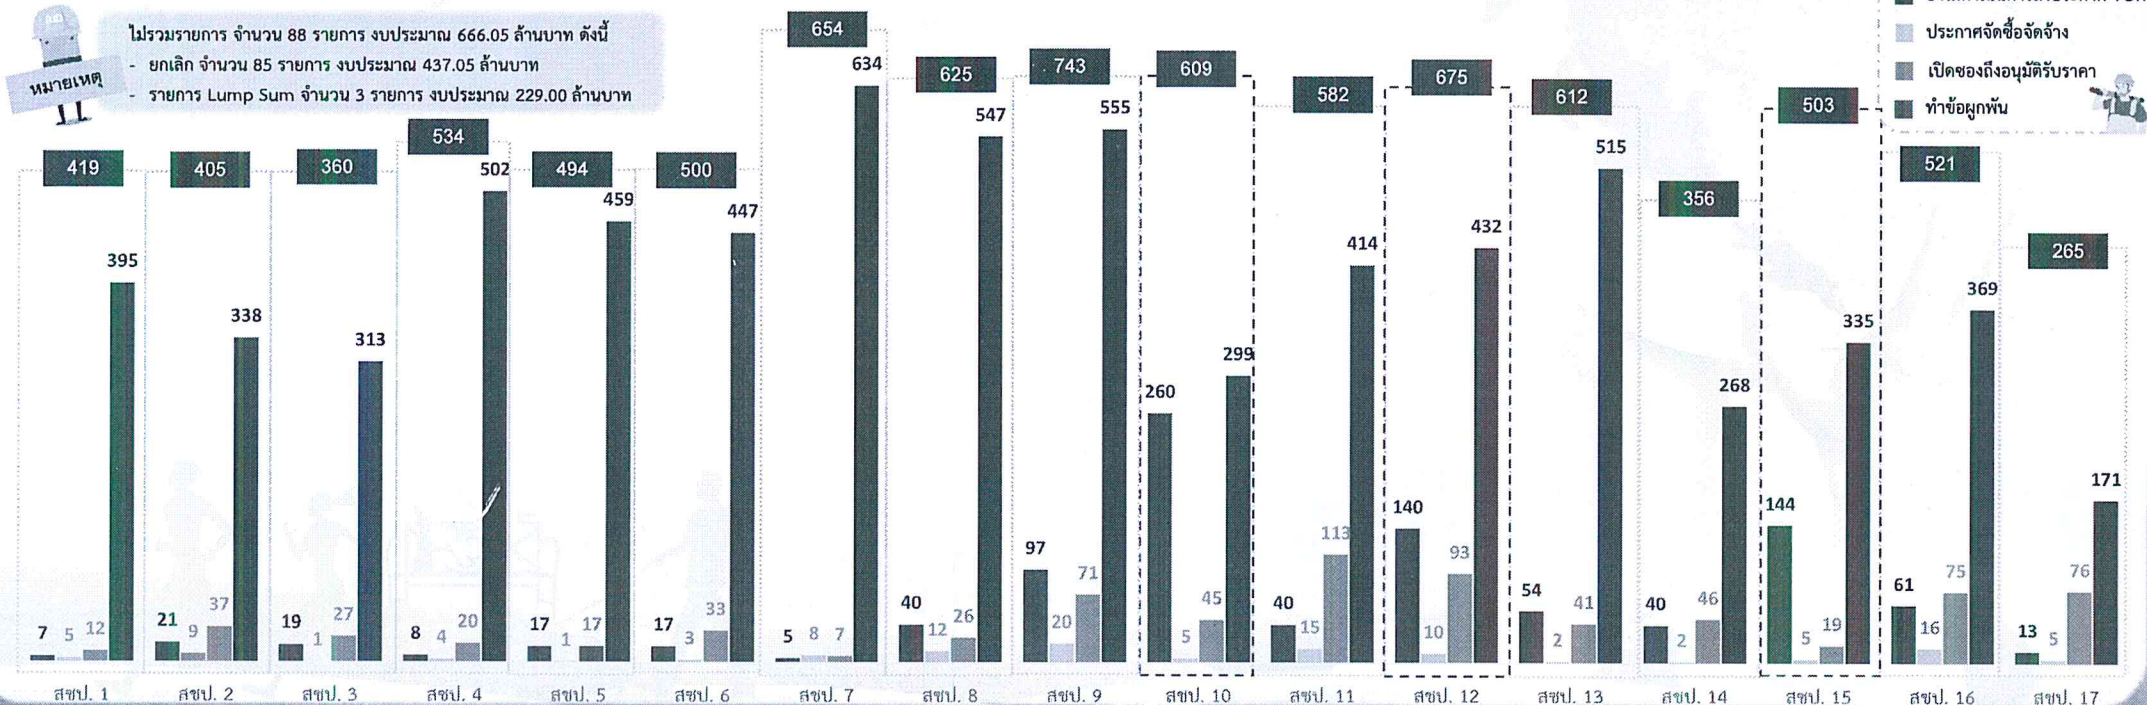

2.3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565

สำนัก/กอง	งบประมาณ พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อผูกพัน		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
					จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100 %
รวม	70,251.01	6,306.97	8.98	9,980	16	179.89	2,099	15,324.03	7,865	54,747.09	6,556	660	339	299	11	
สขบ. 1	1,522.66	196.23	12.89	419			24	62.99	395	1,459.67	253	75	42	25		
สขบ. 2	1,293.45	86.89	6.72	405			67	125.82	338	1,167.63	303	15	9	11		
สขบ. 3	2,212.09	56.41	2.55	360	1	1.98	46	194.07	313	2,016.04	275	17	16	5		
สขบ. 4	1,571.89	71.25	4.53	534			32	323.72	502	1,248.17	459	18	13	12		
สขบ. 5	2,660.15	156.10	5.87	494			35	193.30	459	2,466.85	383	48	19	9		
สขบ. 6	2,834.39	181.95	6.42	500			53	378.13	447	2,456.26	366	30	25	26		
สขบ. 7	5,051.26	656.11	12.99	654			20	234.09	634	4,817.17	360	168	67	39		
สขบ. 8	3,421.90	223.66	6.54	625			78	879.70	547	2,542.21	383	107	31	26		
สขบ. 9	1,686.34	108.47	6.43	743			188	496.27	555	1,190.07	440	37	32	46		
สขบ. 10	1,044.83	29.70	2.84	609	4	40.65	306	508.19	299	496.00	267	17	7	8		
สขบ. 11	1,575.14	39.71	2.52	582	5	33.50	163	503.51	414	1,038.13	354	27	26	7		
สขบ. 12	1,476.89	63.23	4.28	675			243	692.61	432	784.28	383	14	16	19		
สขบ. 13	1,321.78	62.39	4.72	612			97	448.21	515	873.57	511			4		
สขบ. 14	3,006.75	86.82	2.89	356			88	918.83	268	2,087.92	238	17	4	9		
สขบ. 15	1,217.34	23.74	1.95	503			168	649.92	335	567.41	323	8		4		
สขบ. 16	3,212.46	16.48	0.51	521			152	1,992.61	369	1,219.84	347	10	7	5		
สขบ. 17	1,082.67	7.29	0.67	265			94	633.27	171	449.40	167		2	2		
กพท.	13,162.81	692.82	5.26	158	3	51.76	25	2,007.72	130	11,103.32	128		1		1	
สพญ.	11,182.31	1,198.47	10.72	181			51	2,864.31	130	8,318.00	115	7	2	4	2	
สบอ.	706.59	14.11	2.00	228			86	388.26	142	318.33	134	4	3	1		
สคท.	1,421.19	133.33	9.38	367			16	201.16	351	1,220.03	257	41	17	36		
สสธ.	513.24	2.92	0.57	39			22	219.78	17	293.46	17					
สบก.	598.70	46.33	7.74	32			12	94.87	20	503.83	20					
สอธ.	331.04	0.00		13			7	124.00	6	207.04	6					
สจค.	272.55	8.84	3.24	49			23	137.78	26	134.77	25			1		
สลก.	99.97	2.59	2.59	4			3	50.89	1	49.08	1					
สผค.	5,538.62	2,130.99	38.48	48					48	5,538.62	40				8	
ศทส.	3.00	0.00		1	1	3.00										
Lump Sum	229.00	10.14	4.43	3	2	49.00			1	180.00	1					

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 85 รายการ งบประมาณ 437.05 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบกลาง เป็นต้น

2.4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565

สำนัก/กอง	งบประมาณ พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน รายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อมูลพัน		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
					จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	0-19 % 20-39 % 40-59 % 60-79 % 80-99 % 100 %					
รวม	70,251.01	6,306.97	8.98	9,980	16	179.89	2,099	15,324.03	7,865	54,747.09	6,556	660	339	299	11	
โครงการเขื่อนทดน้ำจาก จังหวัดอุดรดิต	1,198.71	11.20	0.93	17			6	623.87	11	574.84	10		1			
โครงการคลองระบายน้ำหลัก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,568.35	472.22	13.23	18			4	1,053.50	14	2,514.85	12	1		1		
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	21,657.11	1,395.65	6.44	441	1	35.00	70	3,265.34	370	18,356.77	346	19	1	2	2	
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	461.01	41.50	9.00	9	1	10.01			8	451.00	8					
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	452.70	0.38	0.08	14			9	142.47	5	310.23	5					
โครงการประดูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	194.72	0.14	0.07	3			1	2.74	2	191.98	2					
โครงการประดูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	164.65	0.32		4					4	164.65	4					
โครงการประดูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย	500.57	9.91	1.98	10			1	0.69	9	499.88	8		1			
โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	139.89	0.03	0.02	8			4	82.08	4	57.81	4					
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10,034.99	259.50	2.59	518	5	56.50	142	3,129.12	371	6,849.36	355	13	3			
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	7,053.34	250.38	3.55	153			42	1,314.27	111	5,739.07	109	2				
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	939.92	25.31	2.69	15			2	227.01	13	712.91	13					
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ทองสุธารา จังหวัดเชียงใหม่	813.25	149.95	18.44	17			8	351.75	9	461.50	6	2			1	
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,188.20	151.78	6.94	713			95	783.17	618	1,405.03	497	61	35	25		
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	16,809.62	2,536.18	15.09	7,481	6	66.65	1,587	3,724.64	5,888	13,018.33	4,874	530	261	216	7	
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	45.84	0.08	0.18	4					4	45.84	3	1				
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	503.83			4			3	203.83	1	300.00	1					
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	259.83	11.07	4.26	8			3	62.18	5	197.65	4	1				
โครงการอ่างเก็บน้ำบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยา	141.00	96.46	68.41	7			1	2.20	6	138.80	5			1		
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	610.75	14.32	2.34	6					6	610.75	6					
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	264.18	5.20	1.97	3	1	6.75	1	7.43	1	250.00	1					
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	752.43	583.15	77.50	2					2	752.43	1					1
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำว้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิต	535.84	183.13	34.18	10			3	74.65	7	461.19	6	1				
ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	960.29	109.07	11.36	515	2	4.98	117	273.09	396	682.22	276	29	37	54		

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 85 รายการ งบประมาณ 437.05 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบกลาง เป็นต้น






2.5

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565

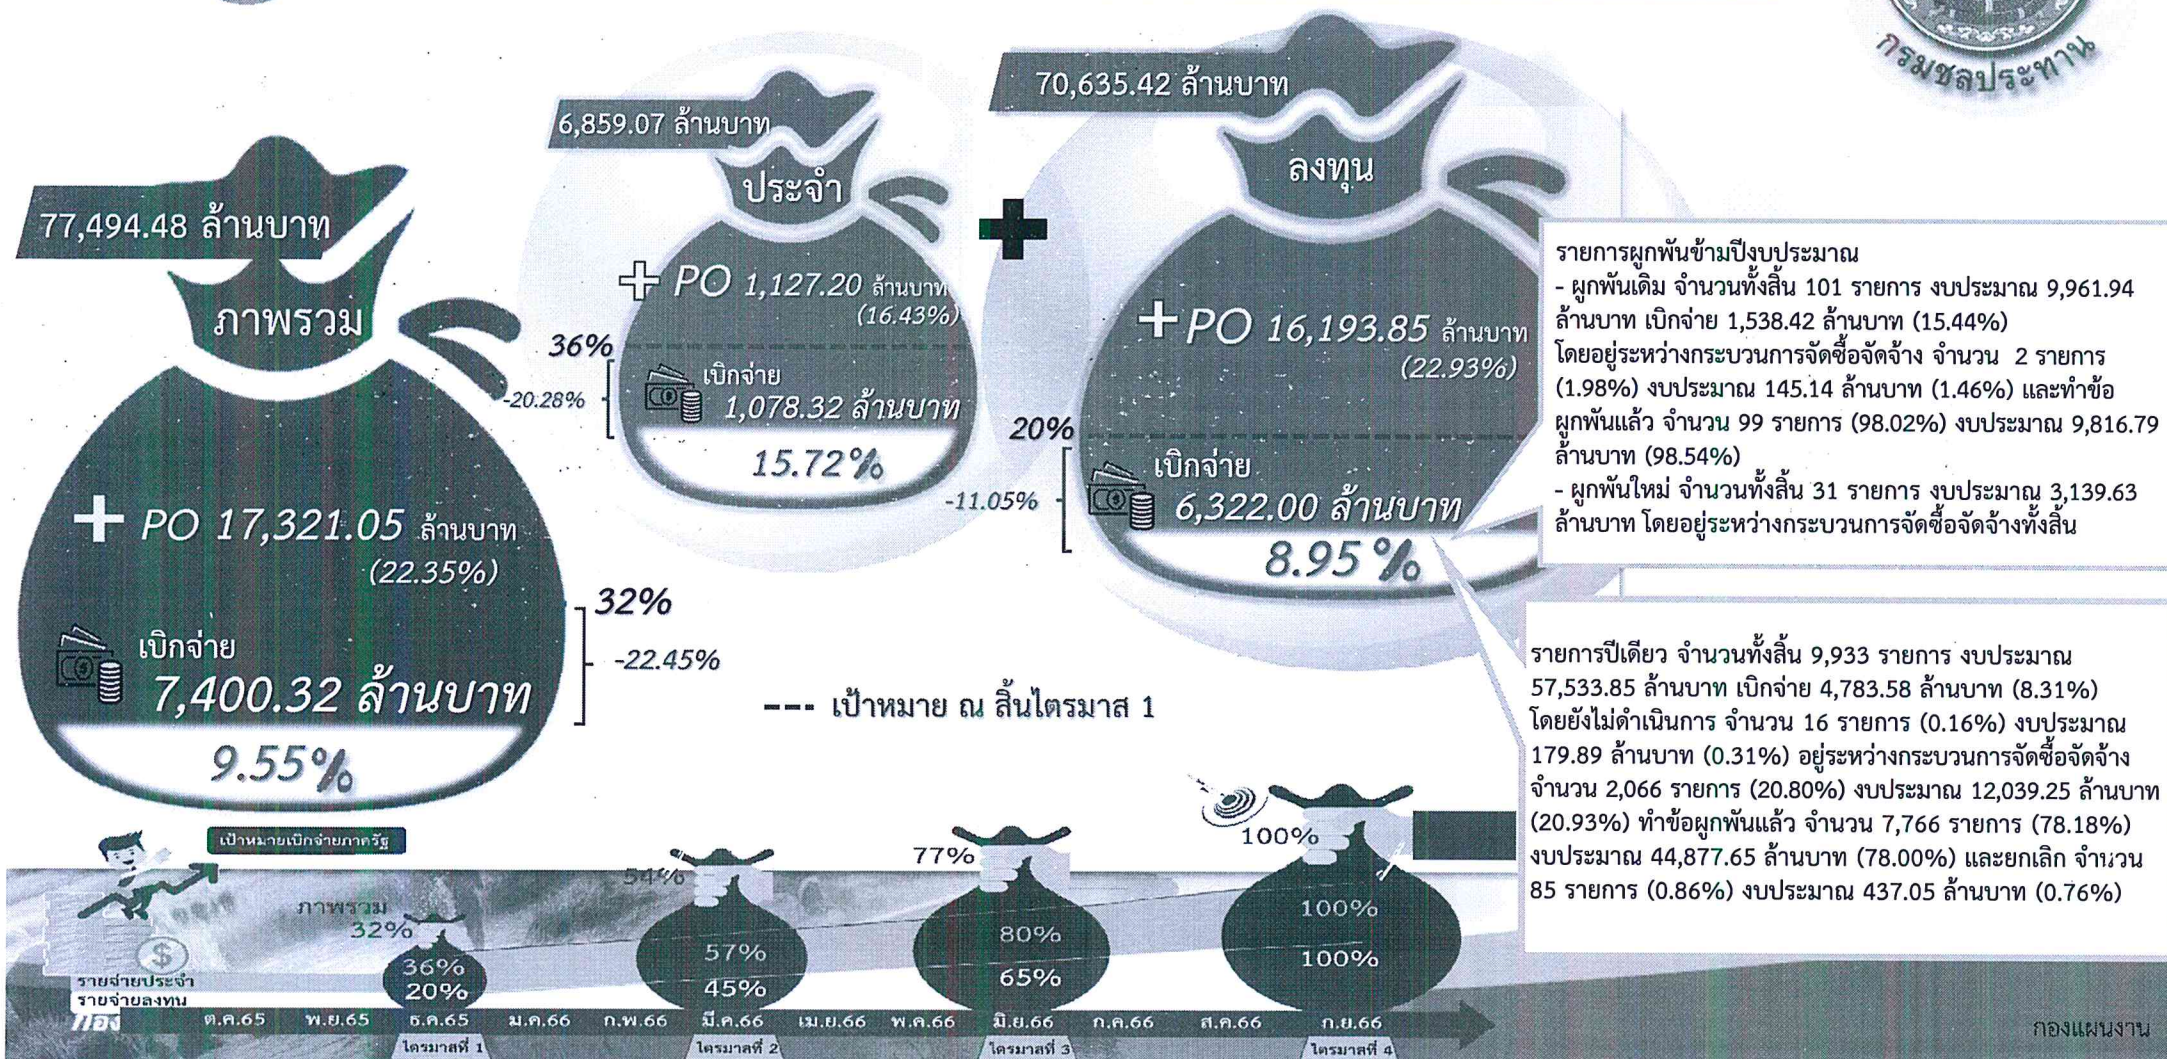

2.6

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565

77,494.48 ล้านบาท

ภาพรวม

เบิกจ่าย

7,400.32 ล้านบาท

9.55 %

ร้อยละ

เป้าหมายภาพรวม ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

เป้าหมาย 100.00%

100

80

60

40

20

0

เป้าหมาย 32.00%

เป้าหมาย 54.00%

เป้าหมาย 77.00%

- ต่ำกว่าเป้าหมายกรม ร้อยละ 11.79

- สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (61 - 65) ร้อยละ 3.72

- เป้าหมายกรม ปี 66
- ▲ ผลปี 66 (77,494.48)
- ผลปี 65 (77,143.43)2
- ▲ ผลปี 64 (74,106.98)2
- ผลปี 63 (69,177.56)
- ผลปี 62 (66,472.19)
- ผลปี 61 (55,620.32)
- เฉลี่ย 5 ปี (61-65)

	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายกรม ปี 66	10.67	21.34	32.00	39.33	46.66	54.00	61.67	69.34	77.00	84.67	92.34	100.00
ผลปี 66 (77,494.48)	3.07	9.55										
ผลปี 65 (77,143.43)2	2.45	7.97	16.49	21.25	28.37	38.31	43.27	51.57	61.30	66.15	73.38	84.09
ผลปี 64 (74,106.98)2	0.66	4.91	12.24	16.05	22.61	34.76	39.61	48.38	59.48	64.67	68.91	83.67
ผลปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	7.84	9.23	16.56	25.26	34.54	47.70	54.68	66.97	82.54
ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	83.17
ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
เฉลี่ย 5 ปี (61-65)	1.65	5.83	12.03	16.13	21.59	32.12	37.48	45.64	56.44	62.03	69.92	82.97



2.7

สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565



ร้อยละ

เป้าหมายงบรายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

100

เป้าหมายรัฐบาล 100.00%

80

เป้าหมาย 65.00%

60

เป้าหมาย 45.00%

40

เป้าหมาย 20.00%

20

- ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ 4.39
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (61 - 65) ร้อยละ 4.36

0

70,635.42 ล้านบาท

ลงทุน

เบิกจ่าย

6,322.00 ล้านบาท

8.95 %

	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายกรม ปี 65	6.67	13.34	20.00	28.33	36.66	45.00	51.67	58.34	65.00	76.67	88.34	100.00
ผลปี 66 (70,682.86)	2.68	8.95										
ผลปี 65 (70,135.62)	1.94	7.11	15.67	20.09	27.12	37.20	41.86	50.22	60.17	64.59	71.8	82.46
ผลปี 64 (66,423.87)	0.003	3.81	10.97	14.29	20.79	33.39	37.9	46.78	58.21	63.11	66.85	82.02
ผลปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	4.77	5.36	12.51	21.31	30.59	44.54	51.34	64.24	80.61
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
ผลปี 61 (47,566.20)	1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
เฉลี่ย 5 ปี (61 - 65)	0.99	4.59	10.48	14.02	19.17	29.96	35.01	43.08	54.40	59.53	67.46	80.93


กองแผนงาน

2.8

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร้อยละ

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565

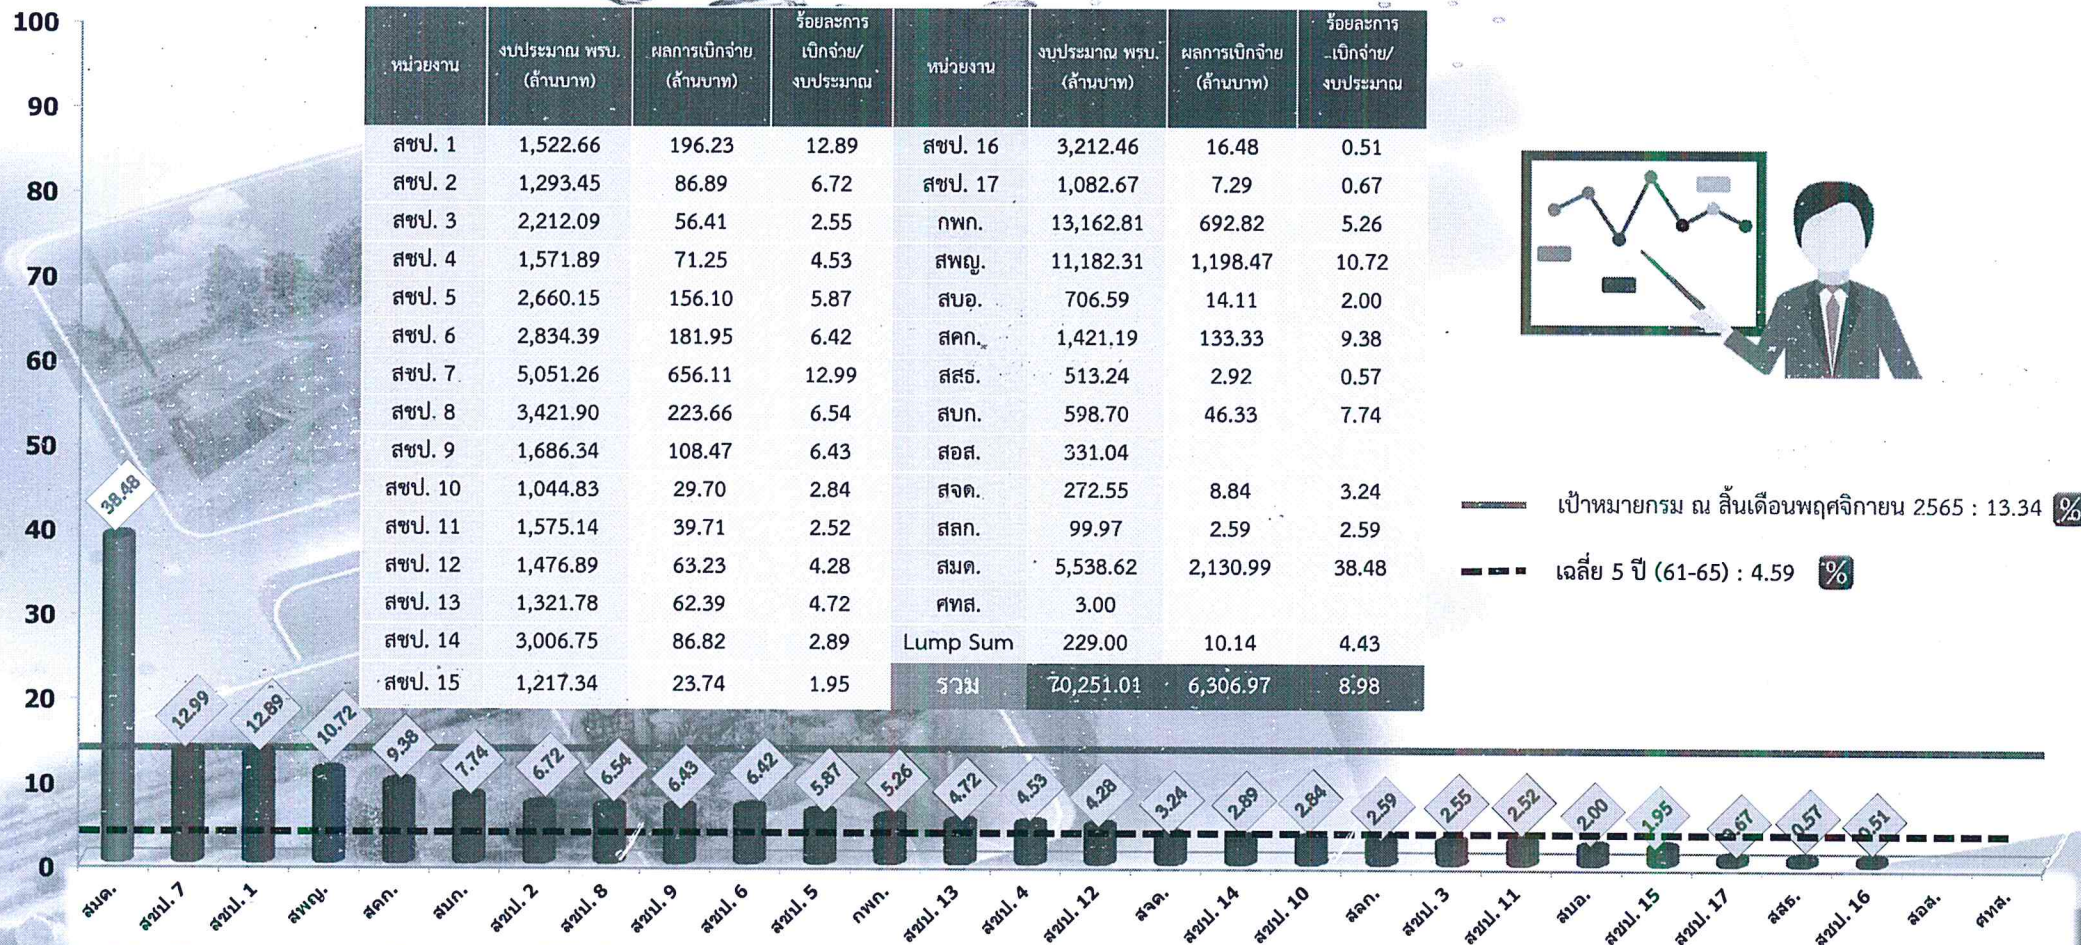

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 85 รายการ งบประมาณ 437.05 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบกลาง เป็นต้น

- ☐ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายรัฐบาล
- ☐ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

กองแผนงาน

2.9

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)							
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	93,167.14	21,914.5	23.52	75,683.63	5,229.76	6.91	16.61
2	กระทรวงคมนาคม	168,746.94	11,005.56	6.52	161,600.49	11,685.39	7.23	-0.71
3	กระทรวงมหาดไทย	81,019.46	4,949.72	6.11	75,942.95	4,871.33	6.41	-0.30
	ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมชลประทาน	70,635.42	6,322.00	8.95	70,259.74	4,993.98	7.11	1.84
2	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,439.94	57.60	4.00	1,279.24	17.87	1.40	1.40
3	กรมพัฒนาที่ดิน	1,990.98	35.55	1.79	1,957.74	47.85	2.44	-0.65
	ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)							
1	กรมโยธาธิการและผังเมือง	33,310.31	4,519.04	13.57	29,841.22	4,699.23	15.75	-2.18
2	กรมชลประทาน	70,635.42	6,322.00	8.95	70,259.74	4,993.98	7.11	1.84
3	กรมทางหลวง	113,464.41	9,388.93	8.27	108,004.83	10,268.86	9.51	-1.24
4	กรมทางหลวงชนบท	45,583.25	977.77	2.15	44,326.09	968.81	2.19	-0.04

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 14.96%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (48 หน่วยงาน) เฉลี่ย 13.24%



2

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566




ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565



ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2565

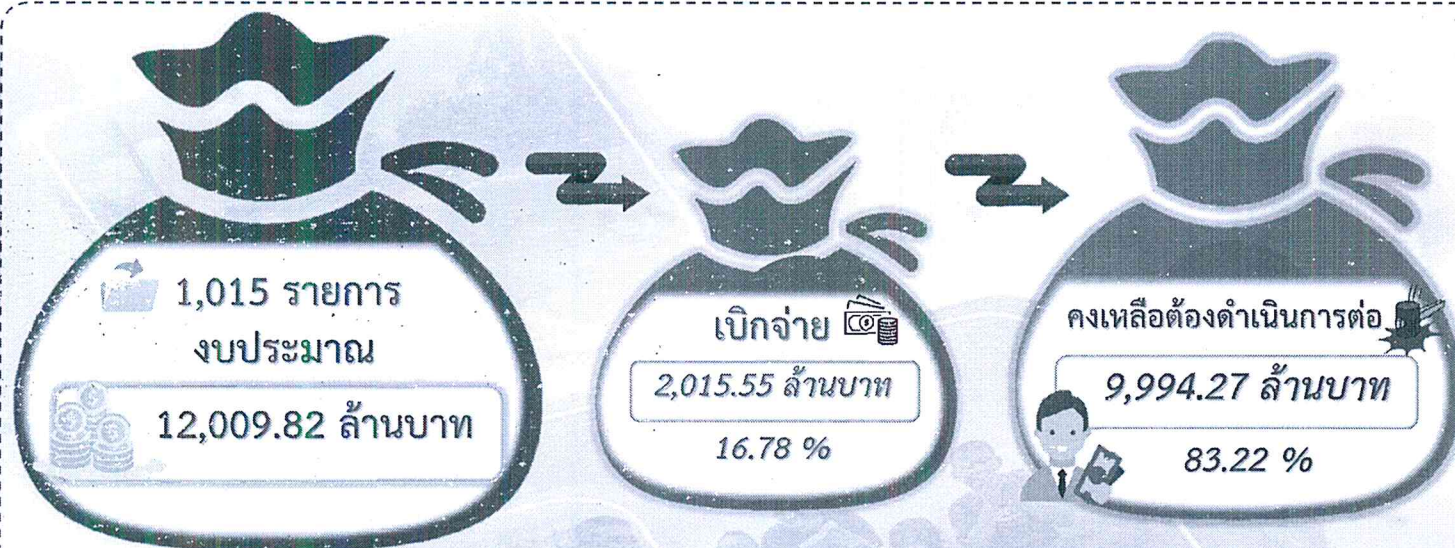

สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,015 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ



258 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง



755 รายการ

ยกเลิกรายการ



2 รายการ



ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

กองแผนงาน





การดำเนินงาน

มีมติ คร.ม./คำสั่งนายก อบม.ติดงบกลาง 65

รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,087 รายการ

งบประมาณ 4,896.45 ล้านบาท

เบิก 1,923.78 ล้านบาท 39.29 %

ผลการดำเนินงาน

จัดซื้อ-จัดจ้าง
6 รายการ 0.55 %ดำเนินการก่อสร้าง
397 รายการ 36.53 %แล้วเสร็จ
682 รายการ 62.74 %

ยกเลิก 2 รายการ 0.18 %

ตัวชี้วัดของโครงการ

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์ 2,443,886 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 1,652,487 ไร่ 67.62 %

ครัวเรือน 204,583 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 128,605 ครัวเรือน 62.86 %

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565



ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

มติ ครม.
29 มี.ค. 65คำสั่งนายก
4 ส.ค. 65
ครม.กม.ช.มติ ครม.
9 ส.ค. 65มติ ครม.
6 ก.ย. 65
ครม.กม.ช.มติ ครม.
6 ก.ย. 65มติ ครม.
27 ก.ย. 65
ครม.กม.ช.กปร.
2565620 รายการ
1,126.19 ล้านบาทเบิกจ่าย 1,029.77 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 91.44

- แล้วเสร็จ 590 รายการ
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 28 รายการ
- ยกเลิก 2 รายการ

95.05 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

1 รายการ
97.92 ล้านบาทเบิกจ่าย 97.92 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100

- แล้วเสร็จ

100 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

407 รายการ
1,137.66 ล้านบาทเบิกจ่าย 286.71 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 25.20

- แล้วเสร็จ 75 รายการ
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 332 รายการ

28.11 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

3 รายการ
663.88 ล้านบาทเบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

- จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 รายการ

- %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

4 รายการ
190.14 ล้านบาทเบิกจ่าย 10.15 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.34

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 รายการ
- จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 รายการ

2.04 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

1 รายการ
656.55 ล้านบาทเบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

- จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ

- %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

51 รายการ
1,024.11 ล้านบาทเบิกจ่าย 499.23 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 48.75

- แล้วเสร็จ 16 รายการ
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 35 รายการ

45.31 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและ
ฝนทิ้งช่วง ปี 2565จัดหารถบินขึ้นถ้อยาง ขนาด 50 คัน (All
Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูก
พับไปตามกฎหมายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อดูแล
ปี 2565/2566โครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหากลุ่มภัยแล้งและภัย
น้ำท่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกัก
เก็บน้ำเพื่อดูแล ปี 2565/2566 เพิ่มเติมโครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพื่อเร็ว ขับด้วย
ระบบไฮดรอลิก ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 42 นิ้วโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) ประจำปี 2565

รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)



เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



งบประมาณ 1,026.97 ล้านบาท
งบจัดสรร 26.75 ล้านบาท
เบิกจ่าย - ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : 1,012 รายการ



อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 205 รายการ
✗ ยังไม่ดำเนินการ 807 รายการ

งานกองทุน
จัดรูปที่ดิน

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ 307.65 ล้านบาท = เบิกจ่าย 5.62 ล้านบาท 1.83 %	
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 29 รายการ	รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 3 รายการ	
✗ ยังไม่ดำเนินการ 3 รายการ	
ผลสัมฤทธิ์	
▪ พื้นที่เกษตรกรรม 23,890 ไร่	
▪ ครบถ้วนรับประโยชน์ 1,774 ครัวเรือน	

จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร

งบประมาณ 727.35 ล้านบาท = เบิกจ่าย 20.25 ล้านบาท 2.78 %	
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 47 รายการ	รวมทั้งสิ้นจำนวน 57 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 7 รายการ	
✗ ยังไม่ดำเนินการ 3 รายการ	
ผลสัมฤทธิ์	
▪ พื้นที่เกษตรกรรม 60,239 ไร่	
▪ ครบถ้วนรับประโยชน์ 5,235 ครัวเรือน	

ภาพรวม



งบประมาณ 1,035.00 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 25.87 ล้านบาท 2.50%



ผลการดำเนินงาน : 92 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 76 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 10 รายการ
✗ ยังไม่ดำเนินการ 6 รายการ

