



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๒๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๓๑/ ธันวาคม ๒๕๖๖ สมจ ๑๐๐๙๓/๓๕๑.๖๖

เรื่อง สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ๖๖๒๗๑๔
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทานได้กันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗๔๔ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓๖ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕๐๘ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีทั้งสิ้น จำนวน ๗,๔๗๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๑๙๖.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๗ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน ๕,๒๘๒.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิทธิพิชญ์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผว.ผง.
เพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา ปานฮา)

ผชช.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖

- ทราบ

เรียน ผอ.ชว.ผ., ผอ.ช.กต., ทน. ๑-๗ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินการ		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)			
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2566	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	744	236	508	7,479.60	2,196.83	29.37	5,282.77
สขป. 1	29	5	24	77.41	13.42	17.33	64.00
สขป. 2	18	10	8	35.90	12.99	36.19	22.91
สขป. 3	22	5	17	127.16	62.88	49.45	64.28
สขป. 4	10	2	8	168.04	22.11	13.16	145.93
สขป. 5	22	6	16	100.00	19.16	19.16	80.84
สขป. 6	19	3	16	176.54	21.97	12.44	154.57
สขป. 7	31	2	29	407.57	51.84	12.72	355.73
สขป. 8	72	25	47	520.80	180.78	34.71	340.02
สขป. 9	35	13	22	394.12	145.88	37.01	248.24
สขป. 10	11	2	9	100.63	31.35	31.16	69.27
สขป. 11	15	2	13	253.77	97.58	38.45	156.19
สขป. 12	9	5	4	111.98	24.25	21.66	87.73
สขป. 13	19		19	340.89	54.80	16.08	286.09
สขป. 14	50	16	34	337.26	59.71	17.71	277.54
สขป. 15	27	18	9	110.87	30.67	27.66	80.20
3 สขป. 16	40	17	23	563.85	206.85	36.68	357.00
สขป. 17	24	8	16	233.12	93.39	40.06	139.73
สบอ.	42	25	17	115.39	34.80	30.16	80.59
2 กพท.	82	34	48	1,200.12	376.40	31.36	823.72
กพด.	1		1	3.97	0.60	15.00	3.37
กสช.	1		1	0.15			0.15
สพช.	2		2	3.61	0.96	26.57	2.65
สมด.	10	3	7	147.34	136.81	92.85	10.53
สคก.	10	4	6	15.61	13.53	86.67	2.08
สจต.	8	2	6	31.60	4.44	14.05	27.16
สลก.	3		3	54.82	0.18	0.33	54.64
สบก.	21	3	18	162.71	8.96	5.51	153.75
1 สพญ.	94	19	75	1,518.62	429.63	28.29	1,088.99
สวพ.	1	1		0.19	0.19	99.38	
สสธ.	2	2		0.03			0.03
สอศ.	4		4	56.69			56.69
กพร.	1	1		2.15	2.15	100.00	
กผง.	1		1	3.96			3.96
Lump Sum	8	3	5	102.73	58.54	56.99	44.19

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข


1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
4. เร่งรัดดำเนินงานหลังจากเกษตรกรเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เกินเหลือเป็น

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 66



ภาพรวม งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เกินเหลือเป็น

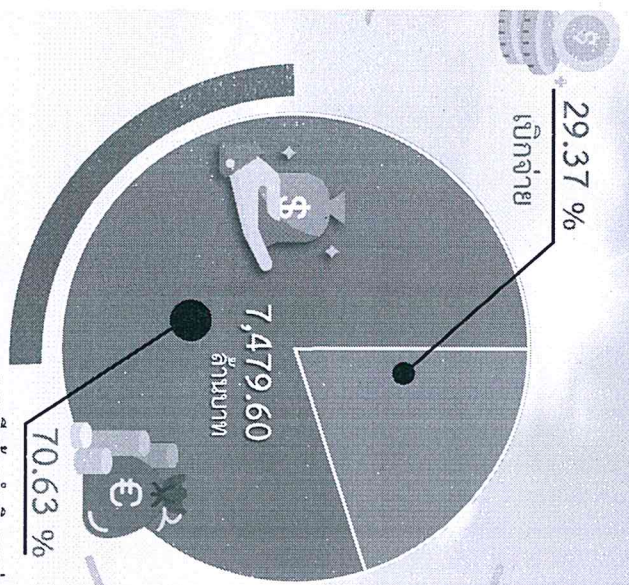

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

แผน	รวม	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ยอดรวม
งบ	7,479.60	797.71	2,033.71	1,248.99	796.57	765.38	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.58	132.23	40.4
ผล	2,196.83	797.71	1,399.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1009
คง	5,282.77	-	-634.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สถานะการดำเนินงาน 744 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 236 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 508 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่ทันไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้ไม่ทำงานในบริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานไม่ได้ซ้ำกว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมามีในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยว ผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

และงบประมาณที่ต่อจากปี 206.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.68
 2.3 ส่วนงานขอลงพื้นที่ 16 จำนวน 40 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ
 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ ผลการปฏิบัติงาน
 งบประมาณเงินกู้ในปี 563.85 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 206.85 ล้านบาท

และงบประมาณที่ต่อจากปี 823.72 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ จำนวน 82 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ
 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ ผลการปฏิบัติงาน
 งบประมาณเงินกู้ในปี 1,200.12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 376.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.36

และงบประมาณที่ต่อจากปี 1,088.99 ล้านบาท

2.1 ส่วนพัฒนาแหล่งน้ำใหญ่ จำนวน 94 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ
 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 75 รายการ ผลการปฏิบัติงาน
 งบประมาณเงินกู้ในปี 1,518.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 429.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.29

2. จำนวนตามสำเนา/กอง ซึ่งมี 34 สำเนา/กอง ที่ดำเนินการปฏิบัติงาน
 ใ้บริการลูกค้า โดยสำนัก/กอง ที่มอบหมายต่อจากปี 3 ลำดับ (ดูตารางที่ 2)

จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกู้ปี 2566	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต่อ	ดำเนินการต่อ
จำนวนทั้งสิ้น	744	7,479.60	2,196.83	29.37	5,282.77
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	236	564.10	518.22	91.87	45.88
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	508	6,915.50	1,678.61	24.27	5,236.89

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกู้ใ้บริการลูกค้าปี พ.ศ. 2566 จำนวนตามผลปฏิบัติงาน

5,236.89 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 508 รายการ งบประมาณเงินกู้ใ้บริการลูกค้าปี
 6,915.50 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,678.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.27 และงบประมาณที่ต่อจากปี

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 236 รายการ งบประมาณเงินกู้ใ้บริการลูกค้าปี 564.10
 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 518.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.87 และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 45.88 ล้านบาท

1. จำนวนตามผลปฏิบัติงาน (ดูตารางที่ 1)

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกู้ใ้บริการลูกค้าปี พ.ศ. 2566 สามารถจ่ายแผนกประเภที่ต่าง ๆ

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.63

จำนวน 744 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 236 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
 508 รายการ ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณเงินกู้ใ้บริการลูกค้าปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 7,479.60 ล้านบาท
 เบิกจ่ายแล้ว 2,196.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.37 และงบประมาณที่ต่อจากปี 5,282.77

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ใ้บริการลูกค้าปี
 ขอมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566
