



ส่วนที่ ๑๖

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E... กพว๐๐๖/๑๔๘/๒๕๖๖

1764

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๑๕๔/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

รับ ๒๐๓๑

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑,๐๑๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๕๗ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕๕๖ รายการ และยกเลิก ๒ รายการ คือ ประตุ ระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี และประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด ๖.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๐๓๙.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๖ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๖,๙๗๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผวง.ผง.

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจนวัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

-ทราบ

โยธิน ผอ.สงน., ผอ.ศ.ทต., ทน.๑-๙ ผอ.

พ.ท. ผอ. (งม.ผอ., พต.ผอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,015 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 457 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 556 รายการ และยกเลิก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5,039.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.96 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 6,970.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.04

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 457 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,836.47 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,832.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.79 และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 3.83 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 556 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 10,137.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,207.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.64 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 6,929.95 ล้านบาท

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 2 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 36.27 ล้านบาท และงบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 36.27 ล้านบาท คือ ประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

ประเภทการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)			
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	12,009.81	5,039.76	41.96	6,970.05
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	457	1,836.47	1,832.64	99.79	3.83
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	556	10,137.07	3,207.12	31.64	6,929.95
3. ยกเลิกรายการ	2	36.27			36.27

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 30 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 95 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 40 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 55 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2,481.86 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 905.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.50 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,575.98 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 99 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 49 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,745.31 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 760.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.59 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 984.54 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 132 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 56 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 76 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,071.44 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 450.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.00 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 621.42 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)			
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2565	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	457	556	2	12,009.81	5,039.76	41.96	6,970.05
สขป.1	13	5	8		147.89	76.87	51.98	71.02
สขป.2	35	23	12		148.13	100.05	67.54	48.08
สขป.3	13	5	8		208.41	12.72	6.10	195.69
สขป.4	11	6	5		36.03	20.12	55.85	15.90
สขป.5	22	9	13		372.59	221.34	59.41	151.25
สขป.6	40	10	30		498.67	158.26	31.74	340.41
สขป.7	72	21	51		319.01	190.04	59.57	128.97
3 สขป.8	132	56	76		1,071.44	450.02	42.00	621.42
สขป.9	30	13	17		531.87	171.31	32.21	360.57
สขป.10	32	14	18		179.34	51.82	28.90	127.52
สขป.11	42	20	20	2	559.83	176.12	31.46	383.71
สขป.12	20	7	13		327.28	93.08	28.44	234.20
สขป.13	35	13	22		330.26	181.51	54.96	148.75
สขป.14	40	14	26		564.75	223.23	39.53	341.52
สขป.15	106	76	30		687.46	372.55	54.19	314.91
สขป.16	50	26	24		770.05	447.69	58.14	322.36
สขป.17	21	9	12		152.41	72.88	47.82	79.53
สบก.	24	9	15		127.47	25.23	19.79	102.24
* สบอ.	47	20	27		311.74	103.00	33.04	208.74 *
1 สทญ.	95	40	55		2,481.86	905.88	36.50	1,575.98
2 กพท.	99	49	50		1,745.31	760.77	43.59	984.54
สทค.	1		1		0.74	0.32	42.86	0.42
สมค.	8	2	6		9.95	7.94	79.78	2.01
สลก.	8	1	7		106.49	18.28	17.17	88.21
สสธ.	1	1			13.94	13.94	100.00	
สอธ.	6	2	4		84.39	30.00	35.55	54.39
ศทส.	2	2			10.26	10.26	100.00	
สกก.	2	2			9.48	9.48	99.98	0.002
สจค.	4	1	3		19.03	12.35	64.92	6.68
Lump Sum	4	1	3		183.74	122.71	66.78	61.04

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข


1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ภาพรวม งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2565

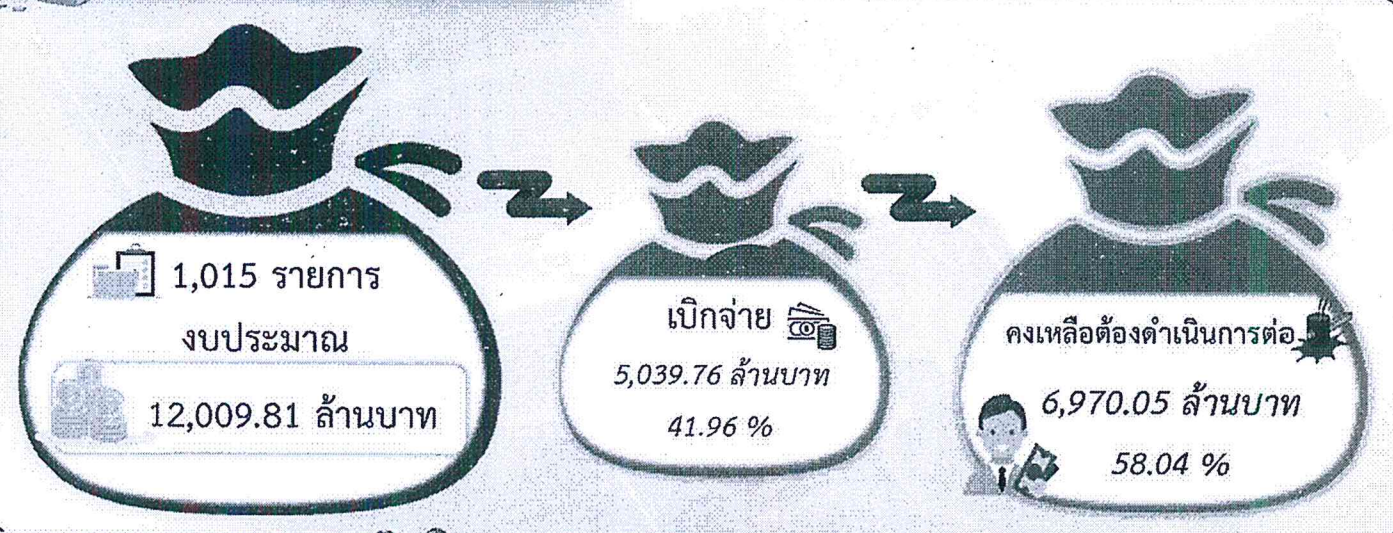

สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,015 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ	457 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง	556 รายการ
ยกเลิกรายการ	2 รายการ



ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือทำงานทำให้กรมต้องบอกเลิกสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราชการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

	รวม	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ยอดความ จำเป็น
แผน	12,009.81	656.81	1,620.80	2,068.76	1,471.04	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01	461.22	51.66
ผล	5,039.76	656.81	1,358.74	1,408.54	862.88	752.79								
ผลต่าง	6,970.05	-	-262.06	-660.22	-608.16	-552.27								

