



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๑๕๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖) ร.บ. 2573

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๑๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๙๖ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕๑๗ รายการ และยกเลิก ๒ รายการ คือ ประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด ๖.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๕๙๓.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๘ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๖,๔๑๕.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๒ โดยมีสำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ จำนวน ๑๖ สำนัก/กอง ได้แก่ สขบ.๓ สขบ.๖ สขบ.๘ สขบ.๙ สขบ.๑๐ สขบ.๑๑ สขบ.๑๒ สขบ.๑๔ สขบ.๑๗ สบก. สบอ. สพญ. กพก. สพด. สลก. และ สอส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผวง.ผง.

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖

-ทราบ

เรียน ผอ.ผง., ผอ.ทอ., ทน.๑-๙, ผอ.

และ ผอ.ท.ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายนนต์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖


งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566

ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565

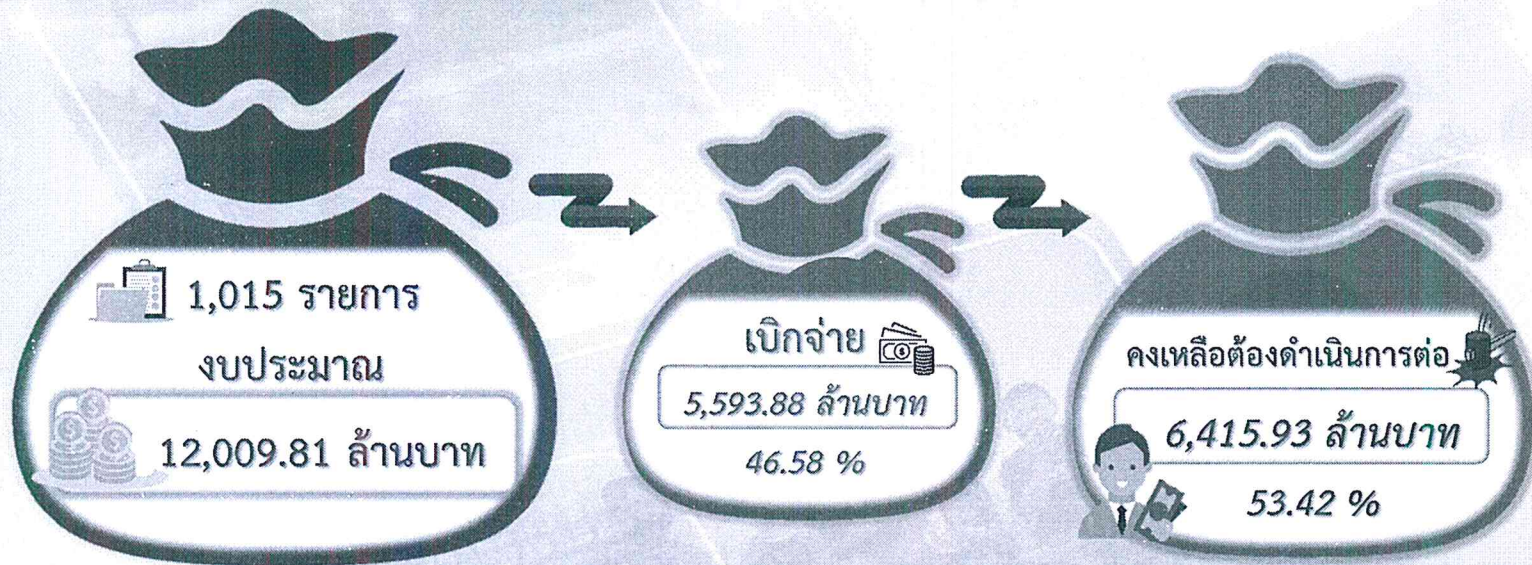

สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,015 รายการ


- ดำเนินการแล้วเสร็จ 496 รายการ
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 517 รายการ
- ยกเลิกรายการ 2 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือทำงานทำให้กรมต้องบอกเลิกสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

รวม	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	หมวดความจำเป็น	
เงิน	12,009.81	656.81	1,620.80	2,068.76	1,471.04	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01	461.22	51.66
เงิน	5,593.88	656.81	1,358.74	1,408.54	862.88	752.79	554.12							
เงิน	6,415.93	-	-262.06	-660.22	-608.16	-552.27	-1,584.61							



สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,015 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 496 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 517 รายการ และยกเลิก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5,593.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.58 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 6,415.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.42**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 496 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2,152.41 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,148.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.82 **และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 3.85 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 517 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 9,821.13 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,445.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.08 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 6,375.81 ล้านบาท**

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 2 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 36.27 ล้านบาท **และงบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 36.27 ล้านบาท** คือ ประตुरะบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตुरะบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)			
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	12,009.81	5,593.88	46.58	6,415.93
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	496	2,152.41	2,148.56	99.82	3.85
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	517	9,821.13	3,445.32	35.08	6,375.81
3. ยกเลิกรายการ	2	36.27			36.27

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 30 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 95 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 43 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 52 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2,481.86 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,014.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.88 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,467.17 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 99 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 51 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,745.31 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 800.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.88 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 944.57 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 132 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 59 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 73 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,071.44 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 480.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.82 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 591.25 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)			
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	496	517	2	12,009.81	5,593.88	46.58	6,415.93
สขป.1	13	5	8		147.89	78.91	53.36	68.98
สขป.2	35	25	10		148.13	108.80	73.45	39.33
สขป.3	13	5	8		208.41	79.61	38.20	128.80
สขป.4	11	6	5		36.03	21.33	59.22	14.69
สขป.5	22	12	10		372.59	232.59	62.43	140.00
สขป.6	40	13	27		498.67	174.61	35.02	324.06
สขป.7	72	27	45		319.01	217.02	68.03	102.00
3 สขป.8	132	59	73		1,071.44	480.19	44.82	591.25
สขป.9	30	16	14		531.87	201.88	37.96	330.00
สขป.10	32	16	16		179.34	71.58	39.91	107.76
สขป.11	42	20	20	2	559.83	188.79	33.72	371.05
สขป.12	20	7	13		327.28	101.92	31.14	225.35
สขป.13	35	14	21		330.26	195.56	59.21	134.70
สขป.14	40	14	26		564.75	232.96	41.25	331.79
สขป.15	106	80	26		687.46	438.16	63.74	249.30
สขป.16	50	29	21		770.05	491.05	63.77	279.00
สขป.17	21	11	10		152.41	74.11	48.63	78.30
สบก.	24	9	15		127.47	26.57	20.84	100.90
สบอ.	47	20	27		311.74	117.31	37.63	194.43
1 สพญ.	95	43	52		2,481.86	1,014.69	40.88	1,467.17
2 กพท.	99	51	48		1,745.31	800.74	45.88	944.57
สพด.	1		1		0.74	0.32	42.86	0.42
สมด.	8	3	5		9.95	8.52	85.61	1.43
สลก.	8	1	7		106.49	26.65	25.03	79.84
สสร.	1	1			13.94	13.94	100.00	
สอส.	6	3	3		84.39	30.65	36.32	53.74
ศทส.	2	2			10.26	10.26	100.00	
สคก.	2	2			9.48	9.48	99.98	0.002
สจค.	4	1	3		19.03	13.05	68.59	5.98
Lump Sum	4	1	3		183.74	132.63	72.18	51.12

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
