



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๕๓๕/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.พ.๖ 6360/11๕๐.๖๖.

เรื่อง ข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖) **งย 513**

เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๔ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๑,๖๓๔.๒๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๖๐๔.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๙ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๘๙๘.๐๔ ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา ๑,๒๙๙.๙๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๔๔.๗๖ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๔ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๘๕๑.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๗๒๘.๗๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔๖๒.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๑ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๖๘๗.๒๒ ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา ๙๙๙.๐๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๔๕.๓๗ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๘ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสลิทธิพิทย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วิวัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖

- ทราบ

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ทค., ทน.๑-๙ ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรุณา เชี่ยวคุณา)

ผยศ.บอ.รักษาราชการแทน ผส.บอ.

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖

โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 134 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,634.22 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,604.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.19 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา 898.04 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 1,299.96 ตัน คิดเป็นร้อยละ 144.76 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 124 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- Para Asphalt Concrete จำนวน 130 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,605.81 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,576.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.16 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา 792.54 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 1,192.82 ตัน คิดเป็นร้อยละ 150.51 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ คือ 1) ซ่อมแซมถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย ความยาว 4.487 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลพุดเตา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) ปรับปรุงถนนลาดยางทางผันน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงราก ความยาว 9.600 กม. ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 120 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- Para Soil Cement จำนวน 4 รายการ งบประมาณจัดสรร 28.41 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 28.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา 105.50 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 107.14 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.55 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

2. งบประมาณ ...

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพารา ในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าหัวงาน โครงการชลประทาน ประเภท Para Asphalt Concrete รวมทั้งสิ้น 48 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 851.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 728.79 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 462.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.41 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 687.22 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 999.00 ตัน คิดเป็นร้อยละ 145.37 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 28 รายการ



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566

กรมชลประทาน


ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการชงยางเหนียวงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ที่ดำเนินการต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ร.บ. 2565

ประเภท	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
ผล	1,604.70 (98.19%)	124	1,299.96 (144.76%)
แผน	1,634.22	134	898.04

 Para Asphalt Concrete




ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
ผล	1,576.30 (98.16%)	120	1,192.82 (150.51%)
แผน	1,605.81	130	792.54


 Para Soil Cement

ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
ผล	28.40 (99.96%)	4	107.14 (101.55%)
แผน	28.41	4	105.50



หมายเหตุ : ยกเลิก 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการเงินกู้ พ.ศ. 2563 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564




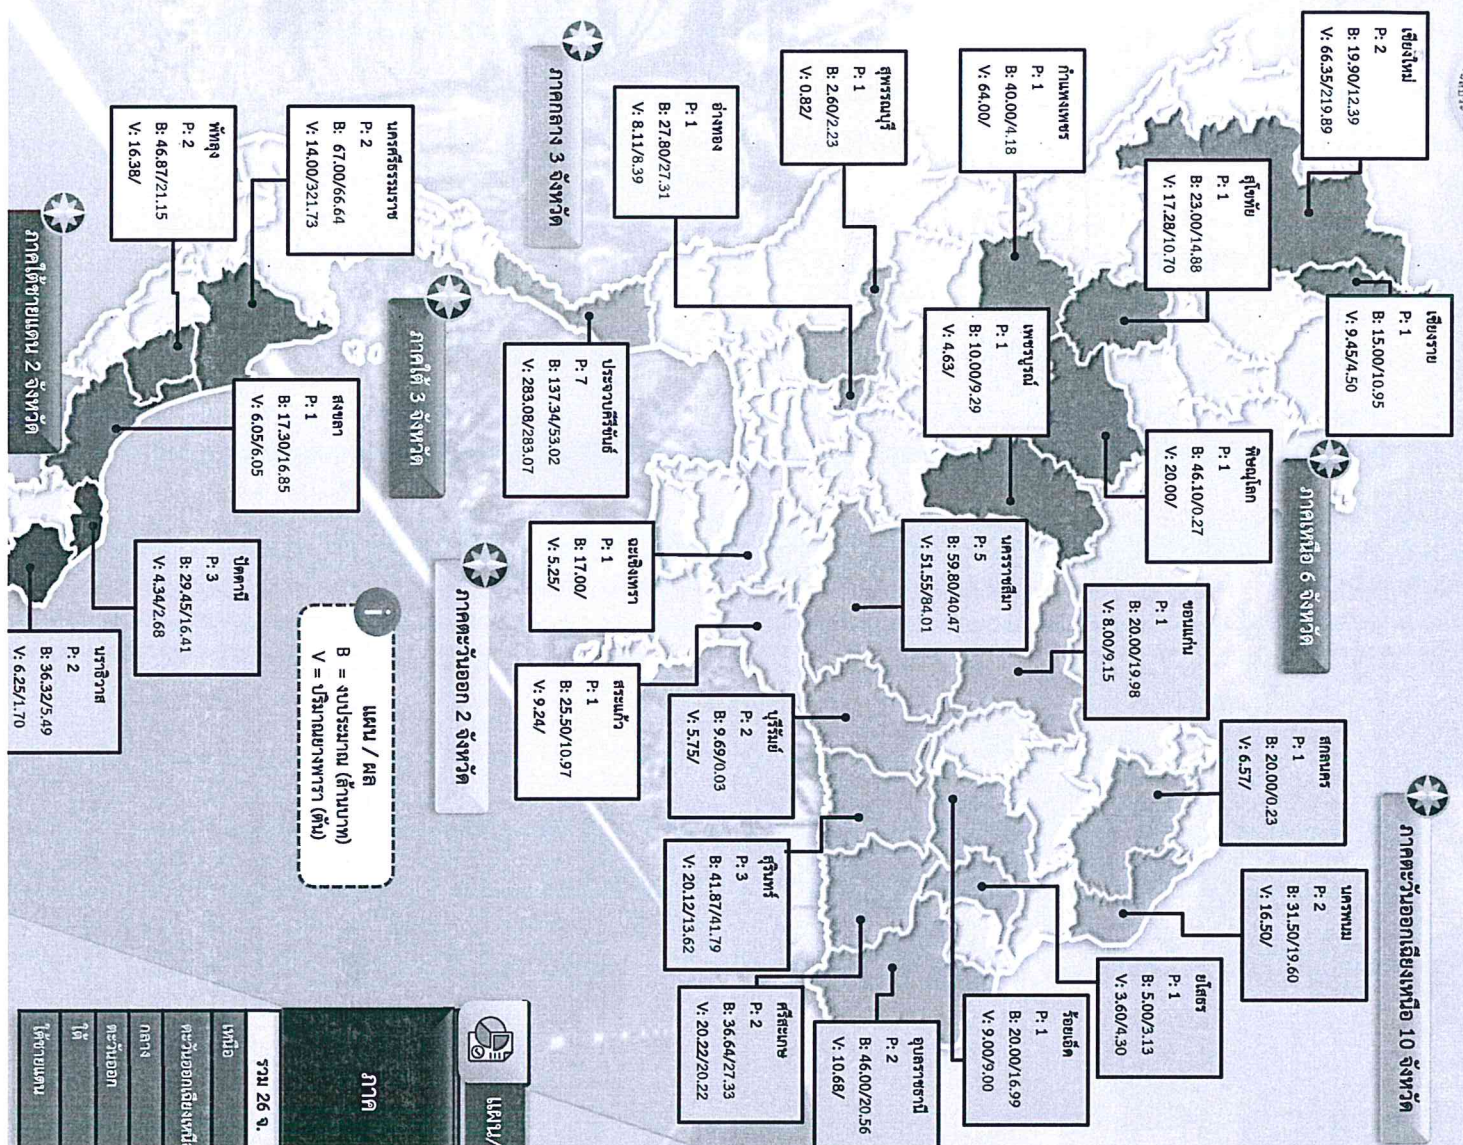

แผน / ผล
 B = จำนวน (ล้านบาท)
 V = ปริมาณยางพารา (ตัน)

แผน/ผลการดำเนินงาน

ภาค	จำนวน (รายการ)		งบประมาณ (ล้านบาท)				นำยงขึ้น (ตัน)		
	แผน	ผล	งบตาม พ.ร.บ.	งบตั้งโอน	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	แผน	ผล	
รวม 26 ก.	48	28	851.68	728.79	462.16	63.41	687.22	999.00	145.37
เหนือ	7	4	154.00	107.44	51.97	48.37	181.71	235.08	129.38
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	12	290.51	240.20	190.11	79.15	151.99	140.30	92.31
กลาง	9	8	167.74	163.93	82.56	50.37	292.01	291.46	99.81
ตะวันออก	2	2	42.50	37.50	10.97	29.26	14.49	14.49	9.97
ใต้	5	2	131.17	121.19	104.64	86.34	36.43	327.78	89.75
ไม่ชัดเจน	5	2	65.77	58.53	21.91	37.43	10.59	4.38	41.36

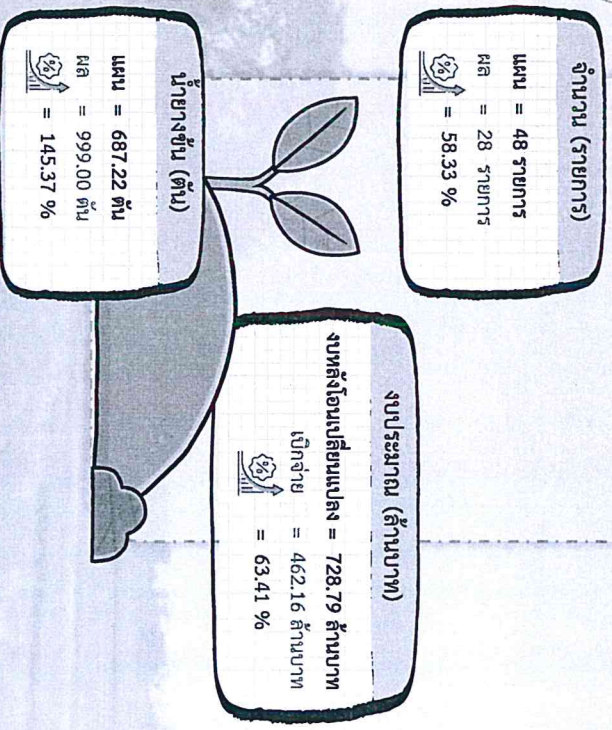

ผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหมู่บ้านภาคใต้
