



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖
ที่ กผง ๐๖/๔๕๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๘๑๐๖๗๘๐/๒๕๖๖
เรื่อง ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) ๑๒1635

เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๔ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๑,๖๓๔.๒๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๖๐๔.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๙ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๘๙๘.๐๔ ต้น ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๑,๓๕๓.๒๑ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๕๐.๖๘ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๖ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๘๕๑.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๗๒๘.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๕๖๔.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๗ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๖๘๗.๒๒ ต้น ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๑,๐๓๑.๖๑ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๕๐.๑๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสลลธิทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๖

- ทราบ

บิษัยศ นอ.สอ.๓๐๖.๓๐๖.๓๐๖.๓๐๖

เพื่อโปรดทราบ

(นายสมคิด สะภาคำ)

ผอท.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖

โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนำช่างพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้อย่างพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 134 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,634.22 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,604.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.19 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 898.04 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,353.21 ตัน คิดเป็นร้อยละ 150.68 ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 126 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- Para Asphalt Concrete จำนวน 130 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,605.81 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,576.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.16 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 792.54 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,246.07 ตัน คิดเป็นร้อยละ 157.22 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 122 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- Para Soil Cement จำนวน 4 รายการ งบประมาณจัดสรร 28.41 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 28.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 105.50 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 107.14 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.55 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

2. งบประมาณ ...

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพารา ในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าหัวงาน โครงการชลประทาน ประเภท Para Asphalt Concrete รวมทั้งสิ้น 48 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 851.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 728.75 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 564.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.47 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 687.22 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,031.61 ตัน คิดเป็นร้อยละ 150.11 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 33 รายการ



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566

กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้อย่างเหมาะสมงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ที่ดำเนินการต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2566



พ.ร.บ. 2565


ประเภท	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,634.22	134	898.04
ผล	1,604.70 (98.19%)	126	1,353.21 (150.68%)

Para Asphalt Concrete			Para Soil Cement			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,605.81	130	แผน	28.41	4	105.50
ผล	1,576.30 (98.16%)	122	ผล	28.40 (99.96%)	4	107.14 (101.55%)



หมายเหตุ : ยกเลิก 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการเงินกู้ พ.ศ. 2563 และงบประมาณที่เหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



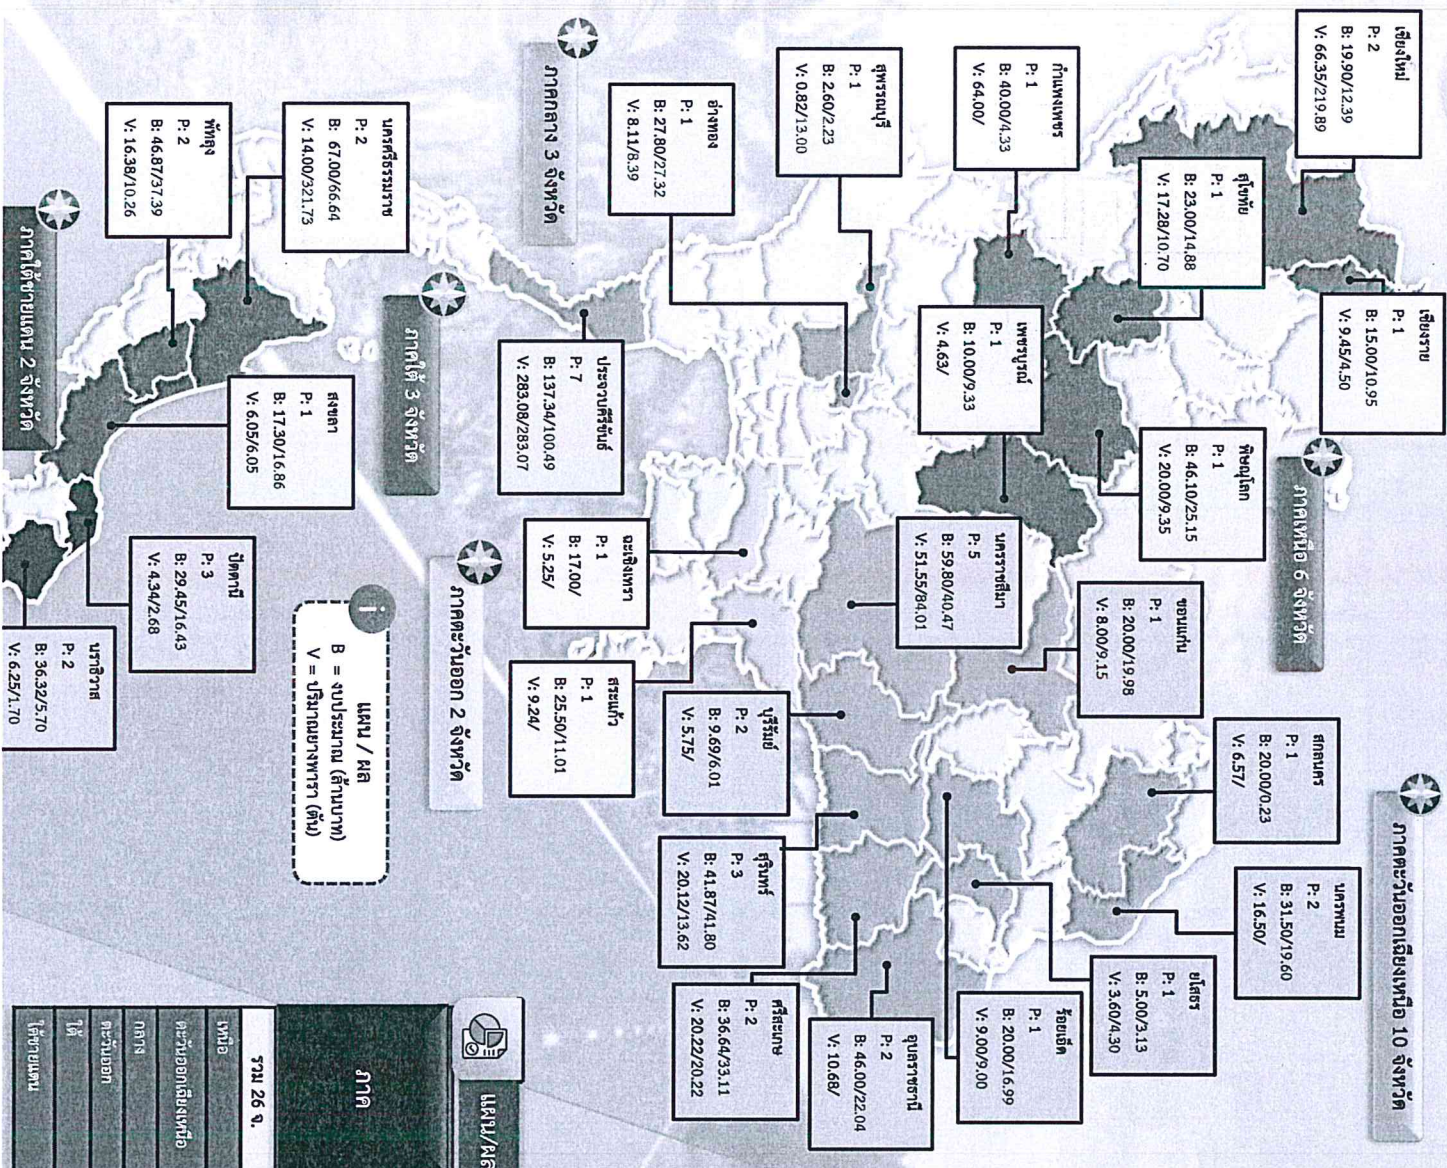

แผน / ผล
B = จำนวน (ทั้งหมด)
V = ปริมาณพืชที่ (ต้น)

ผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

จำนวน (รายการ)
แผน = 48 รายการ
ผล = 33 รายการ
= 68.75%

งบประมาณ (ล้านบาท)
งบตั้งโอนเปลี่ยนแปลง = 728.75 ล้านบาท
เบิกจ่าย = 564.56 ล้านบาท
= 77.47%

น้ำยางขั้น (ตัน)
แผน = 687.22 ตัน
ผล = 1,031.61 ตัน
= 150.11%

ภาค	จำนวน (รายการ)		งบประมาณ (ล้านบาท)					น้ำยางขั้น (ตัน)	
	แผน	ผล	งบตาม พ.ร.บ. 2566	งบตั้งโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	แผน	ผล	ร้อยละ
รวม 26 จ.	48	33	851.68	728.75	564.56	77.47	687.22	1,031.61	150.11
เหนือ	7	5	154.00	107.44	77.03	71.69	181.71	244.44	134.52
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	13	290.50	240.17	203.45	84.71	151.99	140.30	92.31
กลาง	9	9	167.74	163.93	130.05	79.33	292.01	304.45	104.26
ตะวันออก	2	2	42.50	37.50	11.01	29.37	14.49		
ใต้	5	3	131.17	121.18	120.89	99.76	36.43	338.04	927.92
ไม่ทราบ	5	3	65.77	58.53	22.13	37.80	10.59	4.38	41.36

แผน/ผลการดำเนินงาน
