



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๕๙๙/๒๕๖๖

วันที่ ๗/ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๙๑๖๒๒/๑๑๖๖๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) ๕๒๑๕๑๑

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑,๐๑๙ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๗๙ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๓๔ รายการ และยกเลิก ๖ รายการ เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และไม่สามารถหาผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการได้ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๐๙๒.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๔ งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด ๙๗๒.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๐ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๙๔๔.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๕ กย ๒๕๖๖

- ทราบ

6 ริ่มน พอ.ชวน, พอ.ช.ทศ., ทน๑-๙๗๐

๑๑๒ พมท.มอ. (งม.มอ., พต.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.๒๐

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,019 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 879 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง 134 รายการ และยกเลิก 6 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10,092.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.04 งบประมาณเหลือจ่าย จากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 972.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.10 **และงบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ 944.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.86**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 879 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 7,392.26 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 7,658.54 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7,606.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.31 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง **และงบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 52.47 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 134 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 4,566.02 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,345.46 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,486.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.22 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 914.33 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 944.50 ล้านบาท**

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 6 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 51.53 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 5.81 ล้านบาท เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และไม่สามารถ หาผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการได้

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		งบเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2565	งบเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,019	12,009.81	12,009.81	10,092.70	84.04	972.61	944.50
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	879	7,392.26	7,658.54	7,606.07	99.31	52.47	
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	134	4,566.02	4,345.46	2,486.63	57.22	914.33	944.50
3. ยกเลิกรายการ	6	51.53	5.81			5.81	

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 30 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 132 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 109 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 1,071.44 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,065.69 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 895.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.99 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 5.25 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 165.35 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 99 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 79 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 1,745.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,743.58 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,246.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.46 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 349.54 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 148.02 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 42 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 35 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ และยกเลิก จำนวน 3 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 559.83 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 513.13 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 266.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.01 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 109.32 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 136.91 ล้านบาท**

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2565	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,019	879	134	6	12,009.81	12,009.81	10,092.70	84.04	972.62	944.50
สขป.1	13	9	4		147.89	139.91	112.92	80.70	10.67	16.33
สขป.2	35	35			148.13	141.13	138.03	97.80	3.10	
สขป.3	13	8	5		208.41	208.34	160.60	77.08	10.226	37.52
สขป.4	11	11			36.03	35.76	34.08	95.30	1.68	
สขป.5	22	20	2		372.59	372.11	368.66	99.07	0.50	2.96
สขป.6	40	31	8	1	498.67	496.89	463.64	93.31	10.48	22.77
สขป.7	72	71	1		319.01	318.22	312.45	98.19	5.62	0.15
1 สขป.8	132	109	23		1,071.44	1,065.69	895.08	83.99	5.25	165.35
สขป.9	30	22	8		531.87	529.32	428.30	80.92	4.629	96.39

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกู้ ไว้เบิกเหลื่อมปี 2565	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/ เบิกไม่ทัน	งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ
สขป.10	32	29	2	1	179.34	176.04	141.85	80.58	2.20	31.99
3 สขป.11	42	35	4	3	559.83	513.13	266.90	52.01	109.32	136.91
สขป.12	20	18	2		327.28	324.84	266.64	82.08	57.88	0.32
สขป.13	35	30	5		330.26	315.02	309.33	98.19	2.52	3.17
สขป.14	40	38	2		564.75	563.80	538.08	95.44	19.82	5.90
สขป.15	106	100	6		687.46	686.65	656.35	95.59	4.58	25.72
สขป.16	50	47	2	1	770.05	759.20	726.13	95.64	2.12	30.95
สขป.17	21	21			152.41	151.79	150.57	99.19	1.22	
สบก.	24	16	8		127.47	122.07	72.25	59.19	27.36	22.46
สบอ.	47	46	1		311.74	311.52	242.60	77.88	1.32	67.60
สพญ.	99	76	23		2,481.86	2,457.88	2,015.83	82.02	327.95	114.09
2 กพท.	99	79	20		1,745.31	1,743.58	1,246.02	71.46	349.54	148.02
กพด.	1	1			0.74	0.74	0.74	100.00		
สมด.	8	5	3		9.95	9.95	8.95	89.98	0.96	0.04
สลก.	8	6	2		106.49	106.49	93.30	87.61	12.90	0.29
สสร.	1	1			13.94	13.94	13.94	100.00		
สอศ.	6	6			84.39	84.39	84.39	100.00		
ศทส.	2	2			10.26	10.26	10.26	100.00		
สคก.	2	2			26.31	26.39	26.39	100.00	0.0002	
สจด.	4	4			19.03	19.03	18.26	95.95	0.77	
Lump Sum	4	1	3		166.92	305.77	290.18	94.90	0.0002	15.59

อุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด


งบประมาณเงินก้อนใช้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ภาพรวม

งบประมาณเงินก้อนใช้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

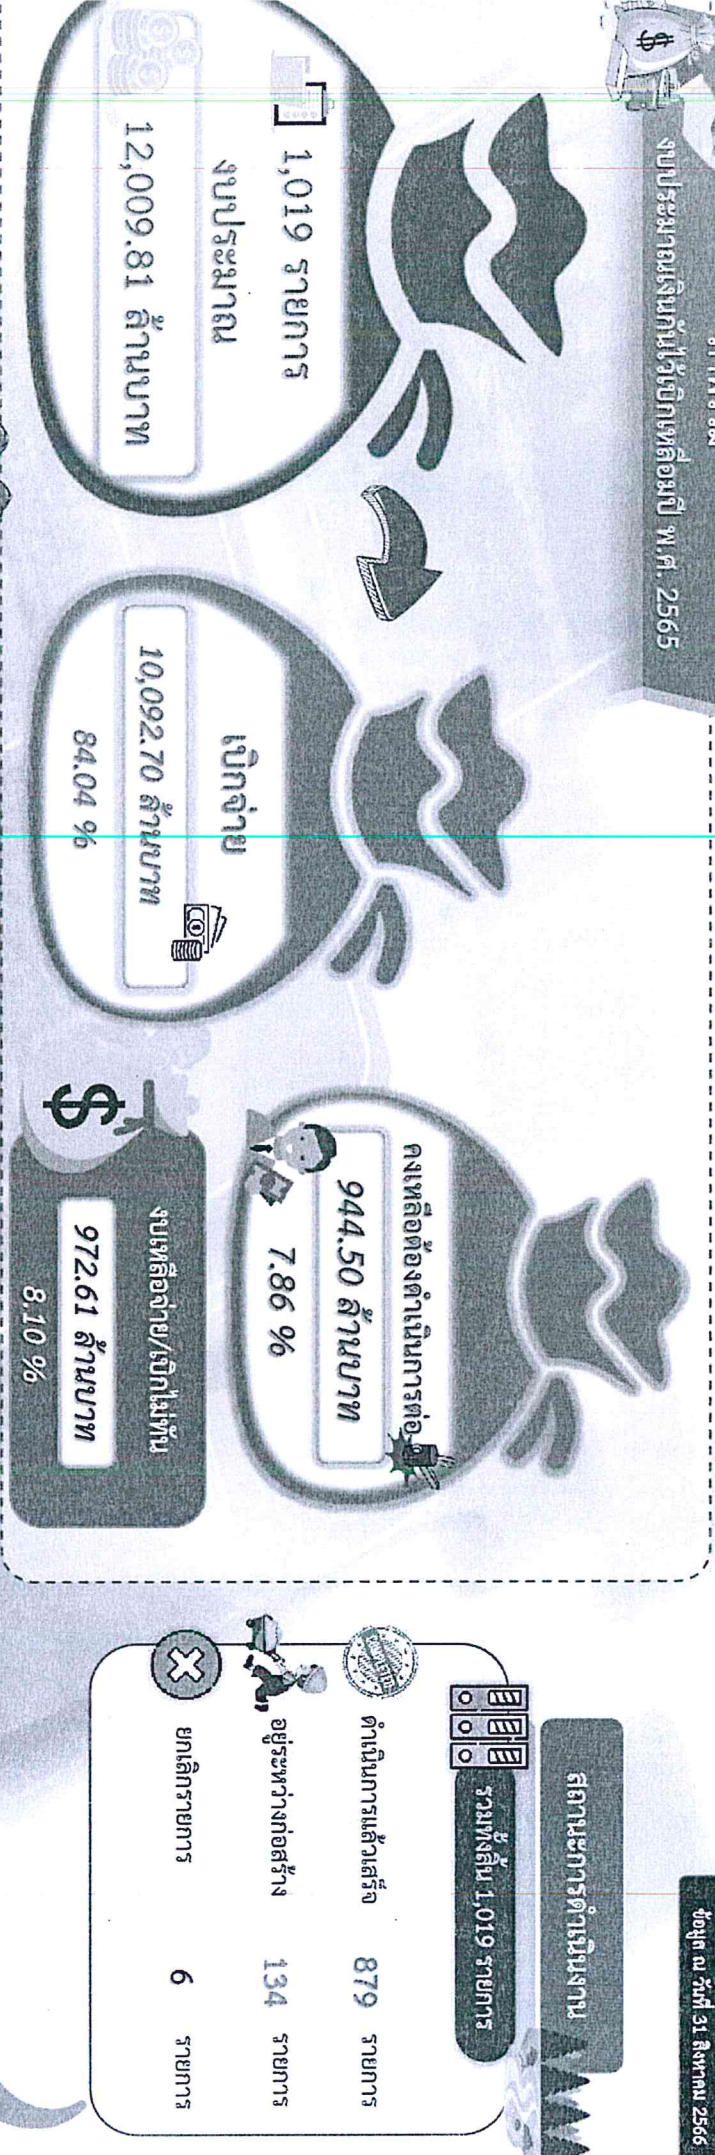

สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,019 ราชการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 879 ราชการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 134 ราชการ

ยกเลิกรายการ 6 ราชการ



ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด หรือตั้งงานทำให้กรมต้องยกเลิกสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
2. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

รวม	ค.ก. 65	พ.บ. 65	ร.ค. 65	ร.ค. 66	ก.พ. 66	ส.ค. 66	ม.บ. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ธ.ค. 66	ก.ย. 66	ก.ย. 100%
12,009.81	656.81	1,620.80	2,068.76	1,471.04	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01	461.22	51.66
10,092.70	656.81	1,358.74	1,408.54	862.88	752.79	1,520.36	601.61	928.38	826.47	400.01	776.11		
1,917.11		262.06	660.22	-608.16	-552.27	-618.37	310.93	494.29	293.83	210.56	609.10		

