



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘
ที่ กพง ๐๖/๕๓๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ศบอ ๙ ๗๖๖/๕๓๗.๒.๖๖
เรื่อง สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ ๒๒๒.๖๑๓
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทานได้กันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๗๔๔ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑๙ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕๒๕ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีทั้งสิ้น จำนวน ๗,๔๗๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๑๓.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๗ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน ๕,๘๖๖.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิทธิพย์ วีระวงษ์)
ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผวง.ผง.
เพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา ปานชำ)

ผชช.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖

-ทราบ

เรียน ผอ.ส.ค.ผ., ผอ.ร.ก.ค., ทน.๑-๙ ผอ.

เพื่อโปรดพิจารณา


(นายธนศร์ สมบูรณ์)
ผส.บอ.
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือมปี

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 66

ภาพรวม

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือมปี

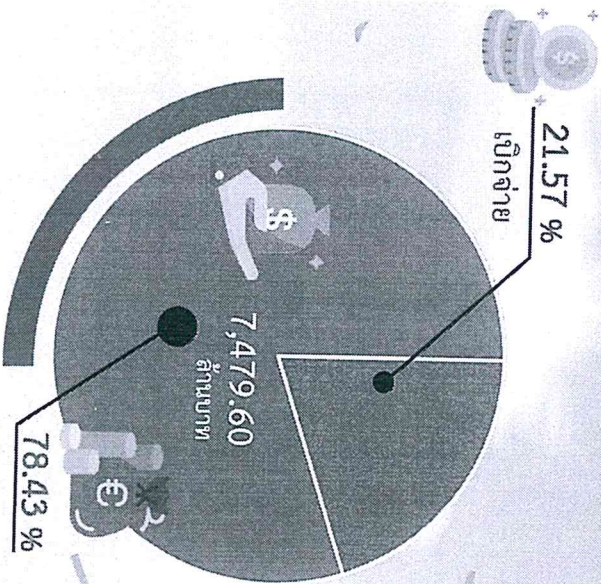

หน่วย : ล้านบาท

แผนง/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

ปีงบประมาณ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	รวม
งบประมาณ	797.71	797.71	797.71	797.71	797.71	797.71	797.71	797.71	797.71	797.71	7,479.60
งบประมาณ	815.69	815.69	815.69	815.69	815.69	815.69	815.69	815.69	815.69	815.69	1,613.40
คงเหลือต้องดำเนินการต่อ	-1,218.02	-1,218.02	-1,218.02	-1,218.02	-1,218.02	-1,218.02	-1,218.02	-1,218.02	-1,218.02	-1,218.02	-5,866.20

สถานะการดำเนินงาน 7/44 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 219 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 525 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคการรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างบางรายสั่งจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่ทันไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้หน่วยบริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากพื้นที่บางอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยว ผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการระลอกการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

งบประมาณ 40.43%
งบประมาณ 100%

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

กรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี
จำนวน 744 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 219 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
525 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 7,479.60 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 1,613.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.57 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 5,866.20
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.43

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 219 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 504.91
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 420.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.33 และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 84.16 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 525 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี
6,974.69 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,192.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.10 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
5,782.04 ล้านบาท

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)			
		งบประมาณเงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี 2566	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	744	7,479.60	1,613.40	21.57	5,866.20
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	219	504.91	420.75	83.33	84.16
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	525	6,974.69	1,192.65	17.10	5,782.04

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 34 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
ไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 94 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 17 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 77 รายการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,518.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 338.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.26
และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,180.53 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 82 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 33 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,200.12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 300.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.06
และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 899.39 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 40 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 15 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 563.85 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 140.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.88
และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 423.56 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินการ		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)			
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2566	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	744	219	525	7,479.60	1,613.40	21.57	5,866.20
สขป. 1	29	5	24	76.01	10.03	13.20	65.98
สขป. 2	18	10	8	35.90	11.29	31.46	24.61
สขป. 3	22	5	17	127.16	39.29	30.89	87.88
สขป. 4	10	1	9	168.04	13.92	8.28	154.12
สขป. 5	22	5	17	100.00	14.59	14.59	85.41
สขป. 6	19	3	16	176.54	8.77	4.97	167.77
สขป. 7	31	2	29	407.57	47.81	11.73	359.76
สขป. 8	72	24	48	520.80	101.91	19.57	418.89
สขป. 9	35	7	28	394.12	68.90	17.48	325.23
สขป. 10	11	2	9	100.63	29.22	29.04	71.40
สขป. 11	15	1	14	253.77	65.74	25.91	188.03
สขป. 12	9	4	5	111.98	21.85	19.51	90.13
สขป. 13	19		19	340.89	10.83	3.18	330.06
สขป. 14	50	15	35	337.26	47.93	14.21	289.33
สขป. 15	27	18	9	110.87	20.76	18.72	90.12
3 สขป. 16	40	15	25	563.85	140.29	24.88	423.56
สขป. 17	24	8	16	233.12	77.03	33.04	156.09
สบอ.	42	25	17	115.39	34.50	29.90	80.88
2 กทก.	82	33	49	1,200.12	300.73	25.06	899.39
กพด.	1		1	3.97	0.60	15.00	3.37
กตช.	1		1	0.15			0.15
สพข.	2		2	3.61	0.76	21.08	2.85
สมต.	10	3	7	147.34	136.81	92.85	10.53
สคก.	10	4	6	17.01	2.12	12.48	14.88
สจต.	8	2	6	31.60	4.41	13.97	27.18
สลก.	3		3	54.82	0.18	0.33	54.64
สบก.	21	3	18	162.71	6.73	4.13	155.98
1 สพญ.	94	17	77	1,518.62	338.09	22.26	1,180.53
สวพ.	1	1		0.194	0.193	99.38	0.001
สสร.	2	2		0.03			0.03
สอส.	4		4	56.69			56.69
กพร.	1	1		2.15	2.15	100.00	0.00
กผง.	1		1	3.96			3.96
Lump Sum	8	3	5	102.73	55.97	54.48	46.76

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม

2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

4. เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่

2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง

4. เร่งรัดดำเนินงานหลังจากเกษตรกรเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ
