



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘
 ที่ กพง ๐๖/๕๓๓/๑๕๖๓ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๙๒๓/๑๒/๑๓.๓.๑๗
 เรื่อง สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗
 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗)

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗
 โดยกรมชลประทานได้กันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗๔๔
 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕๒ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
 จำนวน ๓๙๒ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีทั้งสิ้น จำนวน ๗,๔๗๙.๖๐ ล้านบาท
 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๗๘๙.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๗ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน
 ๓,๖๘๙.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผว.ผง.
เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๕ ก.พ. ๒๕๖๗

-ทราบ

ไปน ผอ.ส่วน, ผอ.ธ.ภาค, ทน. ๑-๙ ผอ.

เพื่อโปรดทราบ/แจ้งหัวหน้าส่วน

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567.

กรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี
จำนวน 744 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 352 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
392 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 7,479.60 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 3,789.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.67 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 3,689.94
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.33

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 352 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,445.87
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,406.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.31 และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 38.92 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 392 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี
6,033.73 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,382.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.49 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
3,651.02 ล้านบาท

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)			
		งบประมาณเงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี 2566	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	744	7,479.60	3,789.66	50.67	3,689.94
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	352	1,445.87	1,406.95	97.31	38.92
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	392	6,033.73	2,382.71	39.49	3,651.02

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 34 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
ไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 94 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 36 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,518.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 683.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.99
และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 835.43 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 82 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 44 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,200.12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 649.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.09
และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 551.02 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 40 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 25 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 563.85 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 322.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.24
และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 241.11 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะผลการดำเนินการ		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)			
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณเงินกันไว้ เบิกเหลือปี 2566	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	744	352	392	7,479.60	3,789.66	50.67	3,689.94
สขป. 1	29	12	17	77.41	27.48	35.50	49.93
สขป. 2	18	10	8	35.90	28.42	79.14	7.49
สขป. 3	22	10	12	127.16	90.80	71.40	36.37
สขป. 4	10	3	7	168.04	35.09	20.88	132.95
สขป. 5	22	9	13	100.00	46.63	46.62	53.38
สขป. 6	19	6	13	176.54	60.19	34.09	116.35
สขป. 7	31	21	10	407.57	239.39	58.74	168.18
สขป. 8	72	35	37	520.80	293.16	56.29	227.64
สขป. 9	35	18	17	394.12	196.76	49.92	197.37
สขป. 10	11	3	8	100.63	48.56	48.26	52.07
สขป. 11	15	2	13	253.77	138.39	54.53	115.38
สขป. 12	9	5	4	111.98	56.10	50.10	55.88
สขป. 13	19	4	15	340.89	147.63	43.31	193.26
สขป. 14	50	16	34	337.26	115.21	34.16	222.05
สขป. 15	27	20	7	110.87	100.50	90.65	10.37
3 สขป. 16	40	25	15	563.85	322.74	57.24	241.11
สขป. 17	24	10	14	233.12	147.95	63.46	85.17
* สบอ.	42	32	10	115.39	62.41	54.09	52.97 *
2 กพท.	82	44	38	1,200.12	649.10	54.09	551.02
กพด.	1		1	3.97	0.60	15.00	3.37
กสช.	1	1		0.15	0.15	100.00	
สพช.	2		2	3.61	2.13	59.09	1.48
สมต.	10	4	6	147.34	138.41	93.94	8.93
สคค.	10	5	5	15.61	15.38	98.55	0.23
สจค.	8	4	4	31.60	21.58	68.28	10.02
สลก.	3		3	54.82	11.87	21.66	42.95
สบก.	21	7	14	162.71	35.09	21.57	127.62
1 สพญ.	94	36	58	1,518.62	683.19	44.99	835.43
สวพ.	1	1		0.19	0.19	100.00	
สสธ.	2	2		0.03			0.03
สอศ.	4	2	2	56.69	0.55	0.98	56.13
กพร.	1	1		2.15	2.15	100.00	
กผง.	1		1	3.96	1.49	37.50	2.48
Lump Sum	8	4	4	102.73	70.40	68.53	32.33

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด


แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
4. เร่งรัดดำเนินงานหลังจากเกษตรกรเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือในปี

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567

ภาพรวม งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือในปี

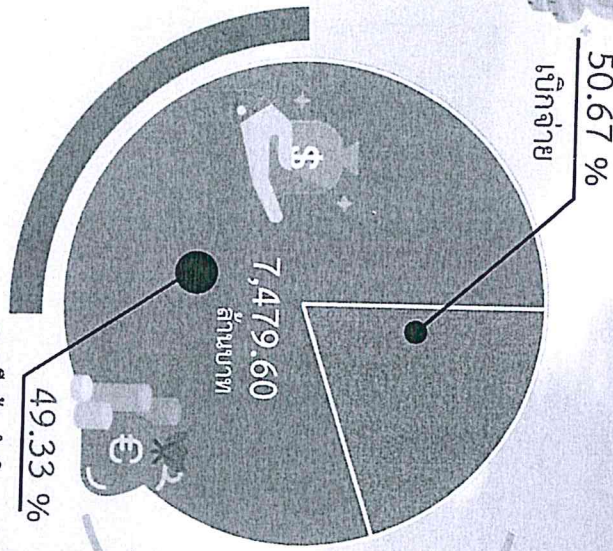

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

แผน	ท.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	รวม	งบฯ	
งบฯ	7,479.60	797.71	2,033.71	1,248.99	796.57	765.38	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.58	132.23	40.43	เบิก 100%
ผลต่าง	3,789.66	797.71	1,399.12	1,090.73	502.10	765.38	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.58	132.23	40.43	
งบฯ	3,689.94	-	-634.59	-158.26	-294.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

สถานะการดำเนินงาน 744 รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ: 352 รายการ
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง: 392 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดความหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้ที่ข่าวมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากพื้นที่บางอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเกี่ยวเกี่ยว ผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
