



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ที่ กผง ๐๖/๙/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ลม๐๑๕๗/รณ๐.๖๗
 เรื่อง สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ๓๒๑๔๘
 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทานได้กั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗๔๔ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐๐ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๔๔๔ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งสิ้น ๗,๔๗๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๒๘๗.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๕ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๔,๑๙๒.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิทธิพิทย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผว.ผง.
เพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา ปานชา)

ผช.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

๕ ม.ค. ๒๕๖๗

-ทราบ

โยน ผอ.สงน., ผอ.ภค., ทน. ๑-๙ มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๕ ม.ค. ๒๕๖๗

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือมปี
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

กรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 744 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 300 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 444 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 7,479.60 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,287.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.95 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 4,192.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.05**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 300 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,011.70 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 974.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.36 **และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 36.84 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 444 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 6,467.90 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,312.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.76 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 4,155.20 ล้านบาท**

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)			
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2566	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	744	7,479.60	3,287.56	43.95	4,192.04
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	300	1,011.70	974.86	96.36	36.84
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	444	6,467.90	2,312.70	35.76	4,155.20

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 34 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 94 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 29 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 65 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,518.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 589.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.82 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 929.11 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 82 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 41 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 41 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,200.12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 595.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.62 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 604.67 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 72 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 31 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 41 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 520.80 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 242.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.61 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 278.04 ล้านบาท**

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะผลการดำเนินการ		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)			
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิก เหลือปี 2566	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	744	300	444	7,479.60	3,287.56	43.95	4,192.04
สขป. 1	29	9	20	77.41	24.87	32.13	52.54
สขป. 2	18	10	8	35.90	28.42	79.15	7.49
สขป. 3	22	8	14	127.16	71.96	56.59	55.20
สขป. 4	10	3	7	168.04	31.36	18.66	136.68
สขป. 5	22	7	15	100.00	27.22	27.22	72.78
สขป. 6	19	5	14	176.54	58.15	32.94	118.39
สขป. 7	31	14	17	407.57	203.85	50.02	203.72
3 สขป. 8	72	31	41	520.80	242.76	46.61	278.04
สขป. 9	35	17	18	394.12	177.99	45.16	216.13
สขป. 10	11	3	8	100.63	46.92	46.63	53.71
สขป. 11	15	2	13	253.77	124.32	48.99	129.45
สขป. 12	9	5	4	111.98	47.78	42.67	64.20
สขป. 13	19	4	15	340.89	118.36	34.72	222.53
สขป. 14	50	16	34	337.26	105.30	31.22	231.95
สขป. 15	27	19	8	110.87	91.17	82.23	19.70
สขป. 16	40	20	20	563.85	293.89	52.12	269.96
สขป. 17	24	8	16	233.12	104.02	44.62	129.10
สบอ.	42	25	17	115.39	38.47	33.34	76.91
2 กพท.	82	41	41	1,200.12	595.45	49.62	604.67
กพด.	1		1	3.97	0.60	15.00	3.37
กสช.	1	1		0.15	0.15	100.00	
สพช.	2		2	3.61	1.24	34.25	2.37
สมด.	10	4	6	147.34	138.41	93.94	8.93
สคก.	10	4	6	15.61	15.38	98.53	0.23
สจด.	8	2	6	31.60	11.54	36.53	20.05
สลก.	3		3	54.82	11.82	21.56	43.00
สบก.	21	4	17	162.71	20.56	12.64	142.15
1 สพญ.	94	29	65	1,518.62	589.51	38.82	929.11
สวพ.	1	1		0.19	0.19	100.00	
สสร.	2	2		0.03			0.03
สอส.	4	2	2	56.69	0.55	0.98	56.13
กพร.	1	1		2.15	2.15	100.00	
กผง.	1		1	3.96	1.49	37.50	2.48
Lump Sum	8	3	5	102.73	61.69	60.05	41.04

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข


1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
4. เร่งรัดดำเนินงานหลังจากเกษตรกรเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือมปี

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

ภาพรวม

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือมปี

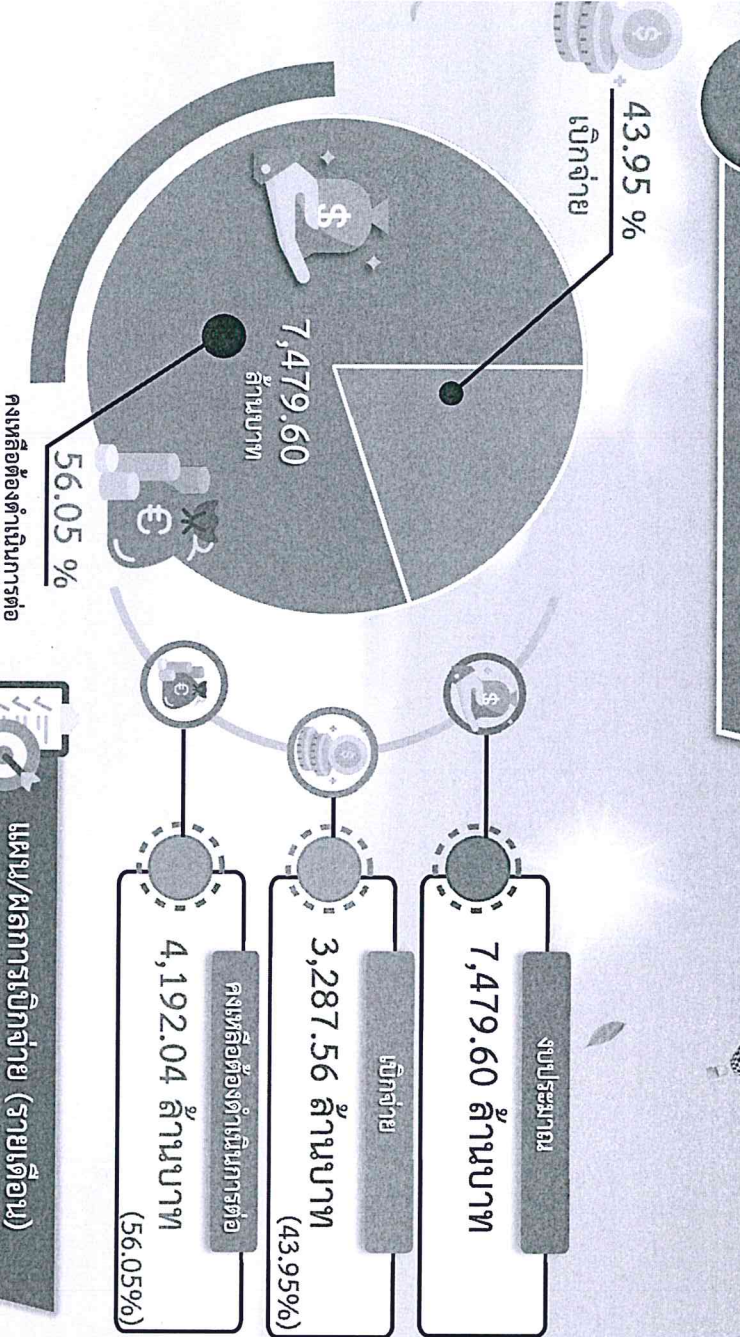

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

แผน	รวม	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	พฤศจิกายน 67	ธันวาคม 67
งบ	7,479.60	797.71	2,033.71	1,248.99	796.57	765.38	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.58	132.23	40.45	40.45
เบิก	3,287.56	797.71	1,399.12	1,090.73											
เหลือ	4,192.04	-	-634.59	-158.26											

สถานะการดำเนินงาน 744 รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ: 300 รายการ
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง: 444 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้หน้าจอมบิลบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ทำงานอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยว ผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการลดการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
