



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ กพง ๐๖/๑๕๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.บ. ๒๖๐๖/๒๕๖๗

เรื่อง สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑๕๗๖๘

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยกรมชลประทานได้กังบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗๔๔ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๖๘ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๗๖ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีทั้งสิ้น จำนวน ๗,๔๗๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๗๔๙.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๐ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน ๒,๗๓๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิลทิพย์ วีระวงศ์)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผว.ผง.  
เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗

-ทราบ

โดย ผอ.กอง, ผอ.ทค., ทน.๑-๗ มอ.

(นายเนนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ. ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือมี  
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือมีจำนวน 744 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 468 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 276 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 7,479.60 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,749.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.50 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 2,730.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.50

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2566 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 468 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี 2,308.77 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,263.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.03 และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 45.45 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 276 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี 5,170.83 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,485.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.08 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 2,684.95 ล้านบาท

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)			
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี 2566	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	744	7,479.60	4,749.20	63.50	2,730.40
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	468	2,308.77	2,263.32	98.03	45.45
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	276	5,170.83	2,485.88	48.08	2,684.95

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 34 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 94 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 59 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี 1,518.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 826.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.44 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 691.87 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 82 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 57 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี 1,200.12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 765.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.83 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 434.14 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 14 จำนวน 50 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 26 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี 337.26 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 149.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.26 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 187.97 ล้านบาท



ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะผลการดำเนินการ		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)			
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณเงินกันไว้ เบิกเหลือปี 2566	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	744	468	276	7,479.60	4,749.20	63.50	2,730.40
สขป. 1	29	18	11	77.41	38.07	49.17	39.35
สขป. 2	18	14	4	35.90	29.43	81.96	6.48
สขป. 3	22	12	10	127.16	102.97	80.98	24.19
สขป. 4	10	3	7	168.04	41.98	24.98	126.05
สขป. 5	22	12	10	100.00	63.05	63.05	36.95
สขป. 6	19	9	10	176.54	73.25	41.49	103.29
สขป. 7	31	24	7	407.57	327.71	80.41	79.86
สขป. 8	72	41	31	520.80	381.41	73.24	139.39
สขป. 9	35	24	11	394.12	277.09	70.31	117.03
สขป. 10	11	4	7	100.63	61.05	60.68	39.57
สขป. 11	15	5	10	253.77	183.20	72.19	70.56
สขป. 12	9	8	1	111.98	101.72	90.84	10.26
สขป. 13	19	8	11	340.89	189.05	55.46	151.83
3 สขป. 14	50	26	24	337.26	149.29	44.26	187.97
สขป. 15	27	22	5	110.87	100.63	90.76	10.24
สขป. 16	40	27	13	563.85	391.24	69.39	172.61
สขป. 17	24	16	8	233.12	168.28	72.19	64.84
สบอ.	42	37	5	115.39	102.27	88.63	13.11
2 กพก.	82	57	25	1,200.12	765.98	63.83	434.14
กพด.	1		1	3.97	2.98	75.00	0.99
กสช.	1	1		0.15	0.15	100.00	
สปพช.	2		2	3.61	3.07	85.13	0.54
สมด.	10	6	4	147.34	138.43	93.96	8.91
สคก.	10	10		15.61	15.46	99.06	0.15
สจด.	8	5	3	31.60	28.60	90.52	2.99
สลก.	3		3	54.82	27.03	49.30	27.79
สบก.	21	10	11	162.71	53.40	32.82	109.31
1 สพญ.	94	59	35	1,518.62	826.75	54.44	691.87
สวพ.	1	1		0.19	0.19	100.00	
สสร.	2	2		0.03			0.03
สอส.	4	2	2	56.69	21.78	38.43	34.90
กพร.	1	1		2.15	2.15	100.00	
กผง.	1		1	3.96	1.49	37.50	2.48
Lump Sum	8	4	4	102.73	80.03	77.90	22.70

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
4. เร่งรัดดำเนินงานหลังจากเกษตรกรเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ


\*\*\*\*\*



# งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือมปี

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567

ภาพรวม งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือมปี

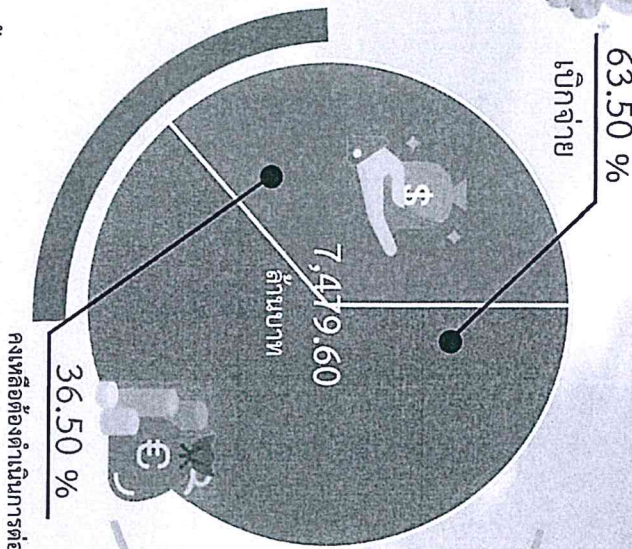

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

แผน	รวม	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	งบคงเหลือ
งบ	7,479.60	797.71	2,033.71	1,248.99	796.57	765.38	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.58	172.66	40.43	40.43
ผล	4,749.20	797.71	1,399.12	1,090.73	502.10	542.39	417.15	385.30	227.91	223.67	107.31	68.58	172.66	100%	100%
ผลต่าง	2,730.40	-	-634.59	-158.26	-294.47	-222.99	-234.66	-	-	-	-	-	-	-	-

สถานะการดำเนินงาน 744 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 468 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 276 รายการ

## ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

- แม่แบบงาน แม่ข่ายสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่เข้าไปตามแผนที่กำหนด
- เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้หน้างานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- เนื่องจากพื้นที่บางอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเกี่ยวข้าว ผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
