



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ที่ กผง ๐๖/๑๕/๒๕๖๖ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ ๕๒๐ ๒๙๔/๑๐๓.๐.๖๗
 เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการก่องหน้ผูกพันรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ๕๒๑.๐๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง ๐๖/๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ได้จัดทำสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๑,๖๒๔ รายการ งบประมาณ ๑๔,๕๔๒.๐๖๓๔ ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จากระบบติดตาม Cen-Project ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ มีรายการที่ก่องหน้ผูกพันแล้ว จำนวน ๙๔๘ รายการ งบประมาณ ๑๒,๙๙๔.๙๔๔๗ ล้านบาท และยังไม่ก่องหน้ผูกพัน จำนวน ๖๗๖ รายการ งบประมาณ ๑,๕๔๗.๑๑๘๗ ล้านบาท (ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓๖๒ รายการ งบประมาณ ๑,๐๐๕.๘๒๘๘ ล้านบาท อนุมัติแผน จำนวน ๒๓๙ รายการ งบประมาณ ๕๖๑.๒๘๙๙ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๑ รายการ งบประมาณ ๑๓.๘๓๗๒ ล้านบาท เปิดซอง จำนวน ๒๓ รายการ งบประมาณ ๒๓.๙๒๖๗ และอนุมัติรับราคา จำนวน ๔๑ รายการ งบประมาณ ๓๓.๙๖๑๙ ล้านบาท) นั้น

ในการนี้ จึงขอให้หน่วยงานของท่าน ดำเนินการ ดังนี้

- เร่งรัดดำเนินการก่องหน้ผูกพันรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ให้แล้วเสร็จทุกรายการโดยเร็ว และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- เร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

เดือน/ปี	ภาพรวม		ประจำ		ลงทุน	
	ใช้จ่าย (แผน กข)	เบิกจ่าย (มติ ครม. 27 ก.ย. 65)	ใช้จ่าย (แผน กข)	เบิกจ่าย (มติ ครม. 27 ก.ย. 65)	ใช้จ่าย (แผน กข)	เบิกจ่าย (มติ ครม. 27 ก.ย. 65)
ต.ค. 66	10.28	10.66	13.69	11.66	5.57	6.33
พ.ย. 66	22.90	21.33	26.82	23.33	19.88	12.66
ธ.ค.66 (สิ้นไตรมาส 1)	39.29	32.00	40.33	35.00	37.87	19.00
ม.ค.67	52.11	38.66	53.00	41.66	50.89	25.66
ก.พ.67	66.27	45.33	65.47	48.33	67.36	32.33
มี.ค.67 (สิ้นไตรมาส 2)	78.09	52.00	77.69	55.00	78.62	39.00
เม.ย.67	90.07	59.66	89.71	63.33	90.55	45.00
พ.ค.67	99.99	67.33	99.98	71.66	100.00	51.00
มิ.ย.67 (สิ้นไตรมาส 3)	99.99	75.00	99.99	80.00	100.00	57.00
ก.ค.67	99.99	81.00	99.99	86.00	100.00	63.00
ส.ค.67	99.99	87.00	99.99	92.00	100.00	69.00
ก.ย.67 (สิ้นไตรมาส 4)	100.00	93.00	100.00	98.00	100.00	75.00

๓. รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละรายการงานในระบบติดตาม Cen-Project ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยกองแผนงานจะดึงข้อมูลจากระบบ เพื่อสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกแหล่งงบประมาณ ทุก ๑๕ วัน เสนอผู้บริหารกรม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ทั้งนี้ ได้แนบรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว


(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.



รายละเอียดรายการงาน
ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

๖ โมง นอ.สว. นอช.ภค.ทท.๑-๗ นอ.

เพื่อโปรดพิจารณา



(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๑๓/๒๕๖๗ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลลิตทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา ปานชา)

ผชช.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

- ๘ ม.ค. ๒๕๖๗

**สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566)**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 5 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 34,044.09 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 13,149.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.62 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 4,387 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 535 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.20 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 902 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.56 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1,682 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.34 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,267 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.88 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.02 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบประมาณ จำนวน 19,534.84 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 6,074.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.10 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 4,462.36 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,639.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.73 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 15,072.48 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 4,435.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.43 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,624 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 362 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.29 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 314 รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.33 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 917 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.47 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 31 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.91

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กั้นไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ จำนวน 7,479.60 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,287.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.95 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 4,192.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.05 จำนวนรายการทั้งสิ้น 744 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 444 รายการ คิดเป็นร้อยละ 59.68 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 300 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.32

3. งบกลาง พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 5,138.65 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,743.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.85 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 275 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.80 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 930 รายการ คิดเป็นร้อยละ 77.12 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 คือ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา


4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ จำนวน 1,201.99 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 0.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 732 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 173 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.63 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 553 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75.55 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.82

5. กองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ จำนวน 689.01 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 42.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.21 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 81 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 35 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.21 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.79



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

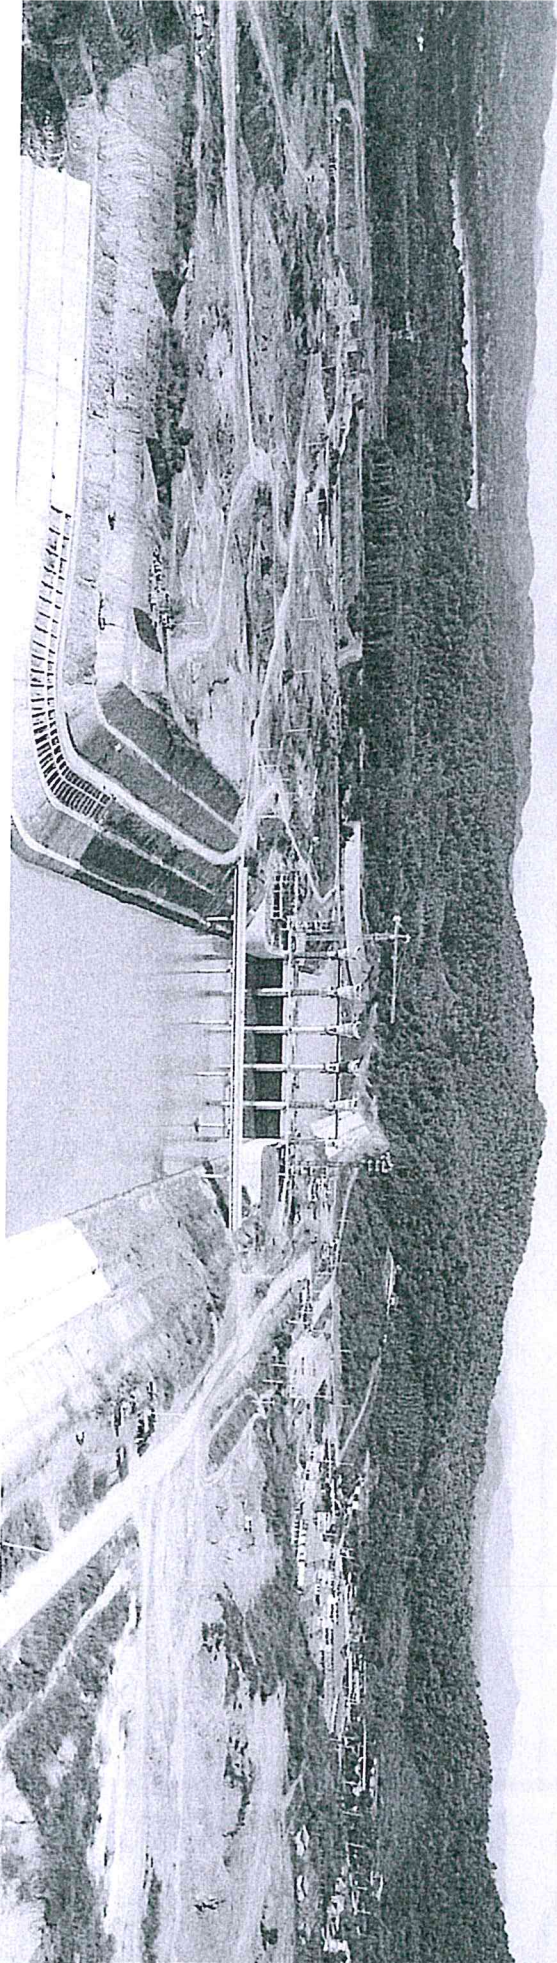

จัดทำโดย :
ส่วนติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน



รายละเอียดข้อมูล

- 1 > สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- 2 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
 - 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (ภาพรวม)
 - 2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน จำแนกตามสำนัก/กอง
 - 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน งบประมาณรายจ่าย ไปพลางก่อน
 - 2.4 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566
 - 2.5 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566
- 3 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กั้นไว้เบิกเหลือในปี
- 4 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 5 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- 6 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



1

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



รายละเอียดงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)




ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)

หมายเหตุ


รายการ	รวมทั้งสิ้น		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)						หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	34,044.09	13,149.14	38.62	4,387	535	902	1,682	1,267	ยกเลิก 1 รายการ
1.1 งบรายจ่ายประจำ	19,534.84	6,074.43	31.10	1,624	362	314	917	31	
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	4,462.36	1,639.03	36.73						
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือในปี	15,072.48	4,435.40	29.43	1,624	362	314	917	31	
3. งบกลาง พ.ศ. 2566	7,479.60	3,287.56	43.95	744			444	300	
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	5,138.65	3,743.58	72.85	1,206			275	930	ยกเลิก 1 รายการ
- โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทิมหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)	4,207.98	3,051.77	72.52	1,154			247	906	ยกเลิก 1 รายการ
- โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ไว้รับช่วยระบบไฮดรอลิค	8.86	7.77	87.70	1				1	
- โครงการจัดหาถังเก็บน้ำดิบที่รั่วซึมด้วยระบบไฮดรอลิค	395.50			2			2		
- โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหาย	2,954.40	2,648.90	89.66	1,142			237	904	ยกเลิก 1 รายการ
เนื่องจากอุทกภัยปี 2565									
- โครงการจัดหาถังเก็บน้ำดิบที่รั่วซึมด้วยระบบไฮดรอลิค	48.96	48.96	100.00	1				1	
ทดแทนงบประมาณที่ถูกปรับไปตามกฎหมาย									
- โครงการผ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการตนเองวิจัย)	300.00	300.00	100.00	1			1		
- โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่	500.26	345.59	69.08	7			7		
3.2 โครงการอื่นเมื่อมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2566	930.67	691.81	74.33	52			28	24	
4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2567	1,201.99	0.80	0.07	732	173	553		6	
5. กองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2567	689.01	42.77	6.21	81		35	46		

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (จป พ.ร.บ.)
 2.1 สรุปผลการขอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (ภาพรวม)

ข้อมูลจาก ระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566



ผลการดำเนินงาน

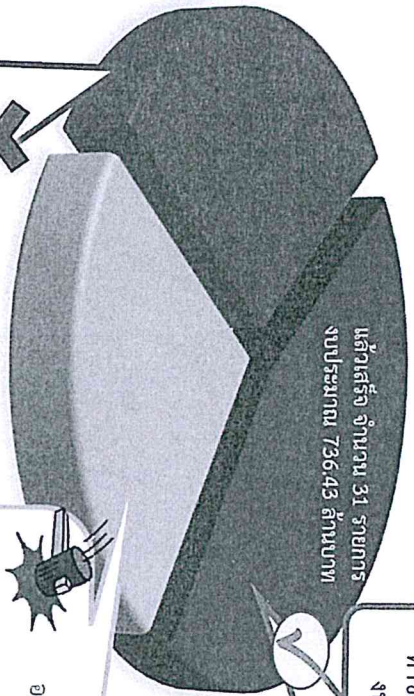

- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- อนุมัติแผน 239 รายการ งบประมาณ 469.56 ล้านบาท
 - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11 รายการ งบประมาณ 13.84 ล้านบาท
 - เปิดซอง 23 รายการ งบประมาณ 23.93 ล้านบาท
 - อนุมัติรับราคา 41 รายการ งบประมาณ 33.96 ล้านบาท

❌ ยังไม่ดำเนินการ ⚡ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ✓ ก่อหนี้ผูกพัน

2.2

สรุปผลการก่อสร้างผู้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน จำนวนตามสำนัก/กอง - ส่วนกลาง

ข้อมูลจากระบบ Gen Project ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

ยังไม่ดำเนินการตั้งอนุมัติแผน
 ปรากฏจัดซื้อจัดจ้าง
 เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา



รายการที่ยังไม่ก่อสร้างผู้ผูกพัน 673 รายการ
 งบประมาณ 1,496.45 ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ ผู้ผูกพัน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการตั้งอนุมัติแผน		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง ถึงอนุมัติรับราคา		จำนวนผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	1,619	14,310.64	598	1,424.72	11	13.84	64	57.89	946	12,814.19
กทท.	98	5,407.94	10	18.03			1	0.85	87	5,389.05
สทญ.	122	4,307.44	50	395.20					72	3,912.24
สทค.	152	71.71	75	32.76					77	38.95
สทบ.	77	172.03	56	138.76			2	0.36	19	32.91
สทบ.	28	325.69	2	1.60					26	324.09
สจก.	6	1.22	4	0.57					2	0.64
สทล.	2	33.57	1	0.85					1	32.72
สทธ.	22	251.40	15	71.47			1	4.11	6	175.82
สทอ.	13	250.45	1	6.67					12	243.78
สทต.	32	1,569.19	7	90.56					25	1,478.63

ยังไม่ก่อสร้างผู้ผูกพัน 673 รายการ

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ 1
 ใ้รวมรายการ Lump Sum จำนวน 5
 รายการ งบประมาณ 231.42 ล้านบาท

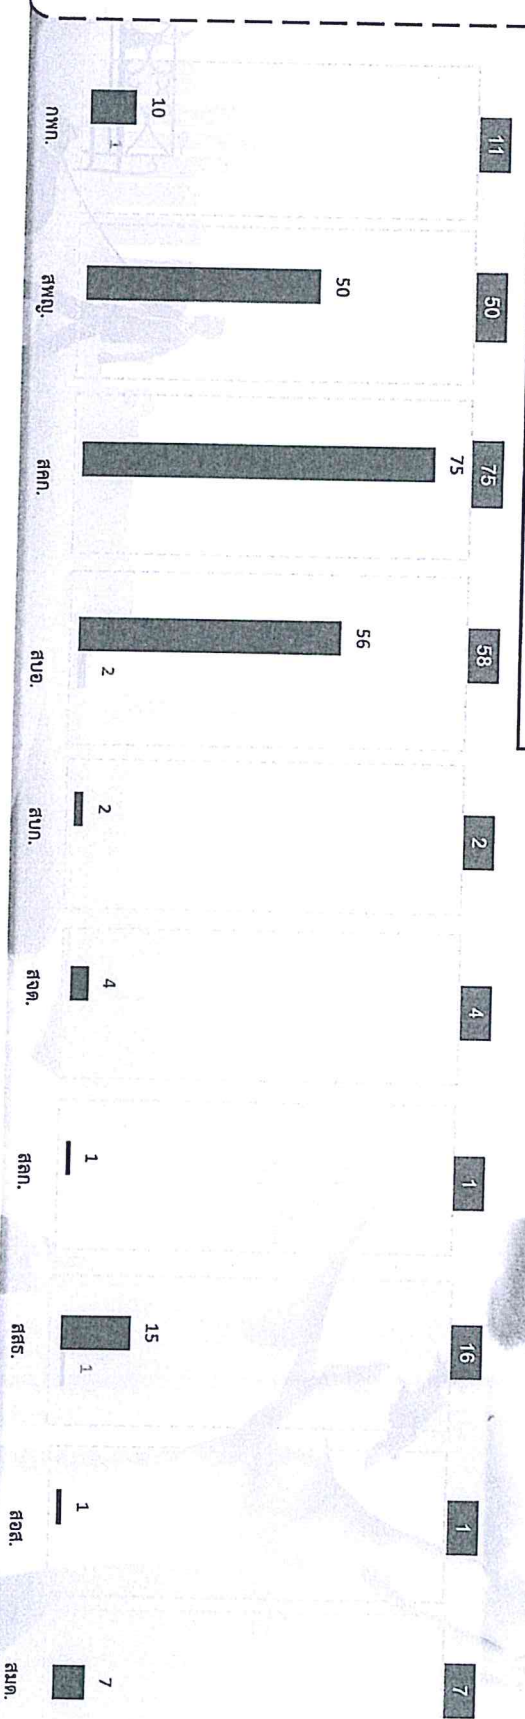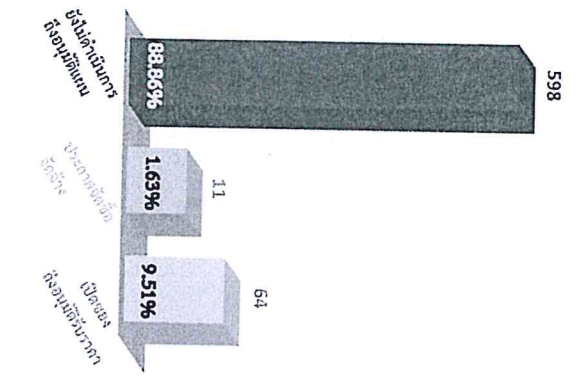

สรุปผลการทอหมื่นผู้กัพพ่น จบประมาณรายจ่ายลทุนประจำปี 2566 ไปพลากก่อน จํานนตามลํานัก/กอง - ส่วนภูมิภาค


ข้อมูลจากระบบ Gen Project ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

ยังไม่ทอหมื่นผู้กัพพ่น 673 รายการ

ลํานัก	จํานนรายการ ผู้กัพพ่น	งบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการทอ อุมตแผน		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง ลิ่งอุมตรับราคา		กัซอุมกัพพ่น	
			จํานน	งบประมาณ	จํานน	งบประมาณ	จํานน	งบประมาณ	จํานน	งบประมาณ
สทป. 1	33	50.65	10	13.18			3	6.35	20	31.12
สทป. 2	21	239.02	7	197.81	1	0.34			13	40.86
สทป. 3	56	243.66	32	38.06			6	7.30	18	198.30
สทป. 4	40	120.58	16	24.67	1	1.12	5	6.94	18	87.84
สทป. 5	40	155.81	11	9.86	2	6.12			27	139.84
สทป. 6	43	69.75	18	31.73			1	1.12	24	36.90
สทป. 7	31	40.52	13	19.01	1	0.25			17	21.26
สทป. 8	52	81.99	24	23.84					28	58.15
สทป. 9	91	185.86	43	99.31	1	0.50	4	3.44	43	82.60

ยังไม่ทอหมื่นผู้กัพพ่น 673 รายการ

ลํานัก	จํานนรายการ ผู้กัพพ่น	งบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการทอ อุมตแผน		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง ลิ่งอุมตรับราคา		รวม : ลํานนบท	
			จํานน	งบประมาณ	จํานน	งบประมาณ	จํานน	งบประมาณ	จํานน	งบประมาณ
สทป. 10	149	92.31	84	37.91			16	5.51	49	48.88
สทป. 11	97	178.12	35	13.58	3	3.91	2	0.22	57	160.41
สทป. 12	97	72.29	14	2.13			8	3.24	75	66.91
สทป. 13	89	70.67	8	4.30	1	0.23	1	1.74	79	64.41
สทป. 14	46	60.26	18	24.23			14	16.68	14	19.34
สทป. 15	82	57.60	32	14.46	1	1.37			49	41.77
สทป. 16	61	157.61	10	112.02					51	45.59
สทป. 17	39	43.31	2	2.14					37	41.17

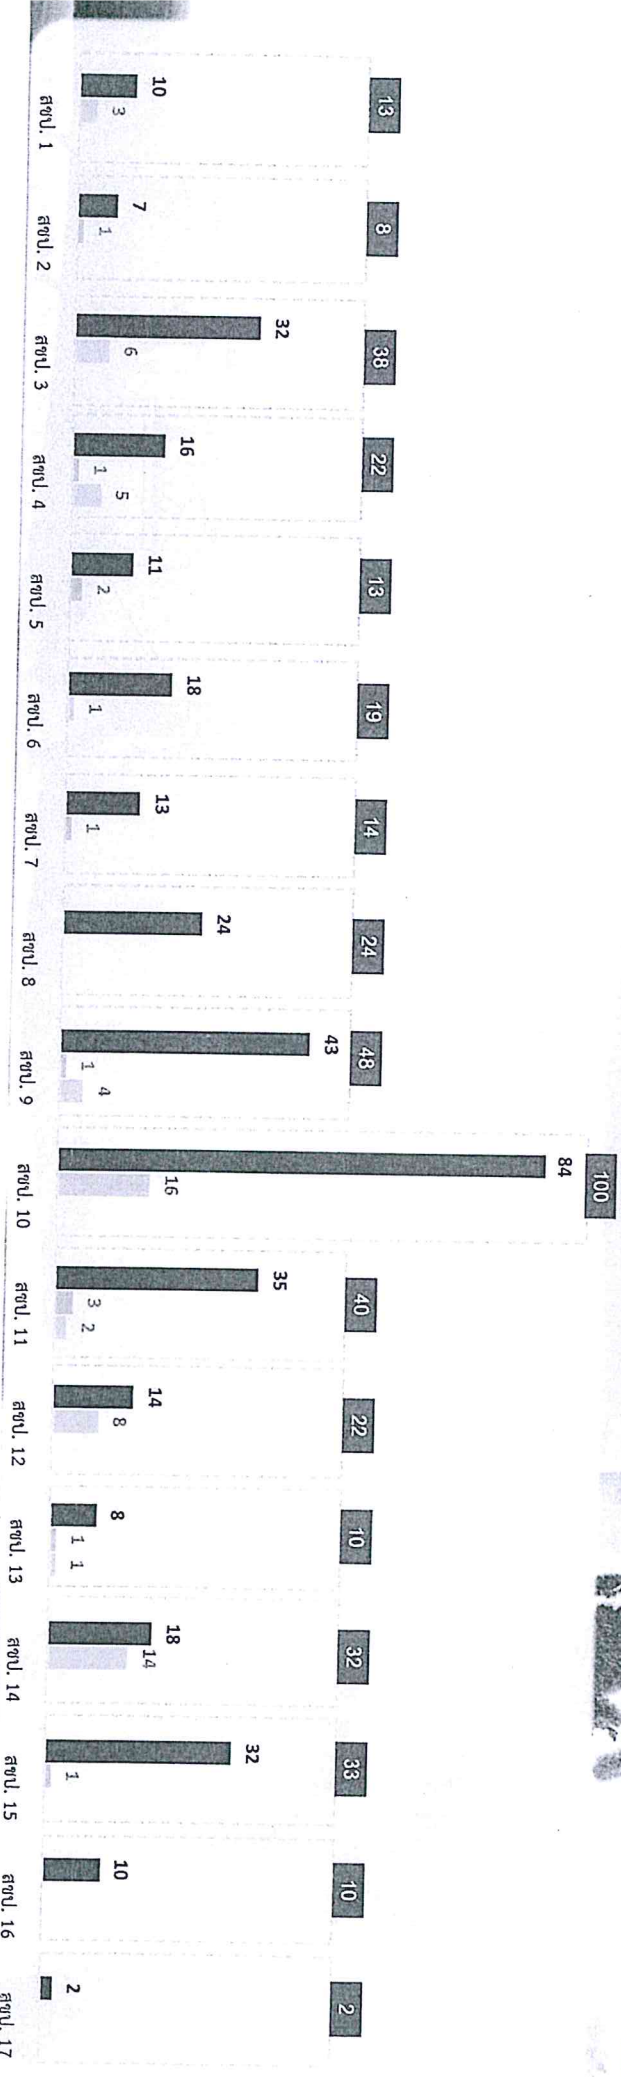



2.3

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

19,534.84 ล้านบาท

ภาพรวม

+PO 9,607.62 ล้านบาท (49.18%)

Ⓜ เบิกจ่าย 6,074.43 ล้านบาท 31.10%

32.00% | -0.90%

4,462.36 ล้านบาท

ประจำ

+PO 1,688.81 ล้านบาท (37.85%)

Ⓜ เบิกจ่าย 1,639.03 ล้านบาท 36.73%

1.73% | 35.00%

15,072.48 ล้านบาท

ลงทุน


+PO 7,918.81 ล้านบาท (52.54%)


Ⓜ เบิกจ่าย 4,435.40 ล้านบาท 29.43%

10.43% | 19.00%

--- เป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส 1


เป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐ







2.4

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 ไปพลางก่อน
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

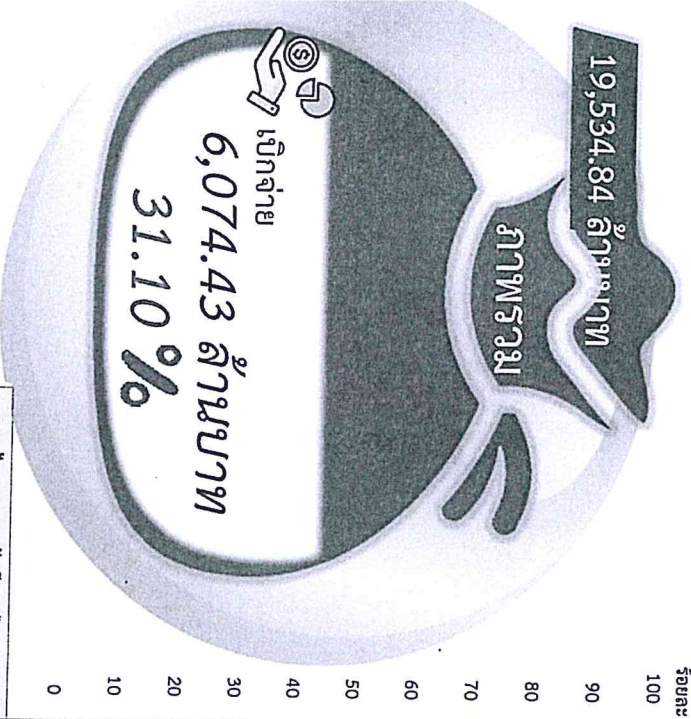

▶ เป้าหมายภาครัฐ ปี 66 ไปพลางก่อน	19,534.84
▶ ผล ปี 66 ไปพลางก่อน (19,534.84)	6,074.43
▶ ผลปี 66 (77,494.48)	31.10%
▶ ผลปี 65 (77,143.43)	30.7%
▶ ผลปี 64 (74,106.98)	2.45%
▶ ผลปี 63 (69,177.56)	0.66%
▶ ผลปี 62 (66,472.19)	1.43%
▶ เฉลี่ย 5 ปี (62-66)	1.36%

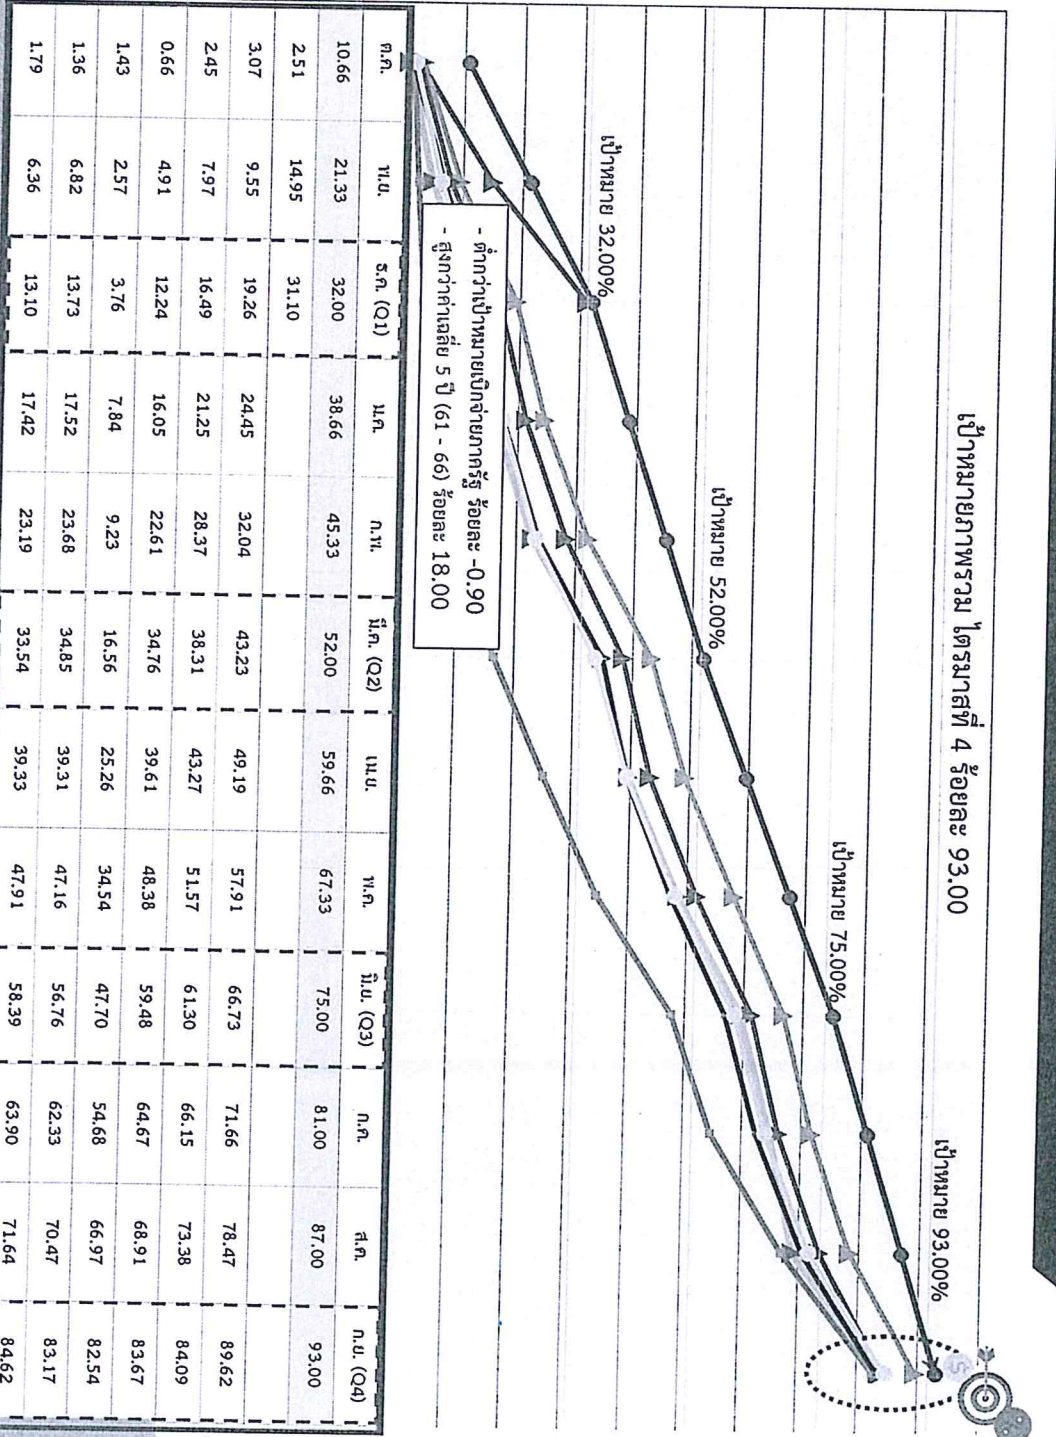




2.5

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 ไปพลางก่อน
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566



ร้อยละ

เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 75.00

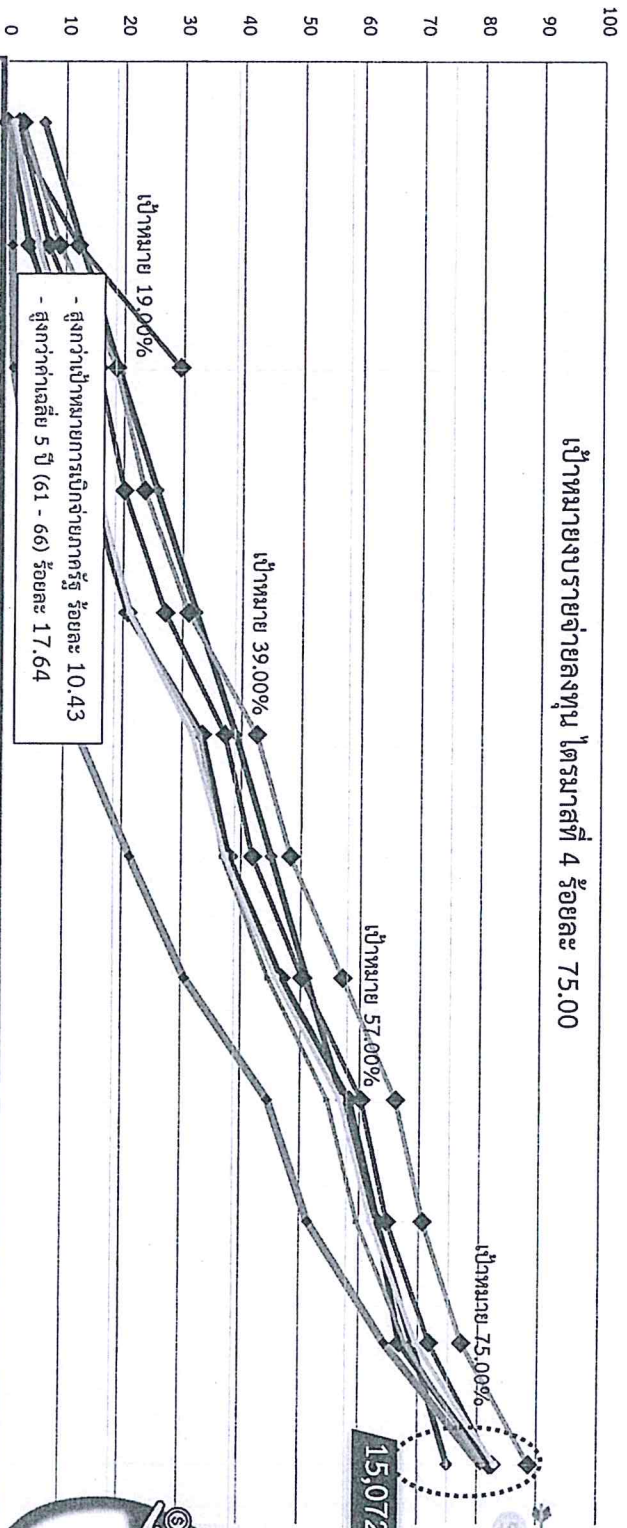

- สังกว่าเป็นรายการเบิกจ่ายภาครัฐ ร้อยละ 10.43
- สังกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (61 - 66) ร้อยละ 17.64

ปีงบประมาณ	ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค. (Q1)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค. (Q2)	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย. (Q3)	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย. (Q4)
เป้าหมายภาครัฐ ปี 66 ไปพลางก่อน	6.33	12.66	19.00	25.66	32.33	39.00	45.00	51.00	57.00	63.00	69.00	75.00
ผล ปี 66 ไปพลางก่อน (15,072.47)	0.13	12.09	29.43									
ผล ปี 66 (70,682.86)	2.68	8.95	18.71	23.53	30.98	42.48	48.24	57.04	65.95	70.58	77.24	88.62
ผล ปี 65 (70,135.62)	1.94	7.11	15.67	20.09	27.12	37.20	41.86	50.22	60.17	64.59	71.80	82.46
ผล ปี 64 (66,423.87)	0.003	3.81	10.97	14.29	20.79	33.39	37.9	46.78	58.21	63.11	66.85	82.02
ผล ปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	4.77	5.36	12.51	21.31	30.59	44.54	51.34	64.24	80.61
ผล ปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
เฉลี่ย 5 ปี (61 - 65)	1.20	5.30	11.79	15.64	21.13	31.70	37.24	45.83	56.68	61.83	69.60	82.96

ถึงทุน
4,435.40 ล้านบาท
29.43%
เบิกจ่าย



งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่เดือนมิถุนายน 2566

การดำเนินงาน

มีมติ คร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี 66
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ

งบประมาณ 5,138.65 ล้านบาท
เบิกจ่าย 3,743.58 ล้านบาท
72.85 %

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน งบพระราชดำริ (ปปร.)

งบประมาณ 4,207.98 ล้านบาท
เบิกจ่าย 3,051.77 ล้านบาท
72.52 %

งบประมาณ 930.67 ล้านบาท
เบิกจ่าย 691.81 ล้านบาท
74.33 %

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์
#/ชิ้น 275 รายการ 22.80 %

#/ชิ้น 930 รายการ 77.12 %

ยกเลิก 1 รายการ 0.08 %

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 2,195,967 ไร่ 79.14 %

ครัวเรือน 422,447 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 366,352 ครัวเรือน 86.72 %

ปริมาณน้ำ 11,80 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.



1 รายการ 886 ล้านบาท

เบิกจ่าย 7.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75

2 รายการ 395.50 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -

1,142 รายการ 2,954.40 ล้านบาท

เบิกจ่าย 2,648.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.66

1 รายการ 48.96 ล้านบาท

เบิกจ่าย 48.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

1 รายการ 300.00 ล้านบาท

เบิกจ่าย 0.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.18

7 รายการ 500.26 ล้านบาท

เบิกจ่าย 345.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.08

52 รายการ 930.67 ล้านบาท

เบิกจ่าย 691.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.33

■ แล้งเสร็จ 1 รายการ



■ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ 2 รายการ

- %



■ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 237 รายการ

■ แล้งเสร็จ 904 รายการ

■ ยกเลิก 1 รายการ

91.76 %

■ แล้งเสร็จ 1 รายการ

100 %

■ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ

- %

■ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 รายการ

51.67 %

■ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 28 รายการ

■ แล้งเสร็จ 24 รายการ

96.90 %

ฯ/สั่งตั้งสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

ฯ/สั่งตั้งสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ฯ/สั่งตั้งสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ฯ/สั่งตั้งสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566

ฯ/สั่งตั้งสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566

ฯ/สั่งตั้งสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566

■ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ / 200 ไร่

แผนงานบริหารเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเป็น
ศูนย์บริการประชาชน (สนับสนุนโครงการหลวงผอ.อ.หลวง)

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำ
แบบเคลื่อนที่ไว้
ใช้ตัวช่วยระบบไฮดรอลิก

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร
ชลประทานที่ได้รับความเสียหาย
เนื่องจากอุทกภัยปี 2565

รถปั่นจับถ่อนขัง ขนาด 50 ลิ้น
ทดแทน
งบประมาณที่ทุกปีไปจากกฎหมาย

โครงการขยายชาวากันแม่น้ำปิง
(โครงการหนองข่วง)

โครงการแก้ไขปัญหายุทกภัย
ระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ปปร.) ประจำปี 2566

เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
และสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
จากเดิม 200 ไร่ เป็น 200 ไร่ และเพิ่มพื้นที่
ใหม่ 200 ไร่ ที่ตั้งหนองข่วงบริเวณพื้นที่
ผู้ช่วยสนับสนุน แผนงานภารกิจ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ / 2,195,967 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน
/ 366,352 ครัวเรือน

ดำเนินการจัดหารถปั่นจับ ถ่อนขังเพื่อเสริม
ความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย
ตลอดจนการสนับสนุนไปยังราษฎรผู้
ประสบเหตุอุทกภัยปี 20 ปี

พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่ / - ไร่

ปริมาณน้ำ 11,80 ล้าน ลบ.ม. / - ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ / - ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน / - ครัวเรือน



5-6

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566)

5

เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน



รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



งบประมาณ 1,201.99 ล้านบาท
(งบจัดสรร 435.67 ล้านบาท)
เบิกจ่าย 0.80 ล้านบาท (0.07%)



ผลการดำเนินงาน : 732 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 553 รายการ
ยังไม่ตัดดำเนินการ 173 รายการ

6

กองทุน
จัดรูปที่ดิน

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จำนวน 45 รายการ

งบประมาณ 346.10 ล้านบาท = เบิกจ่าย 13.81 ล้านบาท (3.99%)
(งบจัดสรร 346.14 ล้านบาท)
ผลการดำเนินงาน → อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 19 รายการ
→ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 26 รายการ
ผลสัมฤทธิ์ ■ พื้นที่เกษตรกรรม 20,526 ไร่ / - ไร่
■ ครบเงื่อนไขประโยชน์ 1,637 ครัวเรือน / - ครัวเรือน

จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรรม

จำนวน 36 รายการ

งบประมาณ 342.91 ล้านบาท = เบิกจ่าย 28.96 ล้านบาท (8.45%)
(งบจัดสรร 339.97 ล้านบาท)
ผลการดำเนินงาน → อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 16 รายการ
→ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 20 รายการ
ผลสัมฤทธิ์ ■ พื้นที่เกษตรกรรม 16,016 ไร่ / - ไร่
■ ครบเงื่อนไขประโยชน์ 1,346 ครัวเรือน / - ครัวเรือน

ภาพรวม

งบประมาณ 689.01 ล้านบาท
(งบจัดสรร 686.07 ล้านบาท)
= เบิกจ่าย 42.77 ล้านบาท (6.21%)



ผลการดำเนินงาน : 81 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 35 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 46 รายการ

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ
พื้นที่เกษตรกรรม 36,542 ไร่ / 1ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,983 ครัวเรือน / - ครัวเรือน

