



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖ พ.ร.บ. 3182

ที่ กพง ๐๖/๑๙๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ส.๒๐๓๑๓/๑๖๑.๒.๖๗

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ๖๒ ๑๐๖

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

ปรภทช ทูฉี

(นางสาวปรารถนา ตู่คำ)

ตป.๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

[Handwritten signature]

(นายเกียรติชาย วชิรมงคลพงษ์)

ผผง.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

๙ เม.ย. ๒๕๖๗

-ทราบ

ชัยช ผอ.สอช,ผอ.ช.ภค., กท๑-๕๒๐.

เพื่อโปรดทราบ.

[Handwritten signature]

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๑ เมย ๒๕๖๗

[Handwritten signature]

**สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567)**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 6 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 34,764.81 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 22,769.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.49 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 4,458 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 101 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.27 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 358 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.03 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1,507 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.80 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2,489 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.83 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.07 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบประมาณ จำนวน 19,534.84 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 12,579.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.39 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 4,708.08 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,384.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.89 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 14,826.76 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 9,194.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.01 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,643 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 33 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.01 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 147 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.95 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1,111 รายการ คิดเป็นร้อยละ 67.62 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 350 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.30 และยกเลิก 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.12 คือ กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง 6 ปริมาณ 5,075 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ 0.12 ล้านบาท และกำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง 7 ปริมาณ 5,565 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ 0.13 ล้านบาท เนื่องจากสถานที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กั้นไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ จำนวน 7,479.60 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 5,332.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.29 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 2,147.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.71 จำนวนรายการทั้งสิ้น 745 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 200 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.85 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 545 รายการ คิดเป็นร้อยละ 73.15

3. งบกลาง พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 5,138.65 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 4,128.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.35 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 95 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.88 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,110 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.04 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 คือ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

4. งบกลาง พ.ศ. 2567 งบประมาณ จำนวน 457.34 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 115.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.34 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 26 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84.62 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.38

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ จำนวน 1,451.35 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 279.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.26 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 751 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 68 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.05 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 206 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.43 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 477 รายการ คิดเป็นร้อยละ 63.52

6. กองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ จำนวน 703.03 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 333.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.38 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 87 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.75 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 79 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.80 และดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.45



ผลกาสรดำาเป็นงานและกาสรเป็กจ่ายบปสรสมาน

ทุกบหล่งบปสรสมาน ปสรจ่ายบปสรสมาน พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567



รายละเอียดข้อมูล

1. สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
 - 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (ภาพรวม)
 - 2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน จำแนกตามสำนัก/กอง
 - 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน งบประมาณรายจ่าย ไปพลางก่อน
 - 2.4 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566
 - 2.5 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566
3. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กั้นไว้เบิกเหลือ
4. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
6. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567






	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)				
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น	34,764.81	22,769.04	65.49	4,458	101	358	1,507	2,489
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	19,534.84	12,579.45	64.39	1,643	33	147	1,111	350
1.1 งบรายจ่ายประจำ	4,708.08	3,384.67	71.89					
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	14,826.76	9,194.78	62.01	1,643	33	147	1,111	350
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือสิ้นปี	7,479.60	5,332.25	71.29	745			200	545
3. งบกลาง พ.ศ. 2566	5,138.65	4,128.80	80.35	1,206			95	1,110
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	4,207.98	3,323.75	78.99	1,154			72	1,081
- โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทิงหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)	8.86	7.77	87.70	1				1
- โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ไว้ช่วยระบบไฮดรอลิค	395.50			2			2	
- โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565	2,954.40	2,774.92	93.92	1,142			65	1076
- โครงการซื้อรถบรรทุกปั้นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกขโมยไปตามกฎหมาย	48.96	48.96	100.00	1				1
- โครงการผ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขงวิทย)	300.00	71.48	23.827	1			1	
- โครงการแก้ไขขังอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่	500.26	420.62	84.08	7			4	3
3.2 โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2566	930.67	805.05	86.50	52			23	29
4. งบกลาง พ.ศ. 2567	457.34	115.89	25.34	26			22	4
4.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	58.37	58.37	100.00	4				4
- เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	58.37	58.37	100.00	4				4
4.2 โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2567	398.97	57.52	14.42	22			22	
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2567	1,451.35	279.53	19.26	751	68	206		477
6. กองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2567	703.03	333.12	47.38	87		5	79	3




2.

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ. 2.1 สรุปผลการก่อนผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (ภาพรวม)

ข้อมูลจาก : ณ สิ้น




ผลการดำเนินงาน

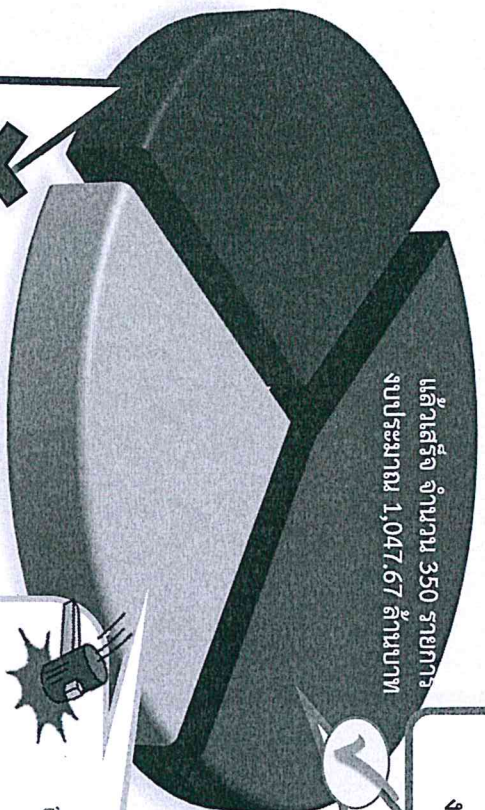

- อยู่ระหว่างการระบวงการซื้อ จำนวน 147 รายการ (งบประมาณ 474.33 ล้านบาท)
- อนุมัติแผน 89 รายการ งบประ
 - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 รายการ งบประ
 - เบิกซอง 12 รายการ งบประ
 - อนุมัติรับราคา 31 รายการ งบประ

✗ ยังไม่ดำเนินการ **อยู่ระหว่างการระบวงการ** **✓** ก่อนผูกพัน







- ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา

รายการที่ยังไม่ก่อสร้างที่สุกพัน 180 รายการ
งบประมาณ 519.32 ล้านบาท

สำนักงาน/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อสุกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	1,636	14,423.47	122	268.77	15	24.58	43	225.97	1,436	13,904.14
กพท.	100	5,507.69	6	4.96			2	100.85	92	5,401.87
สพญ.	123	4,325.58	14	14.82	1	0.07			108	4,310.70
สคก.	161	74.89							161	74.89
สทบ.	94	202.48	32	46.98			15	66.42	47	89.08
สจต.	27	302.07							27	302.07
สจต.	6	1.22							6	1.22
สคก.	1	32.72							1	32.72
สคส.	22	251.40							22	251.40
สธส.	13	250.45							13	250.45
สธต.	32	1,569.19					3	31.83	29	1,537.36

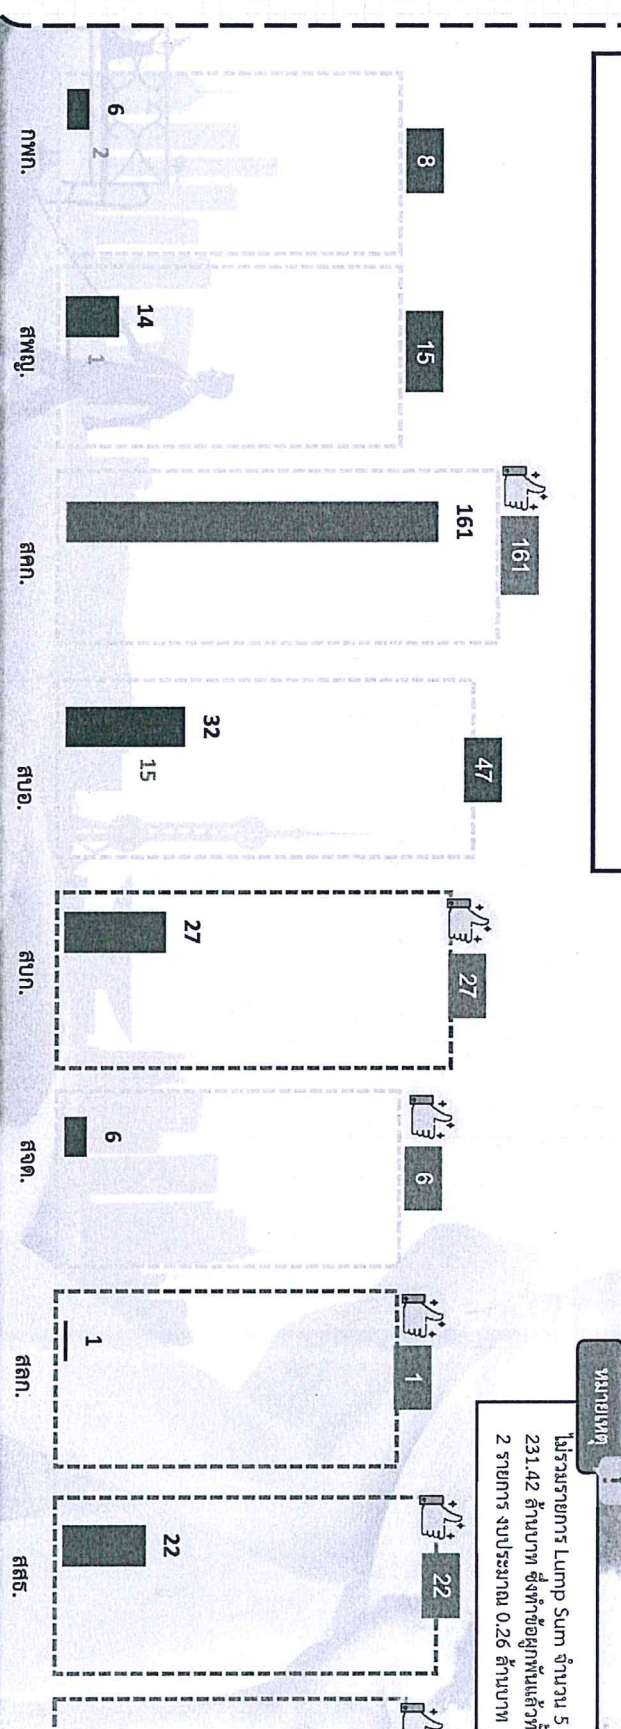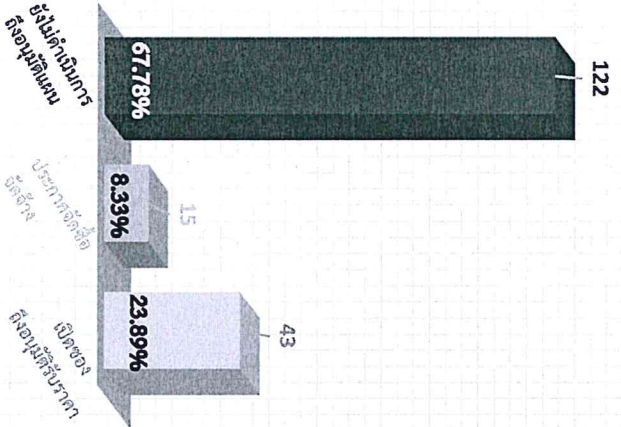

หมายเหตุ
ไม่รวมรายการ Lump Sum จำนวน 5
231.42 ล้านบาท ซึ่งทำข้อสุกพันแล้ว
2 รายการ งบประมาณ 0.26 ล้านบาท




ยังไม่ดำเนินการถึง 180 รายการ

ลำดับ	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดของตั้งอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สชป. 1	33	50.65	6	9.02					27	41.64
สชป. 2	21	239.02	1	1.40					20	237.61
สชป. 3	56	243.65	3	2.04	4	4.30	3	4.15	46	233.16
สชป. 4	40	120.58	6	15.66			4	5.81	30	99.11
สชป. 5	40	155.81	4	5.99	2	6.12			34	143.71
สชป. 6	43	69.75	3	6.83			1	1.12	39	61.80
สชป. 7	31	40.52	5	6.56					26	33.96
สชป. 8	52	81.99	3	4.95					49	77.04
สชป. 9	80	156.09	3	1.60	4	9.96	2	0.90	71	143.63

ยังไม่กำหนดผูกพัน 180 รายการ

ลำดับ	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดของตั้งอนุมัติรับราคา	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สชป. 10	149	92.31	14	12.08			3	3.81
สชป. 11	98	193.65	9	6.03	3	3.91	1	0.15
สชป. 12	97	72.29	0	0.00				
สชป. 13	89	70.67	1	0.35	1	0.23	2	1.76
สชป. 14	46	60.26	10	19.52			7	9.16
สชป. 15	82	57.60	0	0.00				
สชป. 16	61	157.61	2	110.00				
สชป. 17	39	43.31	0	0.00				


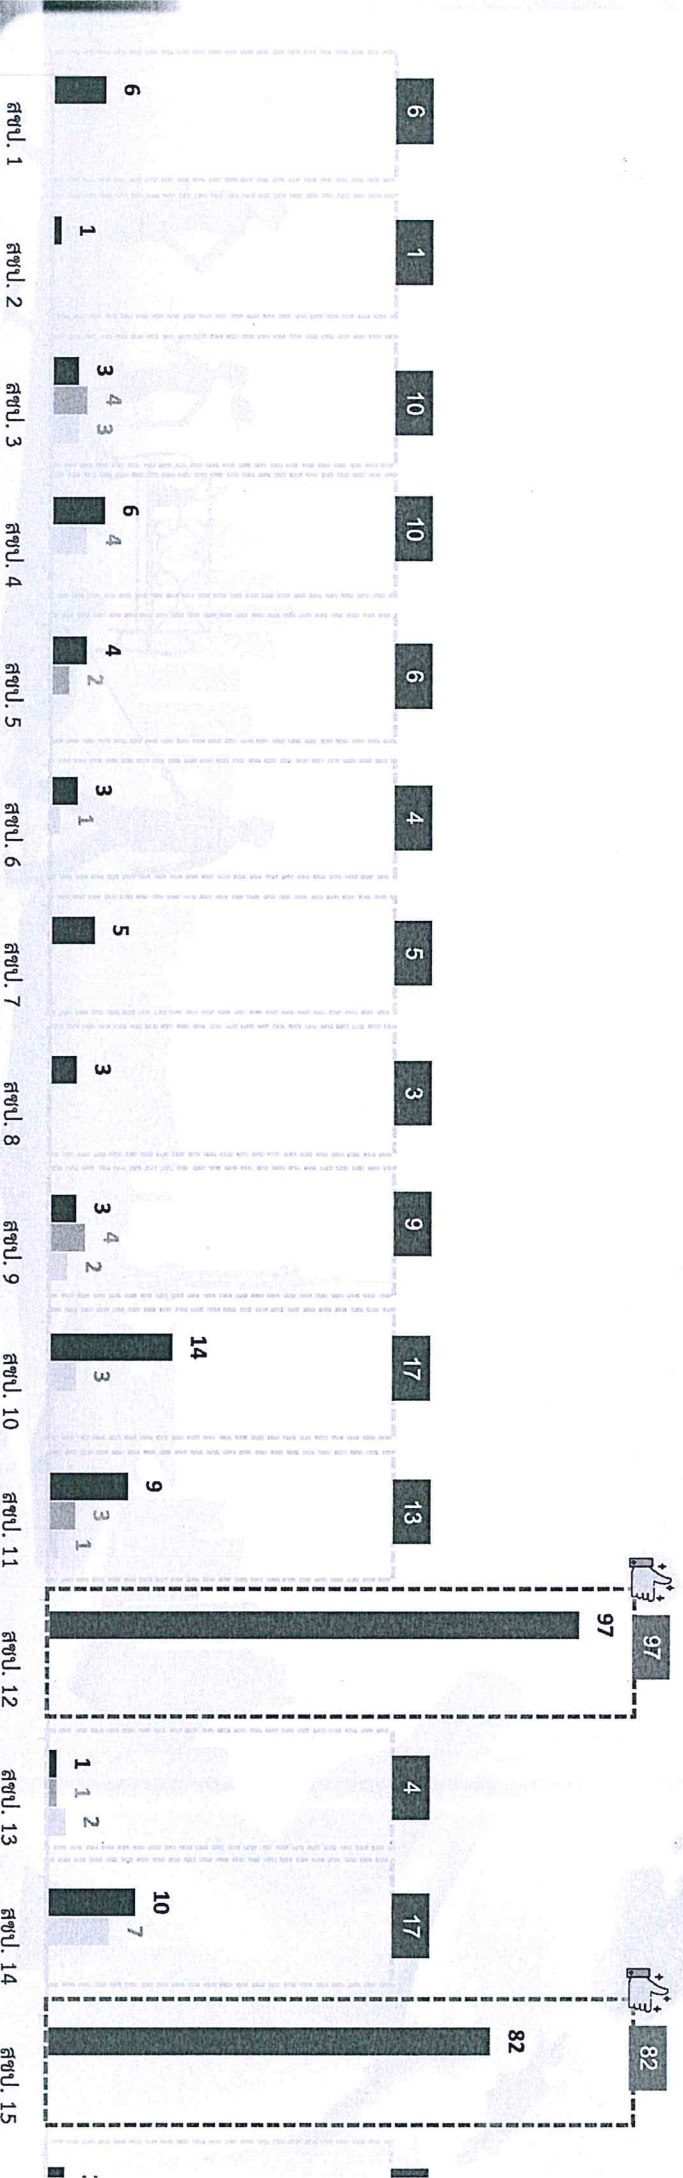





2.3

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน


ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567

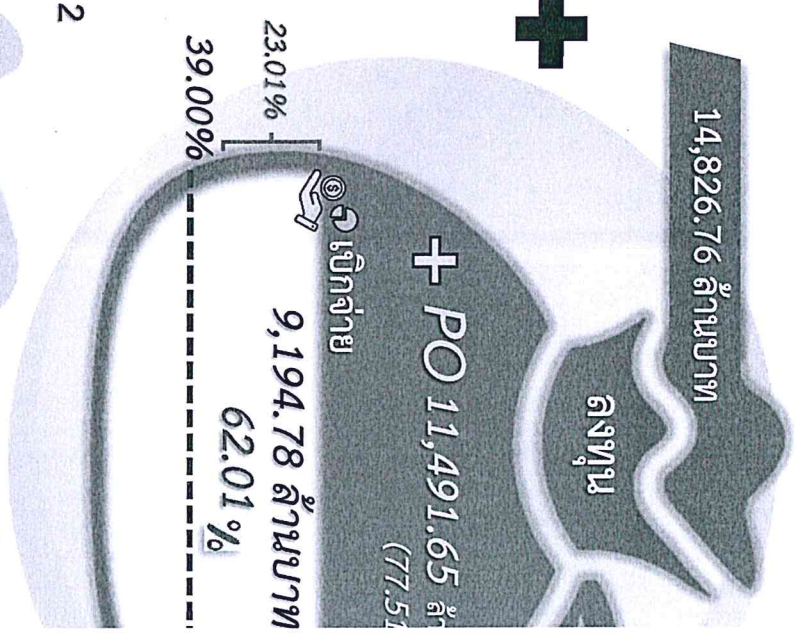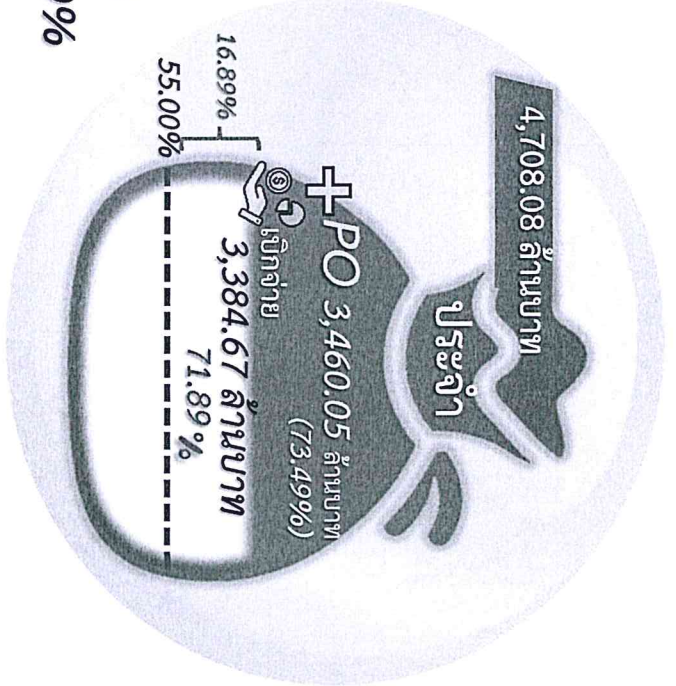

---> เป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส 2

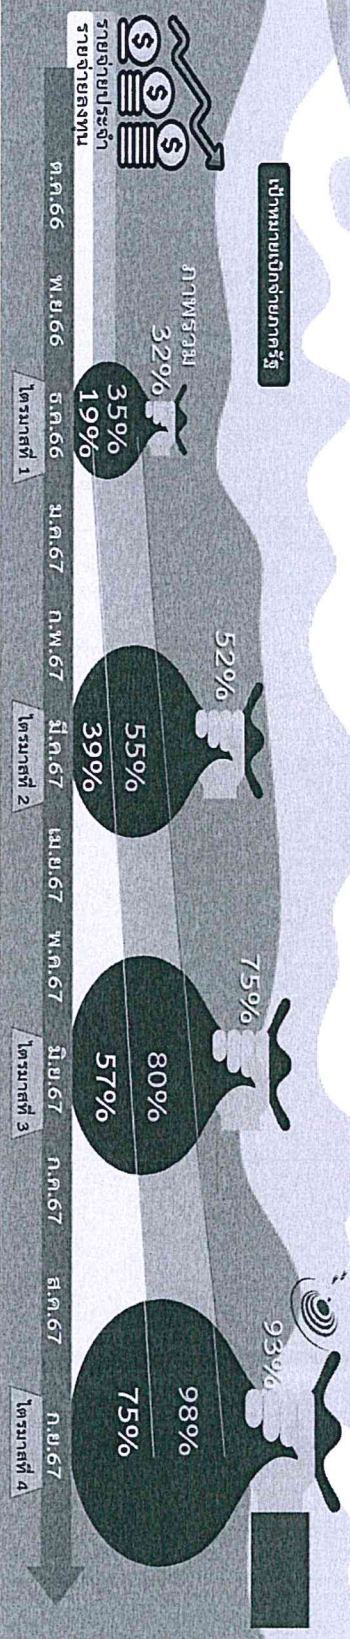

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567

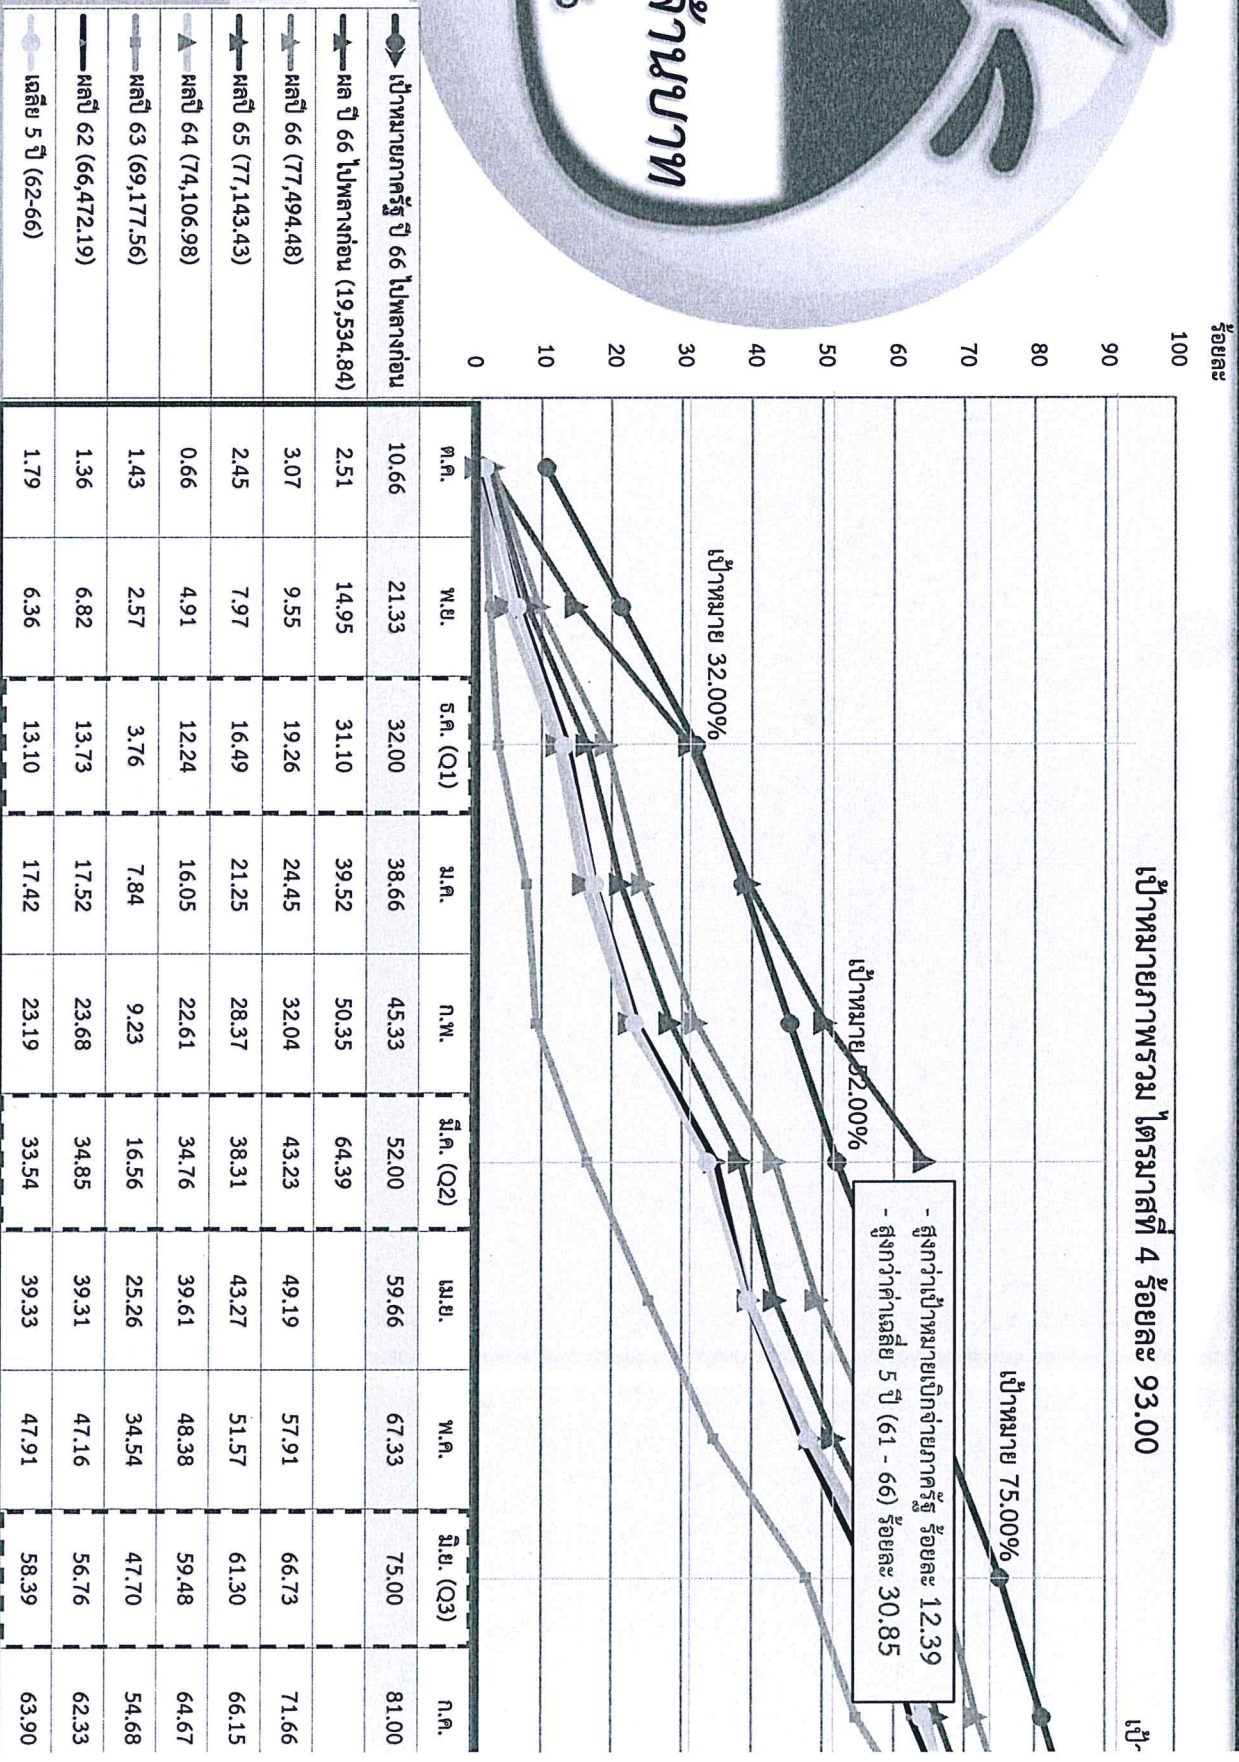





2.5

สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 ไปพลาดกว่าร้อยละ

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567

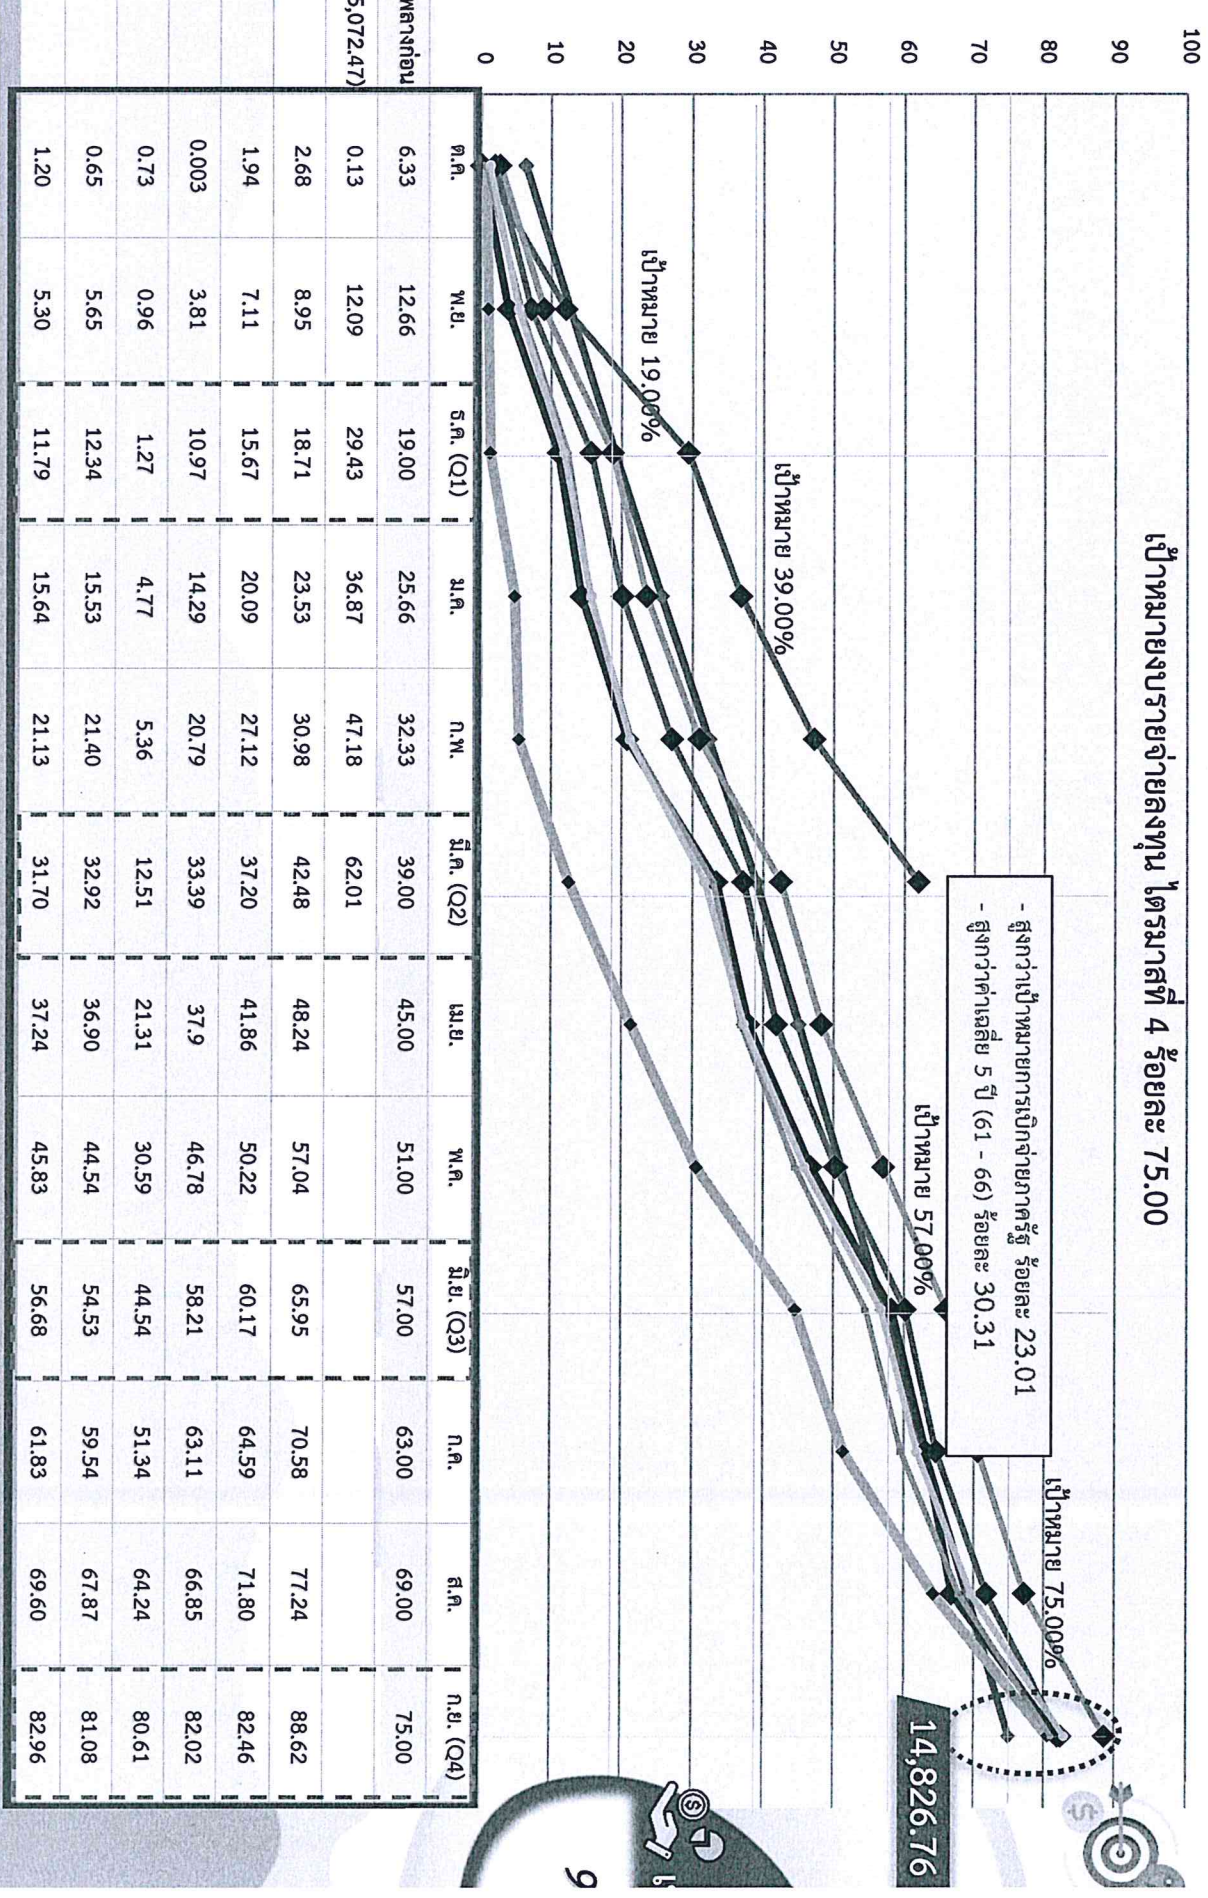

ภาพรวม งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทกนเวเบกเทอลอมป

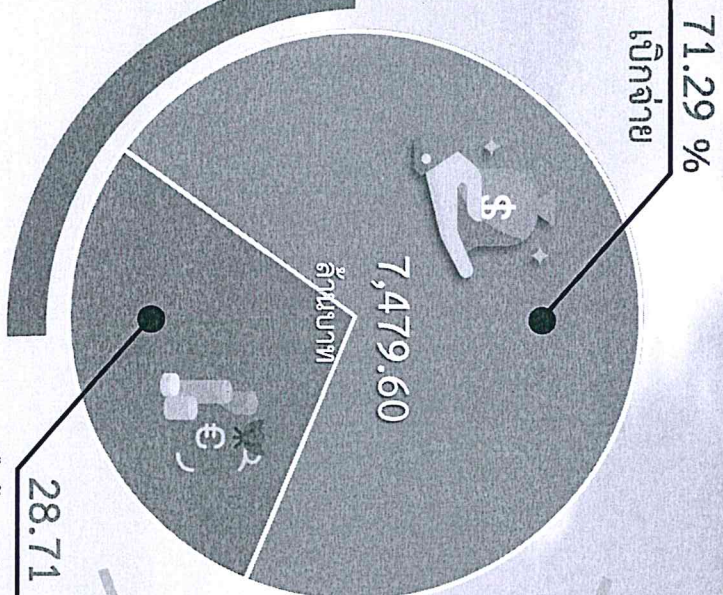

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

สถานะการดำเนินงาน 745 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 545 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 200 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. ฝนตก
4. ไฟไหม้

หน่วย : ล้านบาท

แผน	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
งบ	7,479.60	797.71	2,033.71	1,248.99	796.57	765.38	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.58
ผล	5,332.25	797.71	1,399.12	1,090.73	502.10	542.39	1,000.20					
ลดต่าง	2,147.35	-	-634.59	-158.26	-294.47	-222.99	348.39					



การดำเนินงาน

มติ คร.ม./คำสั่งนายก อบจ.มัตถบกลาง 66
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ

งบประมาณ 5,138.65 ล้านบาท
เบิกจ่าย 4,128.80 ล้านบาท
80.35 %

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน งบพระราชดำริ (กปร.)

งบประมาณ 4,207.98 ล้านบาท
เบิกจ่าย 3,323.75 ล้านบาท
87.75 %


งบประมาณ 930.67 ล้านบาท
เบิกจ่าย 805.05 ล้านบาท
86.50 %

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 95 รายการ 7.88 %
แล้วเสร็จ 1,110 รายการ 92.04 %
ยกเลิก 1 รายการ 0.08 %

ข้อมูลการบันทึกตาม CE
ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 2,496,328 ไร่ 89.96 %
ครัวเรือน 422,447 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 404,747 ครัวเรือน 95.81 %



1 รายการ
8.86 ล้านบาท
เบิกจ่าย 7.77 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 87.75

2 รายการ
395.50 ล้านบาท
เบิกจ่าย -
คิดเป็นร้อยละ -

1,142 รายการ
2,954.40 ล้านบาท
เบิกจ่าย 2,774.92 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 93.52

1 รายการ
48.96 ล้านบาท
เบิกจ่าย 48.96 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100

1 รายการ
300.00 ล้านบาท
เบิกจ่าย 71.48 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 23.83

7 รายการ
500.26 ล้านบาท
เบิกจ่าย 420.62 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 84.08

100 %
แล้วเสร็จ 1 รายการ

- %
อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ 2 รายการ

96.50 %
แล้วเสร็จ 1,076 รายการ
ยกเลิก 1 รายการ

100 %
แล้วเสร็จ 1 รายการ

36.93 %
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ

75.13 %
แล้วเสร็จ 3 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 รายการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ / 200 ไร่

ตั้งต้นศึกษาและประเมินสภาพในการบริหารจัดการน้ำ และสนับสนุนการขุดลอกการระบายน้ำซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน กับคลอง หรือฝายเก่า อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีร่องชุมชนที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในชุมชน และคณะกรรมการ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ / 2,496,128 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน / 404,747 ครัวเรือน

ดำเนินการจัดการถนนขึ้นคัน เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาทุกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่ / - ไร่

ปริมาณน้ำ 11,80 ล้าน ลบ.ม. / ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ / - ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน / - ครัวเรือน

แผนงานบริหารเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัยหรือจำเป็น รับรับงบประมาณด้านอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ (สนับสนุนโครงการลุ่มต่ำ)

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชุดประเภทที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากอุทกภัยปี 2565

รถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกขยับขยายภายหลัง

โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการตนเองช่วยเหลือ)

โครงการแก้ไขปัญหายุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่ซึ่งประชาชนใหญ่






งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project



งบกลาง 2567

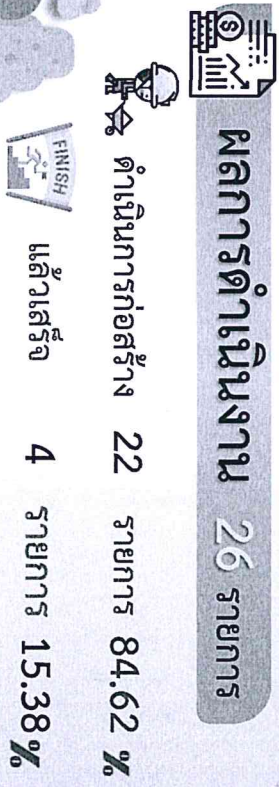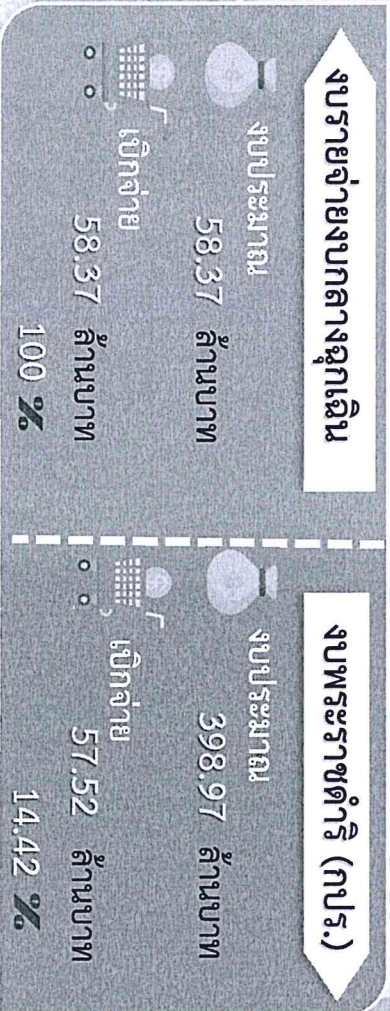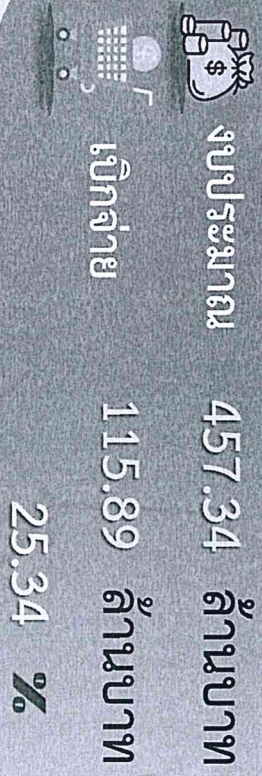

สงป. อนุมัติ



กปร.



เบิกจ่าย 58.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

แล้วเสร็จ 4 รายการ 100 %

เบิกจ่าย 39.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

อยู่ระหว่างพิจารณา 22 รายการ

เป็นเงินชดเชยต่างหากก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ

เงินชดเชยต่างหากก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ดำเนินการก่อสร้างจัดหาแหล่งน้ำ ให้ประชาชนและ หน่วยงานอื่น ๆ

โครงการอื่นเนื่องจากการปรับราคาได้ (กปร.)



แล้วเสร็จ

4

รายการ 15.38%



แล้วเสร็จ

4

รายการ 84.62%



แล้วเสร็จ

4

รายการ 15.38%




ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project)

6
เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ 1,451.35 ล้านบาท
(งบจัดสรร 1,150.16 ล้านบาท)
เบิกจ่าย 279.53 ล้านบาท (19.26%)



ผลการดำเนินงาน : 751 รายการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 477
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 206
ยังไม่ตัดดำเนินการ 68

7
งานกองทุน
จัดรูปที่ดิน


จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 46 รายการ

งบประมาณ 346.70 ล้านบาท = เบิกจ่าย 128.08 ล้านบาท (36.94%)
(งบจัดสรร 346.70 ล้านบาท)
ผลการดำเนินงาน → อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ
→ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 40 รายการ
→ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ
ผลสัมฤทธิ์ ■ พื้นที่เกษตรกรรม 20,526 ไร่ / 92 ไร่
■ ครบเงื่อนไขประโยชน์ 1,637 ครัวเรือน / 45 ครัวเรือน

จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 41 รายการ

งบประมาณ 356.33 ล้านบาท = เบิกจ่าย 205.04 ล้านบาท (57.55%)
(งบจัดสรร 356.33 ล้านบาท)
ผลการดำเนินงาน → อยู่ระหว่างก่อสร้าง 39 รายการ
→ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ
ผลสัมฤทธิ์ ■ พื้นที่เกษตรกรรม 16,016 ไร่ / 510 ไร่
■ ครบเงื่อนไขประโยชน์ 1,346 ครัวเรือน / 1,346 ครัวเรือน

ภาพรวม



งบประมาณ 703.03 ล้านบาท
(งบจัดสรร 700.09 ล้านบาท)
= เบิกจ่าย 333.12 ล้านบาท (47.38%)

ผลการดำเนินงาน : 87 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 79 รายการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ
พื้นที่เกษตรกรรม 36,542 ไร่ / 602 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,983 ครัวเรือน

