



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๒๕๖๓/๒๕๖๓ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ลข ๓๔๙๔/รพ.ด.๖๘

เรื่อง สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือปี ๓๒ ๑๑๔๓  
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๓) ผ.บ. ๓๘๘๔

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือปี ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยกรมชลประทานได้กันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๗๔๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๗๖ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๖๙ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีทั้งสิ้น จำนวน ๗,๔๗๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๖๗๔.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน ๑,๘๐๕.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อช. เพื่อโปรดทราบ

(นางมณฑา ชาวโพธิ์)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผวง.ผง.  
เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๓๗ พ.ค. ๒๕๖๓

-ทราบ

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ร.กต., กน.๑-๗ ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเนตร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๓๗ พ.ค. ๒๕๖๓

**สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือมปี  
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567**

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 745 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 576 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 169 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 7,479.60 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5,674.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.86 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,805.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.14

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

**1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)**

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 576 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 3,909.50 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 3,996.08 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,794.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.95 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 201.86 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 169 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 3,570.10 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 3,483.52 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,879.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.97 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,603.61 ล้านบาท

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)				
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2566	งบประมาณเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	745	7,479.60	7,479.60	5,674.13	75.86	1,805.47
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	576	3,909.50	3,996.08	3,794.22	94.95	201.86
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	169	3,570.10	3,483.52	1,879.91	53.97	1,603.61

**2. จำแนกตามสำนัก/กอง** ซึ่งมี 34 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 95 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 73 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,518.62 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,514.26 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,022.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.51 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 491.93 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 82 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 64 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,200.12 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,176.54 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 893.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.92 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 283.27 ล้านบาท



2.3 สำนักงานชลประทานที่ 14 จำนวน 50 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 31 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 337.26 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 333.29 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 169.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.71 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 164.29 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินการ		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)				
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2566	งบประมาณเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	745	576	169	7,479.60	7,479.60	5,674.13	75.86	1,805.47
สขป. 1	29	22	7	77.41	76.76	43.62	56.83	33.14
สขป. 2	18	18		35.90	35.83	34.95	97.54	0.88
สขป. 3	22	18	4	127.16	122.78	115.66	94.20	7.12
สขป. 4	10	6	4	168.04	167.43	73.44	43.86	94.01
สขป. 5	22	18	4	100.00	99.00	82.48	83.31	16.52
สขป. 6	19	14	5	176.54	170.58	146.15	85.68	24.43
สขป. 7	31	30	1	407.57	403.61	396.72	98.29	6.89
สขป. 8	72	52	20	520.80	518.48	426.68	82.29	91.79
สขป. 9	35	29	6	394.12	384.22	326.59	85.00	57.63
สขป. 10	11	5	6	100.63	99.37	78.57	79.07	20.79
สขป. 11	15	12	3	253.77	250.09	215.78	86.28	34.31
สขป. 12	9	9		111.98	111.98	111.98	100.00	
สขป. 13	19	13	6	340.89	340.88	231.07	67.79	109.82
3 สขป. 14	50	31	19	337.26	333.29	169.00	50.71	164.29
สขป. 15	27	26	1	110.87	110.18	102.23	92.78	7.95
สขป. 16	40	31	9	563.85	563.75	422.24	74.90	141.51
สขป. 17	24	21	3	233.12	233.06	190.04	81.54	43.01
สบอ.	42	40	2	115.39	115.28	111.34	96.58	3.93
2 กพท.	82	64	18	1,200.12	1,176.54	893.27	75.92	283.27
กพด.	1		1	3.97	3.97	2.98	75.06	0.99
กสข.	1	1		0.15	0.15	0.15	100.00	
สพข.	2		2	3.61	3.61	3.07	85.04	0.54
สมต.	10	6	4	147.34	147.34	138.43	93.95	8.90
สคก.	10	10		15.61	15.58	15.50	99.49	0.08
สจต.	8	5	3	31.60	31.60	29.75	94.15	1.85
สลก.	3	1	2	54.82	54.68	27.17	49.69	27.52
สบก.	21	10	11	162.71	162.71	59.37	36.49	103.33
1 สพญ.	95	73	22	1,518.62	1,514.26	1,022.33	67.51	491.93
สวพ.	1	1		0.19	0.19	0.19	100.00	
สสร.	2	2		0.03				
สอส.	4	3	1	56.69	56.69	37.78	66.64	18.91
กพร.	1	1		2.15	2.15	2.15	100.00	
กผง.	1		1	3.96	3.96	1.49	37.63	2.48
Lump Sum	8	4	4	102.73	169.60	161.96	95.50	7.64

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมามีในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

### แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
4. เร่งรัดดำเนินงานหลังจากเกษตรกรเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ

\*\*\*\*\*




# งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือมปี

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567



ภาพรวม งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือมปี

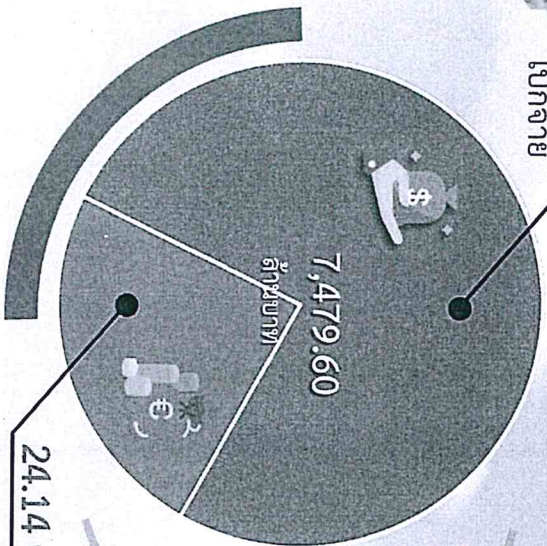

งบประมาณ

7,479.60 ล้านบาท

เบิกจ่าย

5,674.13 ล้านบาท (75.86%)

1,805.47 ล้านบาท (24.14%)

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

แผน	รวม	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยอดรวม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย
ผล	7,479.60	797.71	2,033.71	1,248.99	796.57	765.38	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.58	172.66	49,43	7,479.60	2,033.71	7,479.60	1,805.47
ผลต่าง	5,674.13	797.71	1,399.12	1,090.73	502.10	542.39	1,000.20	341.88						100%				
	1,805.47	-	-634.59	-158.26	-294.47	-222.99	348.39	-43.42										

### ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่เพียงพอตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้ทำท่วมนับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากทำผ่านมออยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยว ผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

สถานะการดำเนินงาน 7/45 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 576 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 169 รายการ

