



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖ นส.๗๐.๔๑๒๒
 ที่ กพง ๐๖/๓๑๔/๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๕๑๑๕ ๒๐๘/๑๒๑.๒.๖๕
 เรื่อง โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) ๗๓๑๑๑๑


เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผผง.ผง

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๔ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๖๒๕.๒๖ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๖๑๙.๒๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๕๔๕.๒๐ ตัน ผลการดำเนินงานในภาพรวม ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๕ รายการ (อนุมัติแผน จำนวน ๑ รายการ เปิดซอง จำนวน ๕ รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน ๑๙ รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

ปรารถนา ตู้อ่า
 (นางสาวปรารถนา ตู้อ่า)
 ตป.๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

 - ทราบ
 ไปน พว.วณ., พว.ค.ภค., ทน.๑-๗๗๐.
 เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วิวัฒน์ อินทร์ทุ่ง)
 ผอ.ผง.
 ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๗


 (นายธเนศร์ สมบูรณ์)
 ผส.บอ.



โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้อย่างพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 44 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 625.26 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 619.21 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 16.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.70 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 545.20 ตัน ผลการดำเนินงานในภาพรวม ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 4 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 25 รายการ (อนุมัติแผน จำนวน 1 รายการ เปิดซอง จำนวน 5 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 19 รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้


- Para Asphalt Concrete จำนวน 42 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 614.86 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 16.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 520.90 ตัน ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 4 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 25 รายการ (อนุมัติแผน จำนวน 1 รายการ เปิดซอง จำนวน 5 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 19 รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ

- Para Soil Cement จำนวน 2 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4.35 ล้านบาท แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 24.30 ตัน ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างก่อสร้างทุกรายการ



การสนับสนุนโครงการส่งเสริม การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ






การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยานพลังงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ภาคเหนือ 1 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด

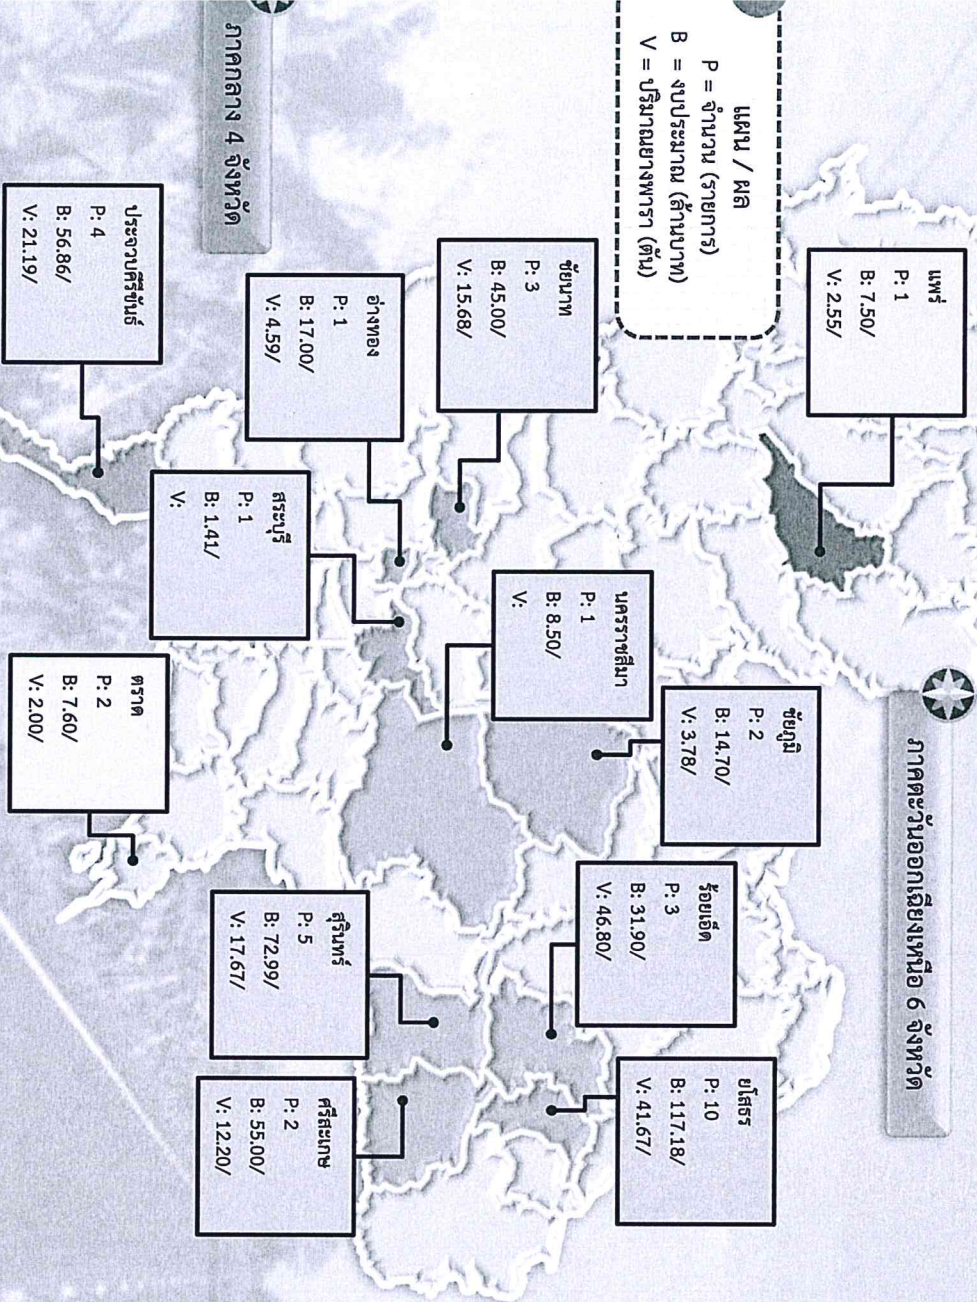

ภาคตะวันออก 1 จังหวัด

ภาคใต้ 2 จังหวัด

แผน/ผลการดำเนินงานภาพรวม

ภาค	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ พ.ร.บ. 2567		งบประมาณ (ล้านบาท)
		งบตาม พ.ร.บ. 2567	งบหลังโอน	
รวม 15 จ.	44	625.26	619.21	16.73 (2.71%)
เหนือ	1	7.50	7.50	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	23	300.26	294.42	-
กลาง	9	120.27	120.18	-
ตะวันออก	2	7.60	7.57	-
ใต้	4	74.13	74.05	-
ใต้ชายแดน	5	115.50	115.50	-

จำแนกตามประเภทขงพารา

ประเภท	จำนวน (รายการ)	งบตาม พ.ร.บ. 2567 (ล้านบาท)	งบหลังโอน (ล้านบาท)
Para Asphalt Concrete	42	618.26	614.3
ผล	-	16.73 (2.71%)	16.73 (2.71%)

ยังไม่ดำเนินการ 4 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ เปิดซอง 5 รายการ อนุมัติรับราคา 1 รายการ ก่อสร้าง 13 รายการ
