



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖ พ.ศ. ๖๐ ๗๖๐
ที่ กพง ๐๖/๓๔๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๗๐๕๔๙๐/๒๑ มิ.ย. ๖๗
เรื่อง สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี ๓๒๑,๖๔๙
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗)

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยกรมชลประทานได้กั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๗๔๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๒๓ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๒๒ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปีทั้งสิ้น จำนวน ๗,๔๗๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๑๑๒.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๒ คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๓๖๖.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๘ (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย หรือคาดว่าเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในกำหนด จำนวน ๖๕.๒๐ ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน ๑,๓๐๑.๗๘ ล้านบาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิตทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผว.ผง.

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วิวัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

- ทราบ

เรียน ผอ.สวน., ผอ.ธ.ภค., ทน.๑-๗ ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

**สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567**

กรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือปี
จำนวน 745 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 623 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
122 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 7,479.60 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 6,112.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.72 คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี
จำนวน 1,366.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.28 (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจ่งคืนเงินเหลือจ่ายหรือคาดว่า
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในกำหนด จำนวน 65.20 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
จำนวน 1,301.78 ล้านบาท**)

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2566 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 623 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 4,797.46
ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,876.75 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,734.50 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 97.08 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี
จำนวน 142.25 ล้านบาท (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจ่งคืนเงินเหลือจ่าย จำนวน 43.82 ล้านบาท
และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 98.43 ล้านบาท)

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 122 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี
2,682.14 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,602.85 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,378.12 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 52.95 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี
จำนวน 1,224.73 ล้านบาท (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจ่งคืนเงินเหลือจ่ายหรือคาดว่าเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่ทันภายในกำหนด จำนวน 21.38 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 1,203.35 ล้านบาท**)

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)					
		งบประมาณเงิน กันไว้เบิก เหลือปี 2566	งบประมาณเงิน กันหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	คงเหลืองบประมาณเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	
						แจ่งคืนเงินเหลือจ่าย/ คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทัน	งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	745	7,479.60	7,479.60	6,112.62	81.72	65.20	1,301.78
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	623	4,797.46	4,876.75	4,734.50	97.08	43.82	98.43
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	122	2,682.14	2,602.85	1,378.12	52.95	21.38	1,203.35

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 34 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 95 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 78 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,518.62 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,514.26 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,093.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.23 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 420.52 ล้านบาท (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจ็งคืนเงินเหลือจ่ายหรือคาดว่า เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในกำหนด จำนวน 14.99 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 405.53 ล้านบาท**)

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 82 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 68 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,200.12 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,176.54 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 961.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.68 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 215.51 ล้านบาท (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจ็งคืนเงินเหลือจ่ายหรือคาดว่า เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในกำหนด จำนวน 25.93 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 189.58 ล้านบาท**)

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 14 จำนวน 50 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 33 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 337.26 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 332.34 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 203.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.36 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 128.41 ล้านบาท (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจ็งคืนเงินเหลือจ่ายหรือคาดว่า เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในกำหนด จำนวน 2.29 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 126.12 ล้านบาท**)

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินการ		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)				คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี	
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2566	งบประมาณเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	แจ็งคืนเงินเหลือจ่าย/คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทัน	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	745	623	122	7,479.60	7,479.60	6,112.62	81.72	65.20	1,301.78
สขป. 1	29	25	4	77.41	76.76	67.54	87.99	0.03	9.19
สขป. 2	18	18		35.90	35.83	34.95	97.54	0.02	0.86
สขป. 3	22	20	2	127.16	122.78	118.39	96.42	3.89	0.50
สขป. 4	10	7	3	168.04	167.43	74.46	44.47	0.24	92.73
สขป. 5	22	21	1	100.00	99.00	92.85	93.79	0.24	5.91
สขป. 6	19	15	4	176.54	170.55	146.15	85.69	0.29	24.11
สขป. 7	31	31		407.57	401.83	399.37	99.39	2.45	0.01
สขป. 8	72	62	10	520.80	518.48	441.65	85.18	4.40	72.43
สขป. 9	35	31	4	394.12	383.32	346.47	90.39	0.95	35.90
สขป. 10	11	5	6	100.63	99.36	83.98	84.52	0.01	15.37

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะผลการดำเนินการ		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ เงินกันไว้เบิก เหลือในปี 2566	งบประมาณเงิน กันหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลืองบประมาณเงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี	
								แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย/ คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทัน	งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ
สขป. 11	15	13	2	253.77	250.09	227.74	91.06	4.95	17.40
สขป. 12	9	9		111.98	111.98	111.98	100.00		
สขป. 13	19	14	5	340.89	340.79	261.69	76.79	1.16	77.94
3 สขป. 14	50	33	17	337.26	332.34	203.93	61.36	2.29	126.12
สขป. 15	27	27		110.87	110.15	108.76	98.74	1.39	
สขป. 16	40	34	6	563.85	563.57	502.99	89.25	1.00	59.58
สขป. 17	24	22	2	233.12	231.31	202.71	87.64		28.60
สบอ.	42	42		115.39	115.28	115.28	100.00		
2 กพท.	82	68	14	1,200.12	1,176.54	961.03	81.68	25.93	189.58
กพท.	1		1	3.97	3.97	2.98	75.06		0.99
กสช.	1	1		0.15	0.15	0.15	100.00		
สพช.	2	2		3.61	3.61	3.07	85.04	0.54	
สมค.	10	6	4	147.34	147.32	138.43	93.97		8.89
สคก.	10	10		15.61	15.57	15.50	99.55	0.07	
สจค.	8	5	3	31.60	31.60	30.19	95.54	0.01	1.40
สลก.	3	2	1	54.82	54.68	53.47	97.79		1.21
สบก.	21	11	10	162.71	162.71	66.52	40.88	0.35	95.84
1 สพญ.	95	78	17	1,518.62	1,514.26	1,093.74	72.23	14.99	405.53
สวพ.	1	1		0.19	0.19	0.19	100.00		
สสร.	2	2		0.03					
สอส.	4	3	1	56.69	56.69	37.78	66.64		18.91
กพร.	1	1		2.15	2.15	2.15	100.00		
กผง.	1		1	3.96	3.96	2.97	75.00		0.99
Lump Sum	8	4	4	102.73	175.35	163.56	93.28		11.79

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมามีในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข


1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
4. เร่งรัดดำเนินงานหลังจากเกษตรกรเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือมีปี

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567

ภาพรวม
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือมีปี

สถานะการดำเนินงาน 745 รายการ

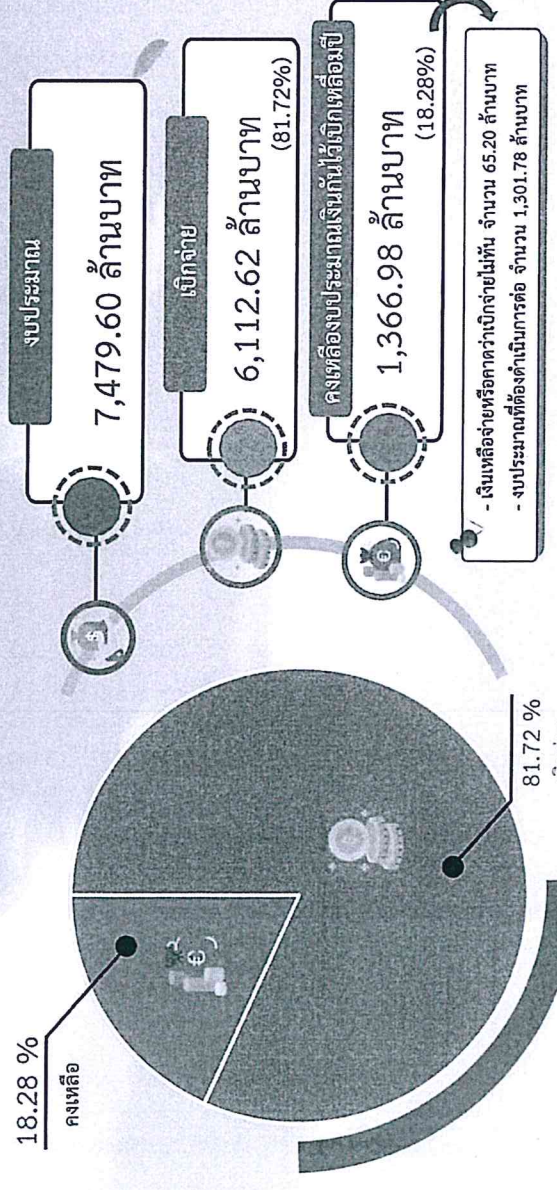

หน่วย : ล้านบาท

แผน	แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)			
	ต.ค. 66	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ย. 67
รวม	5,332.25	480.70	479.45	215.22
รวม	5,332.25	309.07	129.42	248.21
ผลต่าง	-	-171.63	-350.03	

ดำเนินการแล้วเสร็จ 623 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 122 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมามีอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการระดมการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
