



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

พ.ร.บ. ๖๒๕.๒๖

ที่ กพง ๐๖/๓๕๕/๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ล.๒๑๕๙๑๓/๒๑๖.๒.๖๗

เรื่อง โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๑๒๑๖๕๒

เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผผง.ผง

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๔ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๖๒๕.๒๖ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๖๐๙.๘๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๕๔๕.๒๐ ต้น ผลการดำเนินงานในภาพรวม ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๓ รายการ (อนุมัติแผน จำนวน ๑ รายการ เปิดซอง จำนวน ๓ รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน ๙ รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อชช. เพื่อทราบต่อไป

(นางมนตา ชาวโพธิ์)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา ปานขำ)

ผชช.ผง. รักษาการราชการแทน ผอ.ผง.

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

- ทราบ

เรียน ผอ.สน., ผอ.ค.กค., ทน.๑-๓ ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567

---

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 44 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 625.26 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 609.84 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 17.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา 545.20 ตัน ผลการดำเนินงานในภาพรวม ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 13 รายการ (อนุมัติแผน จำนวน 1 รายการ เปิดซอง จำนวน 3 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 9 รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- Para Asphalt Concrete จำนวน 42 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 605.48 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 17.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา 520.90 ตัน ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 13 รายการ (อนุมัติแผน จำนวน 1 รายการ เปิดซอง จำนวน 3 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 9 รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ

- Para Soil Cement จำนวน 2 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4.35 ล้านบาท แผนปริมาณการใช้ยางพารา 24.30 ตัน ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างก่อสร้างทุกรายการ

\*\*\*\*\*






# การสับบสนุนโครงการส่งเสริม การใช้ยางใ้หน้ด้วยงานภาครัฐ ปี 2567

กรมชลประทาน





# การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

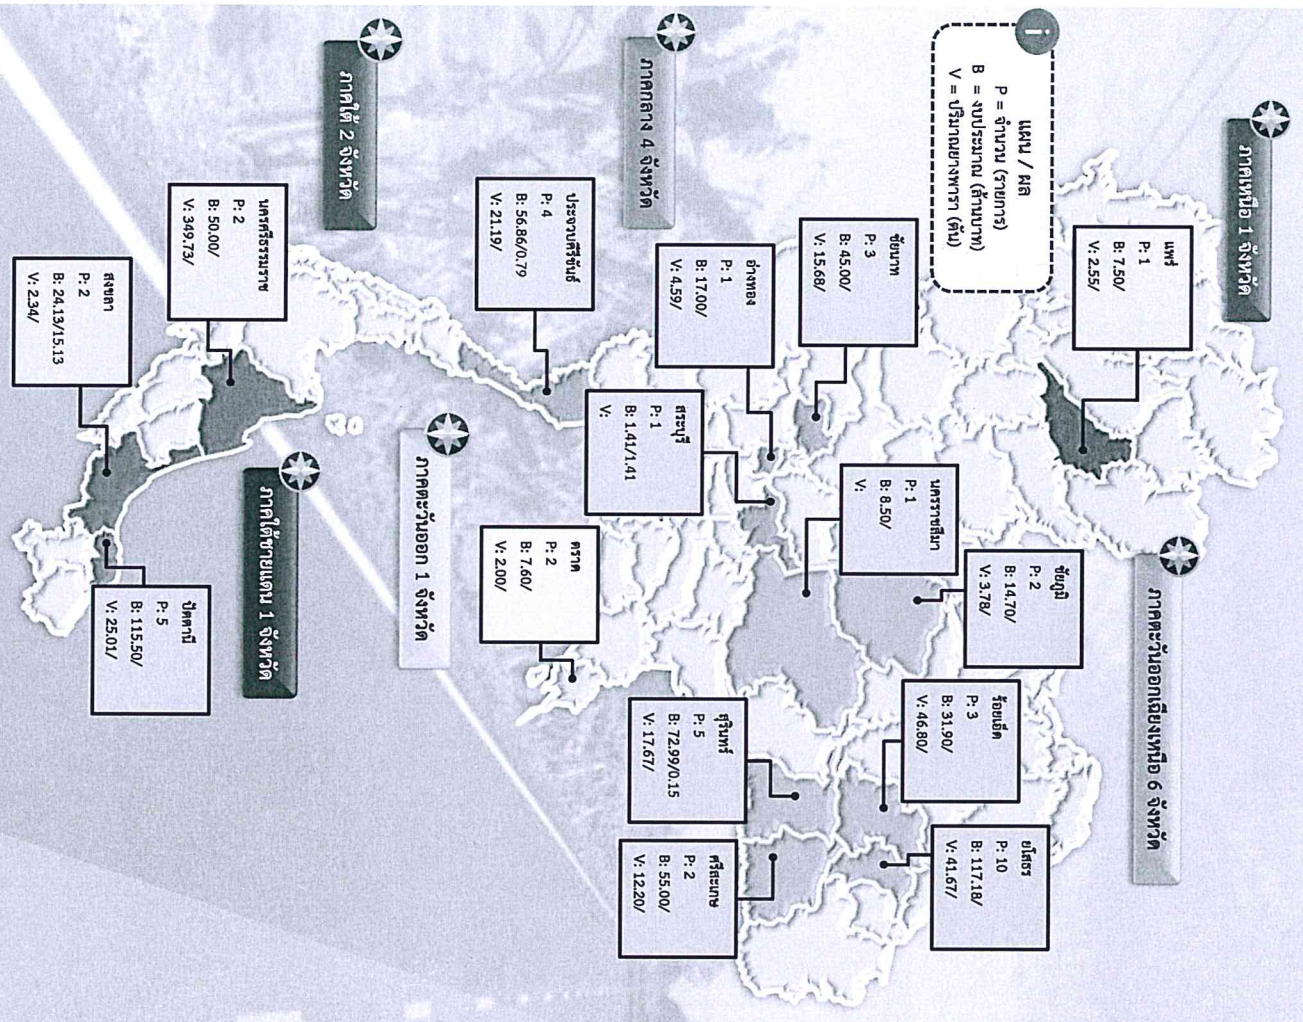

## แผน/ผลการดำเนินงานภาพรวม

| ภาค                | จำนวน (รายการ) | งบประมาณ (ล้านบาท) |                       |          |                        | แผนปริมาณการใช้ยางพารา (ตัน) |
|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------|------------------------|------------------------------|
|                    |                | งบตาม พ.ร.บ. 2567  | งบท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่ายท้องถิ่น |                              |
| รวม 15 จ.          | 44             | 625.26             | 609.84                | 17.48    | 2.87                   | 545.20                       |
| เหนือ              | 1              | 7.50               | 7.50                  | -        | -                      | 2.55                         |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | 23             | 300.26             | 285.47                | 0.15     | 0.05                   | 122.12                       |
| กลาง               | 9              | 120.27             | 120.15                | 2.20     | 1.83                   | 41.45                        |
| ตะวันออก           | 2              | 7.60               | 7.57                  | -        | -                      | 2.00                         |
| ใต้                | 4              | 74.13              | 74.04                 | 15.13    | 20.43                  | 352.07                       |
| ใต้ชายแดน          | 5              | 115.50             | 115.12                | -        | -                      | 25.01                        |

## จำแนกตามประเภทยางพารา

| ประเภท                | จำนวน (รายการ) | งบตาม พ.ร.บ. 2567 (ล้านบาท) | งบท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) | แผนปริมาณการใช้ยางพารา (ตัน) |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Para Asphalt Concrete | 42             | 618.26                      | 605.48                          | 520.90                       |
| ผล                    | -              | 17.48 (2.83%)               | 17.48 (2.89%)                   | -                            |

ยังไม่ดำเนินการ 3 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 13 รายการ (อนุมัติแผน 1 รายการ เงินของ 3 รายการ อนุมัติราคา 9 รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 26 รายการ

| Para Soil Cement | จำนวน (รายการ) | งบตาม พ.ร.บ. 2567 (ล้านบาท) | งบท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) | แผนปริมาณการใช้ยางพารา (ตัน) |
|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| แผน              | 2              | 7.00                        | 4.35                            | 24.30                        |
| ผล               | -              | -                           | -                               | -                            |



อยู่ระหว่างก่อสร้างทั้ง 2 รายการ
