



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ กพง ๐๖/๒๕๖๗/๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๒๖๐๖๒๔/๒๑ มิ.ย. ๖๗

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔๒๑๖๕๓
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗)

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยจากการตรวจสอบจากระบบ Cen-Project พบว่า ยังมีรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕๕๓ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖,๗๘๗.๗๐ ล้านบาท ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ

(นางมณฑา ชาวโพธิ์)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

-ทราบ

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ร.กค., ทน.๑-๓ ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา ปานชา)

ผชช.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.ขอ.

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗



รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

**สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567)**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 6 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 97,010.92 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 37,584.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.74 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 13,256 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 250 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.89 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 463 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.49 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 9,286 รายการ คิดเป็นร้อยละ 70.05 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3,081 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.24 และยกเลิก จำนวน 175 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.33 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ จำนวน 81,118.28 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 25,468.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.40 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 6,765.59 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 4,970.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.47 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 74,352.69 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 20,497.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.57 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 10,360 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 213 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.06 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 340 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.28 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 9,041 รายการ คิดเป็นร้อยละ 87.27 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 591 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.71 และยกเลิก 175 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.69 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้น

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กักไว้เบิกเหลืออมปี งบประมาณ จำนวน 7,479.60 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 6,112.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.72 คงเหลืองบประมาณเงินกักไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน 1,366.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.28 (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจกคืนเงินเหลือจ่าย หรือคาดว่าเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในกำหนด จำนวน 65.20 ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 1,301.78 ล้านบาท) จำนวนรายการทั้งสิ้น 745 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 122 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.38 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 623 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.62

3. งบกลาง พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 5,138.65 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 4,673.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.96 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.33 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,189 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.59 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 คือ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันคลื่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

4. งบกลาง พ.ศ. 2567 งบประมาณ จำนวน 674.02 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 277.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.20 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 39 รายการ ผลการดำเนินงาน ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.80 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.51


5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ จำนวน 1,451.35 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 453.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.23 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 769 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 37 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.81 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 107 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.91 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 625 รายการ คิดเป็นร้อยละ 81.28

6. กองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ จำนวน 1,149.02 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 598.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.08 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 137 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 13 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.49 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 79 รายการ คิดเป็นร้อยละ 57.66 และดำเนินการแล้วเสร็จ 45 รายการ คิดเป็นร้อยละ 32.85



ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินงานและภาวะเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



จัดทำโดย :
ส่วนติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน

รายละเอียดข้อมูล

- 1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- 2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
 - 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2567 (ภาพรวม)
 - 2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2567 จำแนกตามสำนัก/กอง
 - 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 - 2.4 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2567
 - 2.5 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2567
 - 2.6 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เกี่ยวข้องปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ 2566
- 3 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินใ้เบิกเหลือในปี
- 4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- 6 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- 7 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)						หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังมี ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ		
รวมทั้งสิ้น	97,010.92	37,584.00	38.74	13,256	250	463	9,286	3,081	ยกเลิก 176 รายการ	
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567	81,118.28	25,468.16	31.40	10,360	213	340	9,041	591	ยกเลิก 175 รายการ	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	6,765.59	4,970.98	73.47							
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	74,352.69	20,497.18	27.57	10,360	213	340	9,041	591	ยกเลิก 175 รายการ	
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือในปี	7,479.60	6,112.62	81.72	745			122	623		
3. งบกลาง พ.ศ. 2566	5,138.65	4,673.86	90.96	1,206			16	1,189	ยกเลิก 1 รายการ	
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	4,207.98	3,832.21	91.07	1,154			5	1,148	ยกเลิก 1 รายการ	
- โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงตลอด)	8.86	7.77	87.70	1				1		
- โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วช่วยระบบชลประทาน	395.50	395.00	99.87	2				2		
- โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565	2,954.40	2,810.34	95.12	1,142			1	1140	ยกเลิก 1 รายการ	
- โครงการจัดหารถปั้นจั่นลอยทาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกขโมยไปตามกฎหมาย	48.96	48.96	100.00	1				1		
- โครงการฝ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขัวขี้)	300.00	90.21	30.07	1			1			
- โครงการแก้ไขปัญหายุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่	500.26	479.93	95.94	7			3	4		
3.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2566	930.67	841.65	90.43	52			11	41		
4. งบกลาง พ.ศ. 2567	674.02	277.67	41.20	39		3	28	8		
4.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	90.34	90.34	100.00	7				7		
- เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	90.34	90.34	100.00	7				7		
4.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2567	583.68	187.33	32.09	32		3	28	1		
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2567	1,451.35	453.26	31.23	769	37	107		625		
6. กองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2567	1,149.02	598.43	52.08	137		13	79	45		





2.

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2567 (ภาพรวม)

ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project

ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567



ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ จำนวน 591 รายการ
งบประมาณ 2,448.04 ล้านบาท

ทำซื้อผูกพันแล้ว จำนวน 9,632 รายการ (94.57%)
งบประมาณ 65,534.26 ล้านบาท (90.61%)

ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 213 รายการ (2.09%)
งบประมาณ 1,089.28 ล้านบาท (1.51%)

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน	340 รายการ (3.34%)
งบประมาณ	5,698.42 ล้านบาท (7.88%)
อนุมัติแผน	139 รายการ งบประมาณ 1,271.33 ล้านบาท
- ประกาศ TOR	7 รายการ งบประมาณ 329.75 ล้านบาท
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	47 รายการ งบประมาณ 1,263.37 ล้านบาท
- เปิดซอง	28 รายการ งบประมาณ 1,587.39 ล้านบาท
- อนุมัติรับราคา	119 รายการ งบประมาณ 1,246.58 ล้านบาท

✗ ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

✓ ก่อหนี้ผูกพัน



2.2

สรุปผลการทอหินผู้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2567 จำนวนตามสำนัก/กอง - ส่วนกลาง

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567

ยังไม่ทอหินผู้ผูกพัน 553 รายการ

หน่วย : ล้านบาท



- ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดซอง
- อนุมัติรับราคา
- ทำข้อผูกพัน


รายการที่ยังไม่ทอหินผู้ผูกพัน 553 รายการ งบประมาณ 6,787.70 ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	10,182	72,072.96	359	2,690.36	47	1,263.37	28	1,587.39	119	1,246.58	9,629	65,285.26
กพท.	166	12,184.42	6	88.63	1	42.00	6	507.00			153	11,546.79
สพญ.	169	10,404.52	16	343.11	4	328.85	3	345.27			146	9,387.29
สศท.	338	1,579.22	21	46.13	12	493.20	2	453.47	2	11.45	301	574.97
สธบ.	202	633.47	11	35.95	2	0.58	3	40.52	5	40.21	181	516.22
สทท.	42	594.34							15	81.98	27	512.36
สจต.	54	245.31									54	245.31
สสท.	4	93.74	2	7.26							2	86.48
สธส.	30	498.72							1	15.00	29	483.72
สธอ.	20	510.34			6	69.00	2	39.00			12	402.34
สธค.	55	5,004.82	9	602.28							46	4,402.54

ตามบันทึกของแผนงาน ที่ กผง 06/232/2567 ค.ร. 1 พ.ค. 67 แจ้งแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกรายการจะต้องทอหินผู้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ไม่รวมรายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 249.00 ล้านบาท ซึ่งทำข้อผูกพันแล้วทั้งสิ้น และรายการยกเลิก 175 รายการ งบประมาณ 2,092.49 ล้านบาท

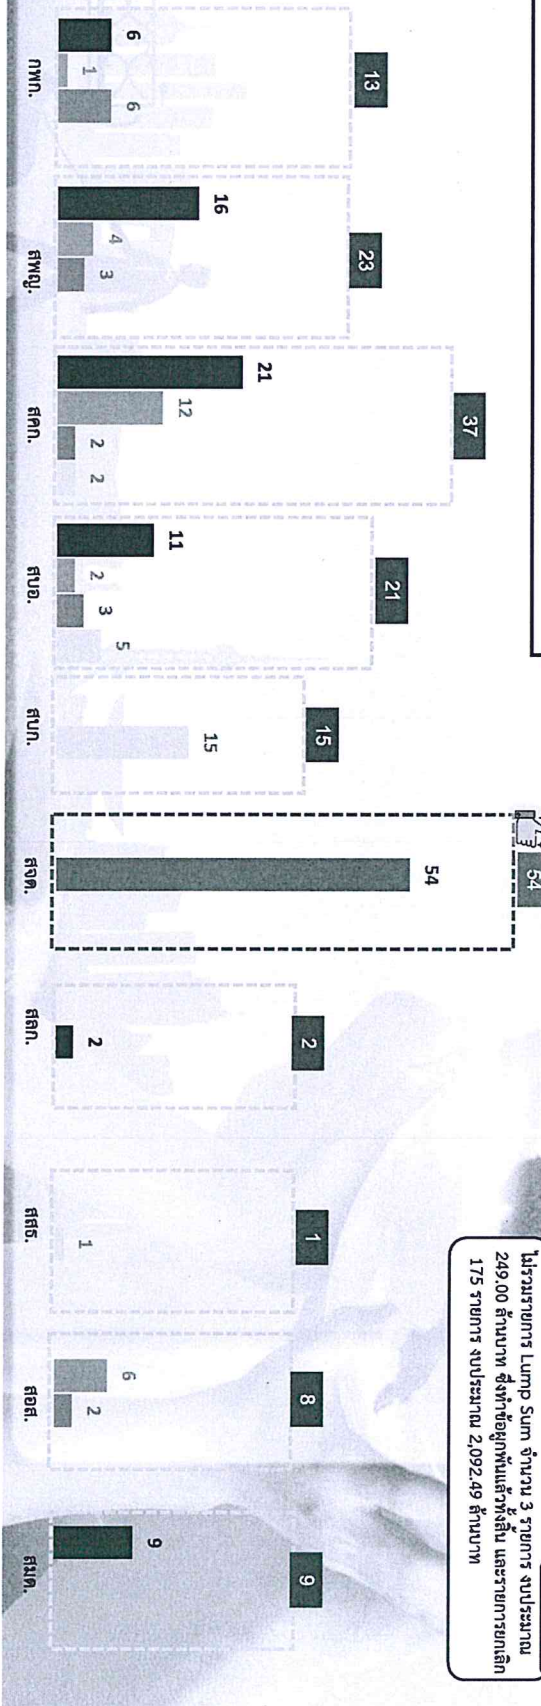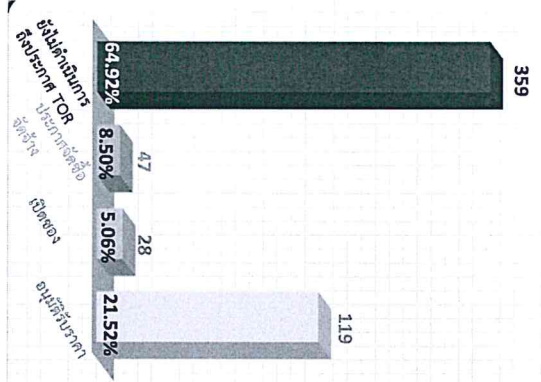



2.2

สรุปผลการทบทวนผู้ถือหุ้น งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2567 - ส่วนผู้ติดตาม

ข้อมูลจากระบบ Gen Project ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567


ยังไม่ทบทวนผู้ถือหุ้น 553 รายการ

ยังไม่ทบทวนผู้ถือหุ้น 553 รายการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	จำนวนรายการ	งบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการถึง		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำสัญญา	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สพ. 1	337	1,501.95	4	1.63	1	17.84			2	5.16	330	1,477.32
สพ. 2	370	2,206.01	12	11.63	2	1.00			5	8.99	351	2,184.39
สพ. 3	356	2,011.80	14	90.67					1	2.00	341	1,919.13
สพ. 4	484	1,789.80	11	92.50	2	31.70			10	11.31	461	1,654.29
สพ. 5	727	3,539.93	7	22.49	1	3.39					719	3,514.04
สพ. 6	539	3,358.42	2	19.70	2	1.78			1	1.00	534	3,335.94
สพ. 7	675	4,670.70	1	1.00					5	53.66	669	4,616.04
สพ. 8	734	3,817.13	13	40.00					3	34.39	710	3,632.95
สพ. 9	744	2,255.70	44	64.71					1	44.80	692	2,118.21

ลำดับ	จำนวนรายการ	งบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการถึง		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำสัญญา	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สพ. 10	704	2,057.45	60	305.92	3	103.75			4	35.80	637	1,611.98
สพ. 11	508	1,380.37	42	155.32	7	19.28			1	6.80	449	1,173.18
สพ. 12	640	2,101.03	12	10.56	1	30.00			4	25.00	617	1,936.47
สพ. 13	609	1,725.57	8	10.11					6	5.00	595	1,710.46
สพ. 14	298	2,534.38	32	174.15	1	20.00			5	139.21	260	2,201.02
สพ. 15	553	1,334.83	11	26.84					3	34.17	539	1,273.82
สพ. 16	523	2,571.81	21	539.76	1	100.00			10	317.62	491	1,614.43
สพ. 17	301	1,467.19			1	1.00			3	17.15	14	295.47

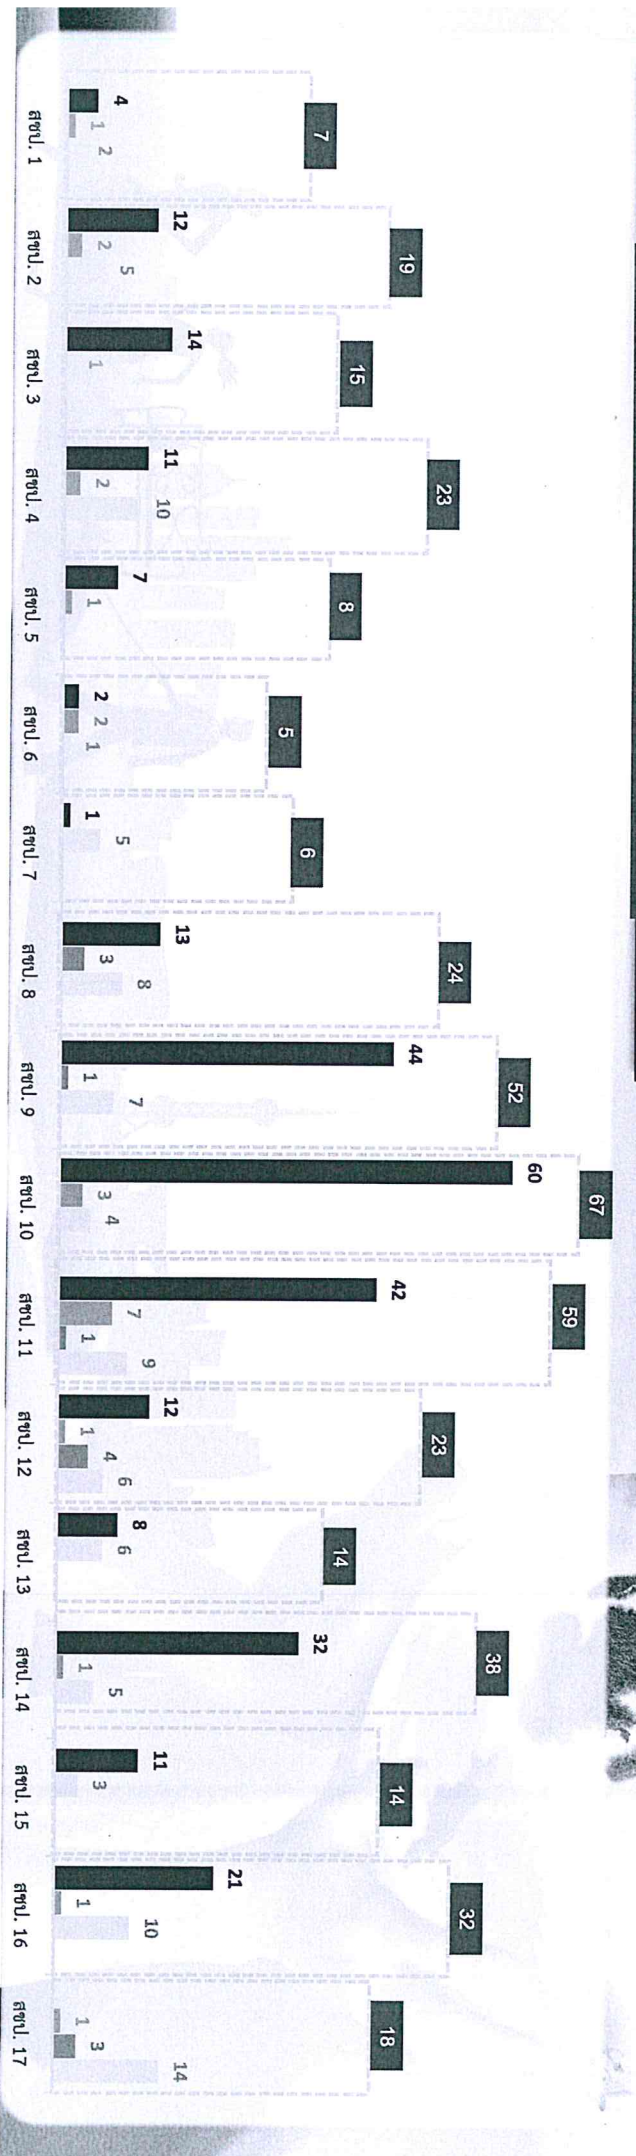

2.3

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2567



81,118.28 ล้านบาท

ภาพรวม

+ PO 43,392.82 ล้านบาท
(53.49%)

③ เบิกจ่าย

25,468.16 ล้านบาท
31.40%

51.00%
-19.60%

6,765.59 ล้านบาท

ประจำ

+ PO 5,021.91 ล้านบาท
(74.23%)

③ เบิกจ่าย

4,970.98 ล้านบาท
73.47%

58.00%
-15.47%

74,352.69 ล้านบาท

ลงทุน


+ PO 38,370.91 ล้านบาท
(51.61%)


③ เบิกจ่าย

20,497.18 ล้านบาท
27.57%

21.00%

--- เป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส 3

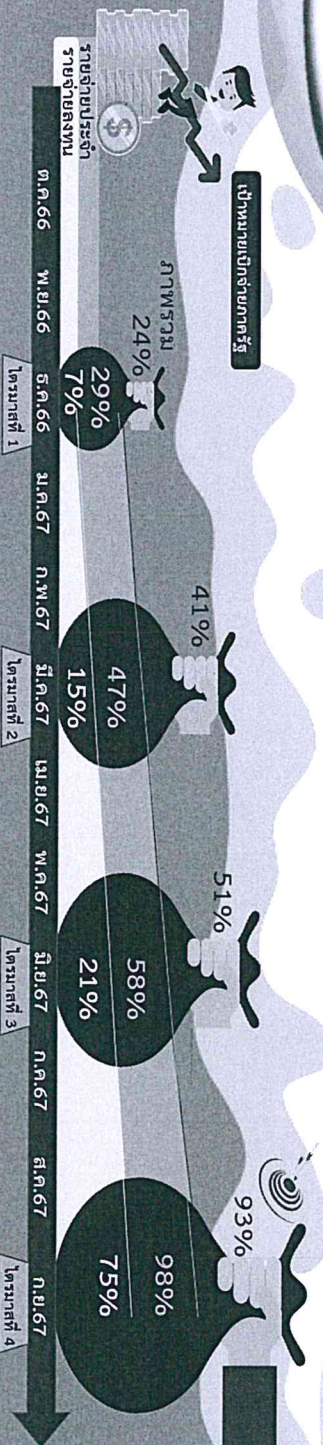




2.4


สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2567

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567

ร้อยละ

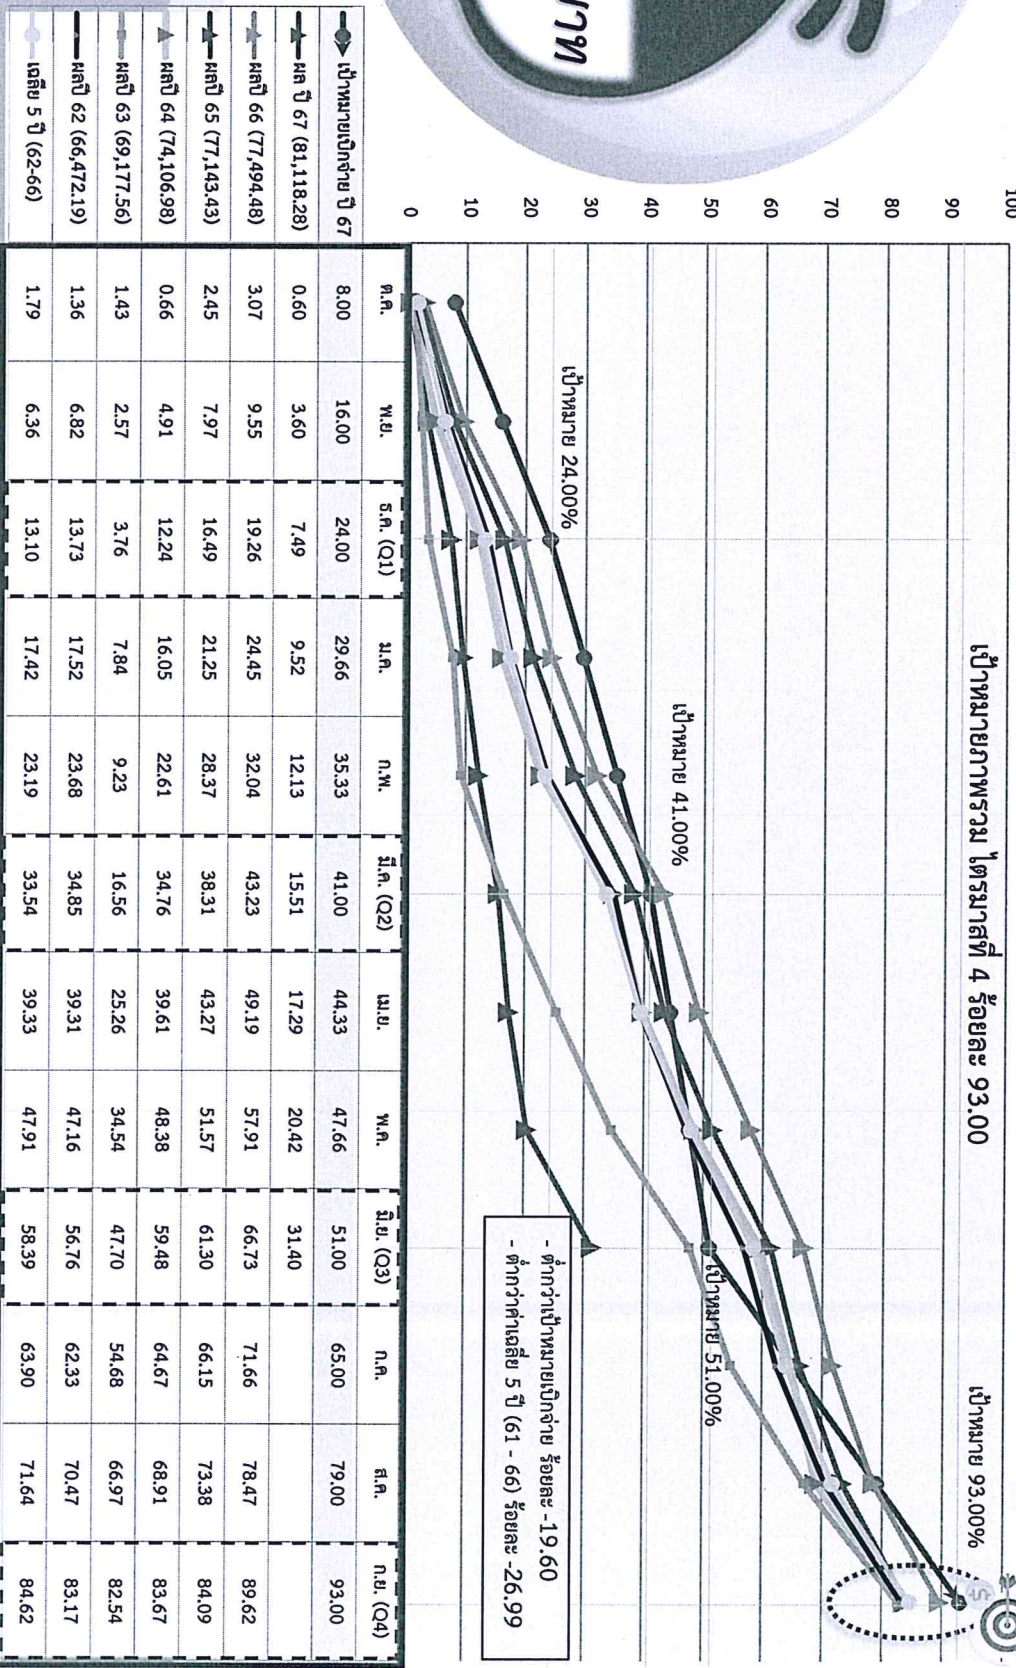

ปีงบประมาณ	พ.ย.	ธ.ค. (Q1)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค. (Q2)	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย. (Q3)	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย. (Q4)
เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 67	8.00	16.00	24.00	29.66	35.33	41.00	44.33	47.66	51.00	55.00	60.00
ค่า ปี 67 (81,118.28)	0.60	3.60	7.49	9.52	12.13	15.51	17.29	20.42	31.40	39.00	47.00
ค่า ปี 66 (77,494.48)	3.07	9.55	19.26	24.45	32.04	43.23	49.19	57.91	66.73	71.66	78.47
ค่า ปี 65 (77,143.43)	2.45	7.97	16.49	21.25	28.37	38.31	43.27	51.57	61.30	66.15	73.38
ค่า ปี 64 (74,106.98)	0.66	4.91	12.24	16.05	22.61	34.76	39.61	48.38	59.48	64.67	73.67
ค่า ปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	7.84	9.23	16.56	25.26	34.54	47.70	54.68	66.97
ค่า ปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47
เฉลี่ย 5 ปี (62-66)	1.79	6.36	13.10	17.42	23.19	33.54	39.33	47.91	58.39	63.90	71.64



2.5

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567

สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2567



ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค. (Q1)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค. (Q2)	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย. (Q3)	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย. (Q4)	
เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 67	2.33	4.66	7.00	9.66	12.33	15.00	17.00	19.08	21.00	39.00	57.00	75.00
ผล ปี 67 (74,605.26)	0.03	2.44	5.95	7.45	9.53	12.32	13.56	20.25	27.57			
ผลปี 66 (70,682.86)	2.68	8.95	18.71	23.53	30.98	42.48	48.24	57.04	65.95	70.58	77.24	88.62
ผลปี 65 (70,135.62)	1.94	7.11	15.67	20.09	27.12	37.20	41.86	50.22	60.17	64.59	71.80	82.46
ผลปี 64 (66,423.87)	0.003	3.81	10.97	14.29	20.79	33.39	37.9	46.78	58.21	63.11	66.85	82.02
ผลปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	4.77	5.36	12.51	21.31	30.59	44.54	51.34	64.24	80.61
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
เฉลี่ย 5 ปี (61 - 65)	1.20	5.30	11.79	15.64	21.13	31.70	37.24	45.83	56.68	61.83	69.60	82.96

ถึงทุน
74,352.69 ล้านบาท

เบิกจ่าย
20,497.18 ล้านบาท
27.57%



2.9

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ 2566

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)								
1	กระทรวงมหาดไทย	130,587.93	51,869.57	39.72	80,878.50	24,003.33	29.68	10.04
2	กระทรวงคมนาคม	171,219.84	46,527.36	27.17	168,315.77	103,984.26	61.78	-34.61
3	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	83,876.50	22,150.52	26.41	92,568.37	61,727.01	66.68	-40.27
ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)								
1	กรมพัฒนาที่ดิน	2,476.72	717.70	28.98	1,902.56	1,447.46	76.08	-47.10
2	กรมชลประทาน	74,352.69	20,497.18	27.57	70,144.21	43,205.65	61.60	-34.03
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,553.47	349.47	22.50	1,436.06	501.61	34.93	-12.43
ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเดียวกัน)								
1	กรมทางหลวง	116,083.23	36,133.89	31.13	113,202.42	73,505.79	64.93	-33.80
2	กรมชลประทาน	74,352.69	20,497.18	27.57	70,144.21	43,205.65	61.60	-34.03
3	กรมโยธาธิการและผังเมือง	36,692.79	9,005.86	24.54	33,310.31	8,659.40	26.00	-1.46
4	กรมทางหลวงชนบท	46,361.41	9,330.93	20.13	45,468.75	27,339.18	60.13	-40.00

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567


2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 32.82%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (45 หน่วยงาน) เฉลี่ย 31.81%



ภาพรวม

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือในปี

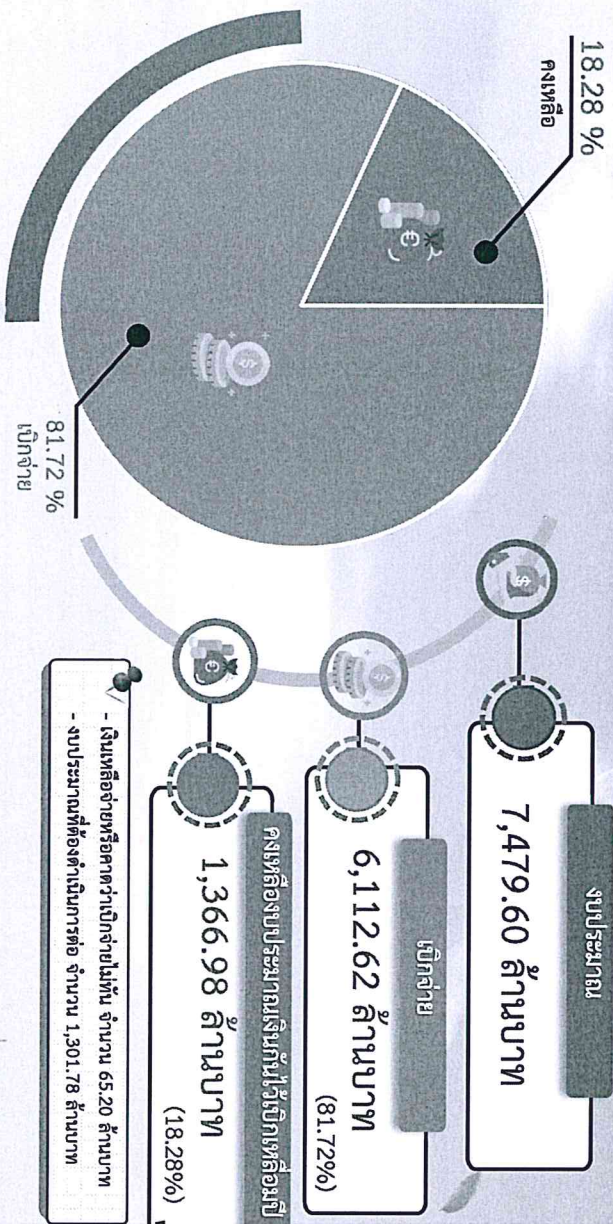

งบประมาณ

7,479.60 ล้านบาท

เบิกจ่าย

6,112.62 ล้านบาท (81.72%)

คงเหลืองบประมาณเงินที่ใช้เบิกเหลือในปี

1,366.98 ล้านบาท (18.28%)

- เงินที่จ่ายหรือคาดว่าจะจ่ายไม่ทัน จำนวน 65.20 ล้านบาท
- งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 1,301.78 ล้านบาท

แผน/ผลทงการเบิกจ่าย (รายเดือน)

แผน	รวม	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
งบ	7,479.60	5,332.25	584.47	480.70	479.45	215.22	139.30	248.21
ผล	6,112.62	5,332.25	341.88	309.07	129.42			
ผลต่าง	-1,366.98	-	-242.59	-171.63	-350.03			

สถานะการดำเนินงาน 745 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

623 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

122 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่ทันไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้ท่าวมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมามีในช่วงของการเพาะปลูก หรือเกี่ยวข้าว ผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด



งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566



ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567

การดำเนินงาน

มีมติ คร.รม./คำสั่งนายก อบมัติงบกลาง 66
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ
งบประมาณ 5,138.65 ล้านบาท
เบิกจ่าย 4,673.86 ล้านบาท
90.96 %

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน

งบประมาณ 4,207.98 ล้านบาท
เบิกจ่าย 3,832.21 ล้านบาท
91.07 %

งบพระราชดำริ (ป.ร.)
งบประมาณ 930.67 ล้านบาท
เบิกจ่าย 841.65 ล้านบาท
90.43 %

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง 16 รายการ 1.33 %
แล้วเสร็จ 1,189 รายการ 98.59 %
ยกเลิก 1 รายการ 0.08 %

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 2,586,746 ไร่ 93.22 %
ครัวเรือน 422,447 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 417,388 ครัวเรือน 98.80 %

ปริมาณน้ำ 11,80 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = 11,80 ล้าน ลบ.ม.
100 %



1 รายการ
8.86 ล้านบาท

เบิกจ่าย 7.77 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 87.75

■ แล้วเสร็จ 1 รายการ

100 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

2 รายการ
395.50 ล้านบาท

เบิกจ่าย 395.00 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 99.87

■ แล้วเสร็จ 2 รายการ

100 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

1,142 รายการ
2,954.40 ล้านบาท

เบิกจ่าย 2,810.34 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 95.12

■ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ
■ แล้วเสร็จ 1,140 รายการ
■ ยกเลิก 1 รายการ

99.89 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

1 รายการ
48.96 ล้านบาท

เบิกจ่าย 48.96 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100

■ แล้วเสร็จ 1 รายการ

100 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

1 รายการ
300.00 ล้านบาท

เบิกจ่าย 90.21 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 30.07

■ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ

90.00 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

7 รายการ
500.26 ล้านบาท

เบิกจ่าย 479.93 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 95.94

■ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 รายการ
■ แล้วเสร็จ 4 รายการ

98.96 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

52 รายการ
930.67 ล้านบาท

เบิกจ่าย 841.65 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 90.43

■ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 11 รายการ
■ แล้วเสร็จ 41 รายการ

95.59 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

แผนงานบริหารเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือจำแนกตามระบบบัญชีว่าอยู่ในงบกลางหรือจำแนกตามระบบบัญชีว่าอยู่ในงบกลาง (ยกเว้นงบกลางสำรอง)

ค่าปรับประเภชปี 200 ไร่ / 200 ไร่

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วระดับชุมชนตำบล

เพื่อติดตั้งตามและประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วระดับชุมชนตำบล 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าช้าง ตำบลท่าซำ ตำบลท่าซำ และตำบลท่าซำ

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่บริเวณลำน้ำสายตอนต้น

พื้นที่งบประมาณ 2,600,739 ไร่ / 2,581,546 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน / 416,388 ครัวเรือน

รถถังดับเพลิงขนาด 50 ลิตร (All Terrain Crane) พดแทนงบประมาณที่ถูกพบใบกำกับภาษี

ดำเนินการจัดการรถถังดับเพลิงเพื่อการเตรียมความพร้อมแก๊สและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนไปยังรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โครงการสำรวจข้อมูลด้านน้ำปิง (โครงการหนองขี้จุก)


พื้นที่งบประมาณ 106,000 ไร่ / - ไร่

โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำพระยาใหญ่

ปริมาณน้ำ 11,80 ล้าน ลบ.ม. / 11,80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 66,000 ไร่ / 5,000 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน / 1,000 ครัวเรือน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2566

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาหนังสือพิมพ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการอุปถัมภ์ศึกษา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



5

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567



734 ถนนวิภาวดีรังสิต

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567



ภาพรวมงบกลาง 2567

งบประมาณ 674.02 ล้านบาท
 เบิกจ่าย 277.67 ล้านบาท
 41.20 %

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน		งบพระราชดำริ (กปร.)	
งบประมาณ	90.34 ล้านบาท	งบประมาณ	583.68 ล้านบาท
เบิกจ่าย	90.34 ล้านบาท	เบิกจ่าย	187.33 ล้านบาท
	100.00 %		32.09 %



สจป.
อนุมัติ

18 ม.ค. 67



7 รายการ

90.34 ล้านบาท



เบิกจ่าย 90.34 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 100

แล้วเสร็จ 7 รายการ



กปร.

ปี 2567



32 รายการ

583.68 ล้านบาท



เบิกจ่าย 187.33 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 32.09

แล้วเสร็จ 1 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 28 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ

3 รายการ



ผลการดำเนินงาน 39 รายการ



แล้วเสร็จ

8 รายการ

20.51 %



อยู่ระหว่างก่อสร้าง

28 รายการ

71.80 %



อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

3 รายการ

7.69 %



เป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาใต้ (ค่า K) ในรายการ
ก่อสร้างต่าง ๆ

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาใต้ (ค่า K)

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน
จัดหาแหล่งน้ำ ในโรงเรียนตำรวจตะเวน
ชายแดนและ โครงการศูนย์ศึกษาอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) ประจำปี 2567





6-7


ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567)

6

เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ 1,451.35 ล้านบาท
(งบจัดสรร 1,359.77 ล้านบาท)
เบิกจ่าย 453.26 ล้านบาท (31.23%)



ผลการดำเนินงาน : 769 รายการ

	ดำเนินการแล้วเสร็จ	625	รายการ
	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	107	รายการ
	ยังไม่ดำเนินการ	37	รายการ



7

งานกองทุน
จัดรูปที่ดิน

ภาพรวม

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จำนวน 54 รายการ



งบประมาณ 405.72 ล้านบาท = เบิกจ่าย 248.55 ล้านบาท (61.26%)

	ผลการดำเนินงาน	→	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2	รายการ
		→	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	34	รายการ
		→	ดำเนินการแล้วเสร็จ	18	รายการ
	ผลสัมฤทธิ์		พื้นที่เกษตรกรรม	34,569 ไร่ / 8,712 ไร่	
			ครัวเรือนรับประโยชน์	2,779 ครัวเรือน / 774 ครัวเรือน	

จัดระบบน้ำเพื่อเกษตร

จำนวน 83 รายการ



งบประมาณ 743.30 ล้านบาท = เบิกจ่าย 349.88 ล้านบาท (47.07%)

	ผลการดำเนินงาน	→	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11	รายการ
		→	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	45	รายการ
		→	ดำเนินการแล้วเสร็จ	27	รายการ
	ผลสัมฤทธิ์		พื้นที่เกษตรกรรม	51,160 ไร่ / 14,493 ไร่	
			ครัวเรือนรับประโยชน์	4,498 ครัวเรือน / 1,344 ครัวเรือน	

งบประมาณ 1,149.02 ล้านบาท

เบิกจ่าย 598.43 ล้านบาท (52.08%)



	ผลการดำเนินงาน :	137	รายการ
	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	13	รายการ
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	79	รายการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	45	รายการ

	ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ		
	พื้นที่เกษตรกรรม	85,729 ไร่ / 23,205 ไร่	
	ครัวเรือนรับประโยชน์	7,277 ครัวเรือน / 2,118 ครัวเรือน	

