



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ผตบ.ผง. ๗๒๕ /๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรายงานก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

งพ. ๓๖๗๕

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปรายงานก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อใช้ในการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อธช. ทราบ


13 พค ๕๙
(นางสมศรี วิจักขณภุริโสภณ)

ตบ.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตบ.ผง.

เรียน อธช. รธบ. รธส. รธว. รธร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ

- ๑๙๙๗
- เรียน ผอ. กิ่ง
- เพื่อทราบ



(นายไวฑิต โอชวิช)

ผวง.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.



(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)
ผส.บอ.

17 พ.ค. 2559

๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2559)

1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2557 (มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ)

1.1 ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 1,163 รายการ แล้วเสร็จ 1,159 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.66 และอยู่ระหว่างดำเนินงาน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.34 ได้แก่ 1) จัดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ งบประมาณ 3.51 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80.00 2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเจริญ (ตอนบน) จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 52.21 ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 2.00 3) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง งบประมาณ 79.21 ผลการดำเนินงานร้อยละ 75.50 และ 4) ก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน งบประมาณ 82.96 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 83.35

1.2 ผลการเบิกจ่าย วงเงินงบประมาณ 5,406.91 ล้านบาท ได้รับการจัดสรร 4,163.22 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,914.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.02

2. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)

2.1 ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 7,343 รายการ งบรายจ่ายลงทุน จำนวน 38,581.63 ล้านบาท เป็นรายการผูกพันเดิม 79 รายการ งบประมาณ 5,477.97 ล้านบาท (ก่อนนี้แล้วทั้งหมด) โดยจำแนกสถานะ ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 4,133 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 56.28 งบประมาณ 5,170.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.40

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2,893 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 39.40 งบประมาณที่ก่อนนี้ 24,969.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.72

- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 151 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.06 งบประมาณ 3,857.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00

- ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 166 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 2.26 งบประมาณ 122.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.32

- เป็นงบบุคลากร งบดำเนินงาน และโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณ 4,462.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.57

- รายการที่ยังไม่ก่อนนี้ส่วนใหญ่เป็นรายงานที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดำเนินการ

2.2 ผลการเบิกจ่าย กรมได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 46,708.93 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,6486.45 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน 23,737.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.06 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 3 กำหนดไว้ (ร้อยละ 73.00) ร้อยละ 21.94 สำหรับงบรายจ่ายลงทุน 38,581.63 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 38,168.76 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 19,224.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.37 ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 61.00) ร้อยละ 10.63 รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2558	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาลไตร มาสที่ 3 (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/ โอน □ เปลี่ยนแปลง		
รวม	46,708.93	46,486.45	23,737.22	51.06	73.00	- 21.94
รายจ่ายประจำ	8,127.30	8,317.68	4,512.81	54.26	76.00	- 21.74
รายจ่ายลงทุน	38,581.63	38,168.77	19,224.41	50.37	61.00	- 10.63

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GMIS + มากกว่าเป้าหมาย - น้อยกว่าเป้าหมาย

: ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายจ่ายลงทุน
จำนวน 222,467,884 บาท

3. งบกลาง

3.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน

3.1.1 ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 89 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 18 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.22 แล้วเสร็จ 71 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.78 จำแนกตามลักษณะงาน ดังนี้

- งานผูกพันใหม่ จำนวน 18 รายการ งบประมาณ 1,332.2140 ล้านบาท เบิกจ่าย 645.0732 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.42 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 แล้วเสร็จ 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.56

- งานปีเดียว จำนวน 71 รายการ งบประมาณ 952.1548 ล้านบาท เบิกจ่าย 738.8013 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.59 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.08 แล้วเสร็จ 61 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.92

3.1.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับการจัดสรร 2,284.3788 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,383.8745 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.58

3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่นาร่อง (ระยะสั้น)

3.2.1 ผลการดำเนินงาน จำนวน 42 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 39 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.86

3.2.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 40.70 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 33.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.40

3.3 โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

3.3.1 การดำเนินงาน จำนวน 5,061 ยกเล็ก 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.14 แล้วเสร็จ 5,054 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.86

3.3.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 3,350.7531 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,322.2610 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.15

ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ

3.4 งบกลางคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2558

3.4.1 ผลการดำเนินงาน จำนวน 101 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.76 และดำเนินการแล้วเสร็จ 77 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.24

3.4.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 1,887.8724 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,243.3809 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.86

3.5 งบกลางคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2559

3.5.1 ผลการดำเนินงาน จำนวน 76 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.79 ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.32 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.26 และดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.63

3.5.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 928.0221 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 210.0700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.64

3.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน

กรมชลประทานดำเนินการโครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน จำนวน 28 รายการ งบประมาณ 578.66 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 507.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.78 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.57 แล้วเสร็จ 27 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.43 แยกเป็น

3.6.1 ดำเนินการโดยกองทัพบก 22 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.54 แล้วเสร็จ 21 รายการ คิดเป็นร้อยละ 95.45 งบประมาณ 373.66 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 303.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.20

3.6.2 ดำเนินการโดยกรมชลประทาน 6 รายการ แล้วเสร็จ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับจัดสรร 205.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 204.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.76

4. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (เงินกู้)

ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 723 รายการ งบประมาณ 23,856.38 ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 30 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.15 อยู่ระหว่างดำเนินการ 294 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.66 แล้วเสร็จ 399 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.19 จำแนกตามลักษณะงาน ดังนี้

- งานผูกพันใหม่ จำนวน 97 รายการ งบประมาณ 7,740.24 ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 79 รายการ คิดเป็นร้อยละ 81.44 แล้วเสร็จ 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.53

- งานปีเดียวจำนวน 626 รายการ งบประมาณ 16,116.15 ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.63 ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.64 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 211 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.70 แล้วเสร็จ 382 รายการ คิดเป็นร้อยละ 61.02

ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 22,426.36 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 11,849.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.84

5. เงินกู้ยืมปี พ.ศ. 2554-2558

5.1 ผลการดำเนินงาน จำนวน 530 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 297 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.04 ดำเนินแล้วเสร็จ 233 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.96

5.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรรเงินกู้ยืมปี 2554-2558 จำนวน 4,910.66 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,636.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.34

6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2559

6.1 ผลการดำเนินงาน จำนวน 416 รายการ (งบลงทุน : ครุภัณฑ์ และโครงการ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 112 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.92 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.04 แล้วเสร็จ จำนวน 204 รายการ คิดเป็นร้อยละ 49.04

6.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 542.50 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 113.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.84

7. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2559

7.1 ผลการดำเนินงาน จำนวน 59 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.47 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 53 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89.83 แล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.70

7.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 677.16 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 413.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.01

ตารางผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบ พ.ร.บ.)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

โครงการ / หน่วยงาน	เป้าหมายสำนัก เดือน เมษายน 59	ข้อมูลจากระบบติดตาม online กองแผนงาน					ผลต่างจาก เป้าหมาย (พ.ร.บ.)	ผลต่างจาก เป้าหมาย (จัดสรร)
		งบประมาณ พ.ร.บ. (บาท)	งบประมาณโอนจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/ พ.ร.บ.	ร้อยละเบิกจ่าย/ จัดสรร		
รวม	67.16	37,903,272,185	34,646,664,434	18,559,984,900	48.97	53.57	18.19	13.59
สขป.1	83.51	1,120,997,900	1,081,149,637	707,105,909	63.08	65.40	20.43	18.11
สขป.2	76.05	963,185,700	914,044,878	615,817,561	63.94	67.37	12.11	8.68
สขป.3	75.23	889,536,300	792,541,321	441,109,786	49.59	55.66	25.64	19.57
สขป.4	73.62	1,262,707,700	1,155,526,919	613,029,671	48.55	53.05	25.07	20.57
สขป.5	70.93	1,089,750,500	1,067,623,351	657,432,607	60.33	61.58	10.60	9.35
สขป.6	61.48	1,456,126,500	1,378,048,762	633,953,133	43.54	46.00	17.94	15.48
สขป.7	49.10	1,248,717,800	1,182,463,123	720,018,594	57.66	60.89	-8.56	-11.79
สขป.8	67.82	1,687,755,400	1,569,760,597	994,615,861	58.93	63.36	8.89	4.46
สขป.9	51.92	1,605,673,600	1,531,585,419	676,455,872	42.13	44.17	9.79	7.75
สขป.10	79.32	1,052,388,200	1,014,966,634	723,277,674	68.73	71.26	10.59	8.06
สขป.11	48.48	1,303,328,500	1,208,373,249	636,820,342	48.86	52.70	-0.38	-4.22
สขป.12	65.16	1,892,050,600	1,856,769,450	1,024,689,252	54.16	55.19	11.00	9.97
สขป.13	72.04	1,017,675,500	960,410,791	575,258,686	56.53	59.90	15.51	12.14
สขป.14	70.50	967,981,500	912,789,330	574,832,706	59.38	62.98	11.12	7.52
สขป.15	74.81	891,957,500	742,900,885	490,246,659	54.96	65.99	19.85	8.82
สขป.16	66.16	1,331,485,265	1,331,760,619	788,467,475	59.22	59.20	6.94	6.96
สขป.17	74.26	965,053,220	994,661,494	622,351,356	64.49	62.57	9.77	11.69
สพญ.	55.44	7,111,287,000	6,277,160,860	2,287,986,352	32.17	36.45	23.27	18.99
กพท.	68.16	8,013,096,000	7,522,883,949	3,984,999,063	49.73	52.97	18.43	15.19
สบอ.	59.04	169,859,900	167,013,972	66,504,912	39.15	39.82	19.89	19.22
สบก.	50.00	376,814,400	97,490,000	31,421,227	8.34	32.23	41.66	17.77
สอส.	41.00	20,844,900	32,430,130	8,036,494	38.55	24.78	2.45	16.22
สคก.	100.00	150,572,300	150,115,631	143,786,710	95.49	95.78	4.51	4.22
สสธ.	65.00	296,031,000	242,310,985	162,581,319	54.92	67.10	10.08	-2.10
สจต.	91.30	59,300,000	57,315,468	44,978,632	75.85	78.48	15.45	12.82
สมต.	48.45	955,213,000	400,872,980	331,424,196	34.70	82.68	13.75	-34.23
สวพ.	74.52	3,882,000	3,694,000	2,782,851	71.69	75.33	2.83	-0.81


1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปี 2559 GFMIS (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2559) เวลา 16.30 น.

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี 2559 (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ ภายหลังปรับ ลดตาม พ.ร.บ. โอน 2559	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/พ.ร.บ. หลังปรับลด		
รวม	46,708.9248	46,486.4569	23,737.2229	51.06	73.00	- 21.94
รายจ่ายประจำ	8,127.2983	8,127.2983	4,512.8084	54.26	76.00	- 21.74
รายจ่ายลงทุน	38,581.6265	38,359.1586	19,224.4145	50.37	61.00	- 10.63

หมายเหตุ : ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายจ่ายลงทุน จำนวน 222,467,884 บาท

1.2 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559

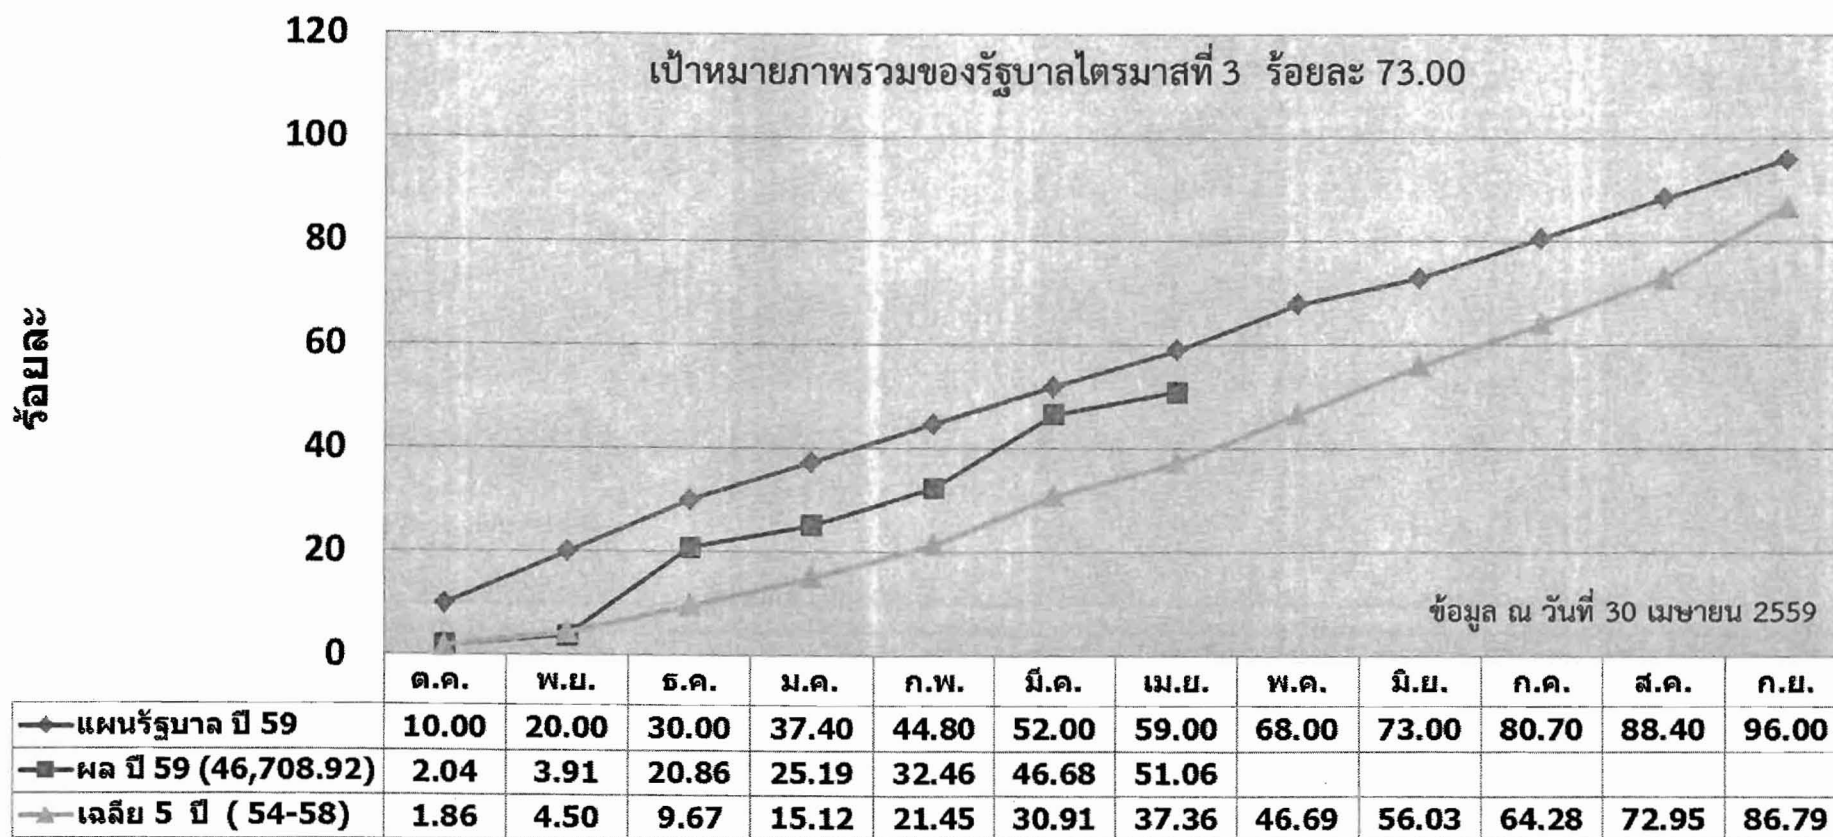


หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30 % ไตรมาสที่ 2 = 52 % ไตรมาสที่ 3 = 73 % ไตรมาสที่ 4 = 96

1.4 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 59) ของ สชป. 1-17

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น.)


ร้อยละ

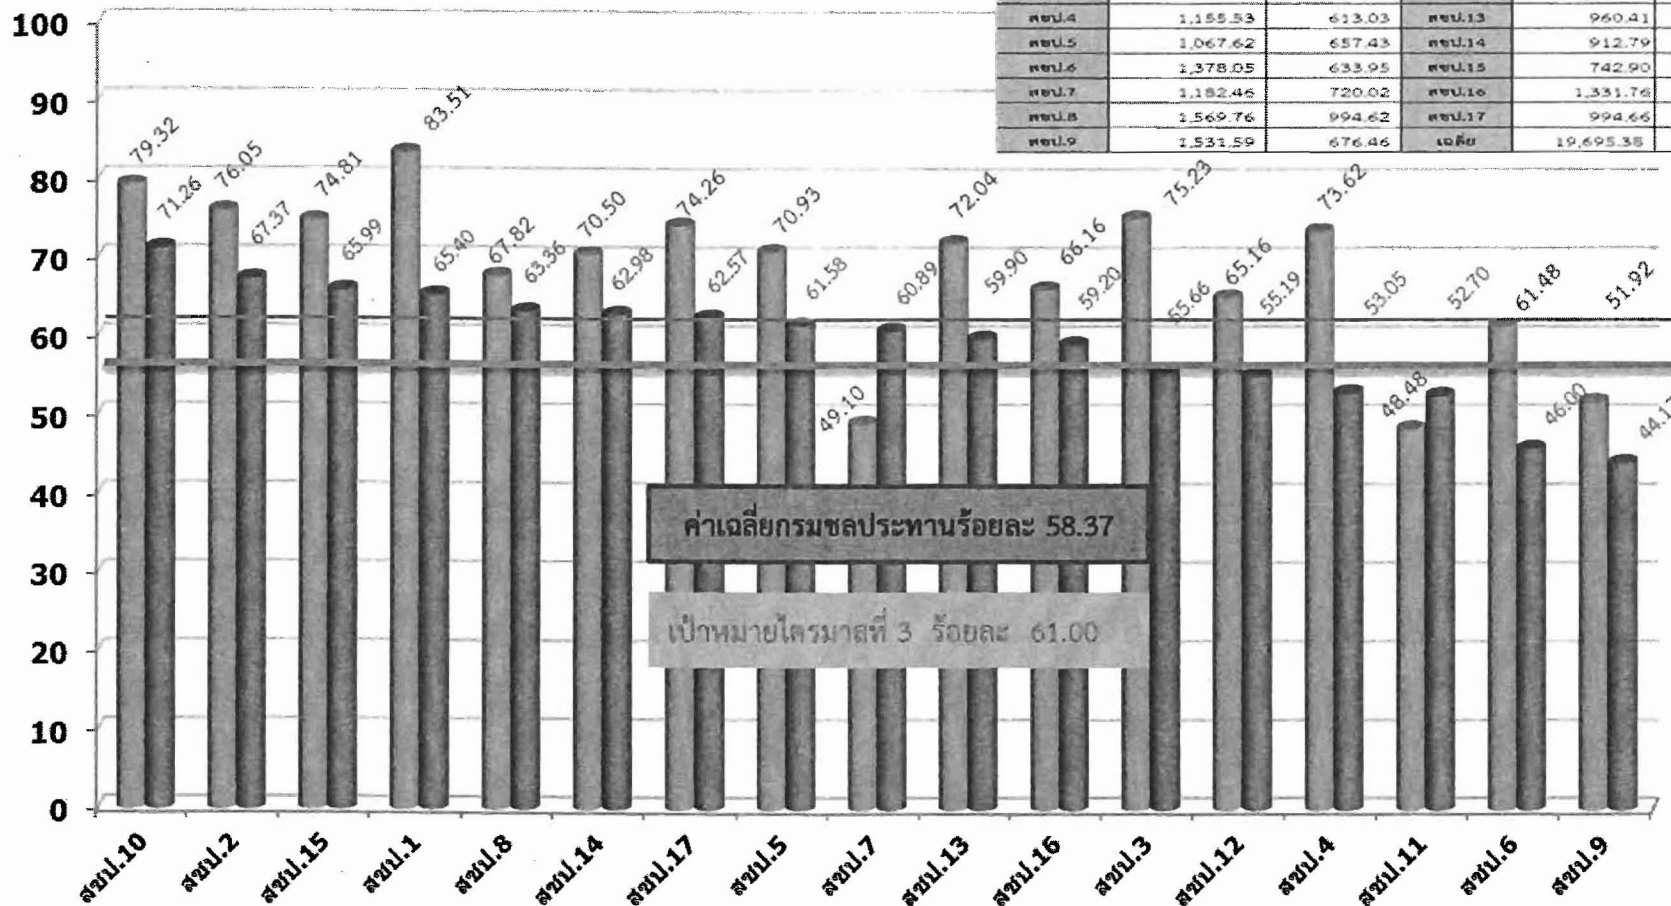


- แผนการเบิกจ่ายรายสำนัก เดือน เมษายน 2559
- ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

1.5 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 59) ของ ส่วนกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น.)

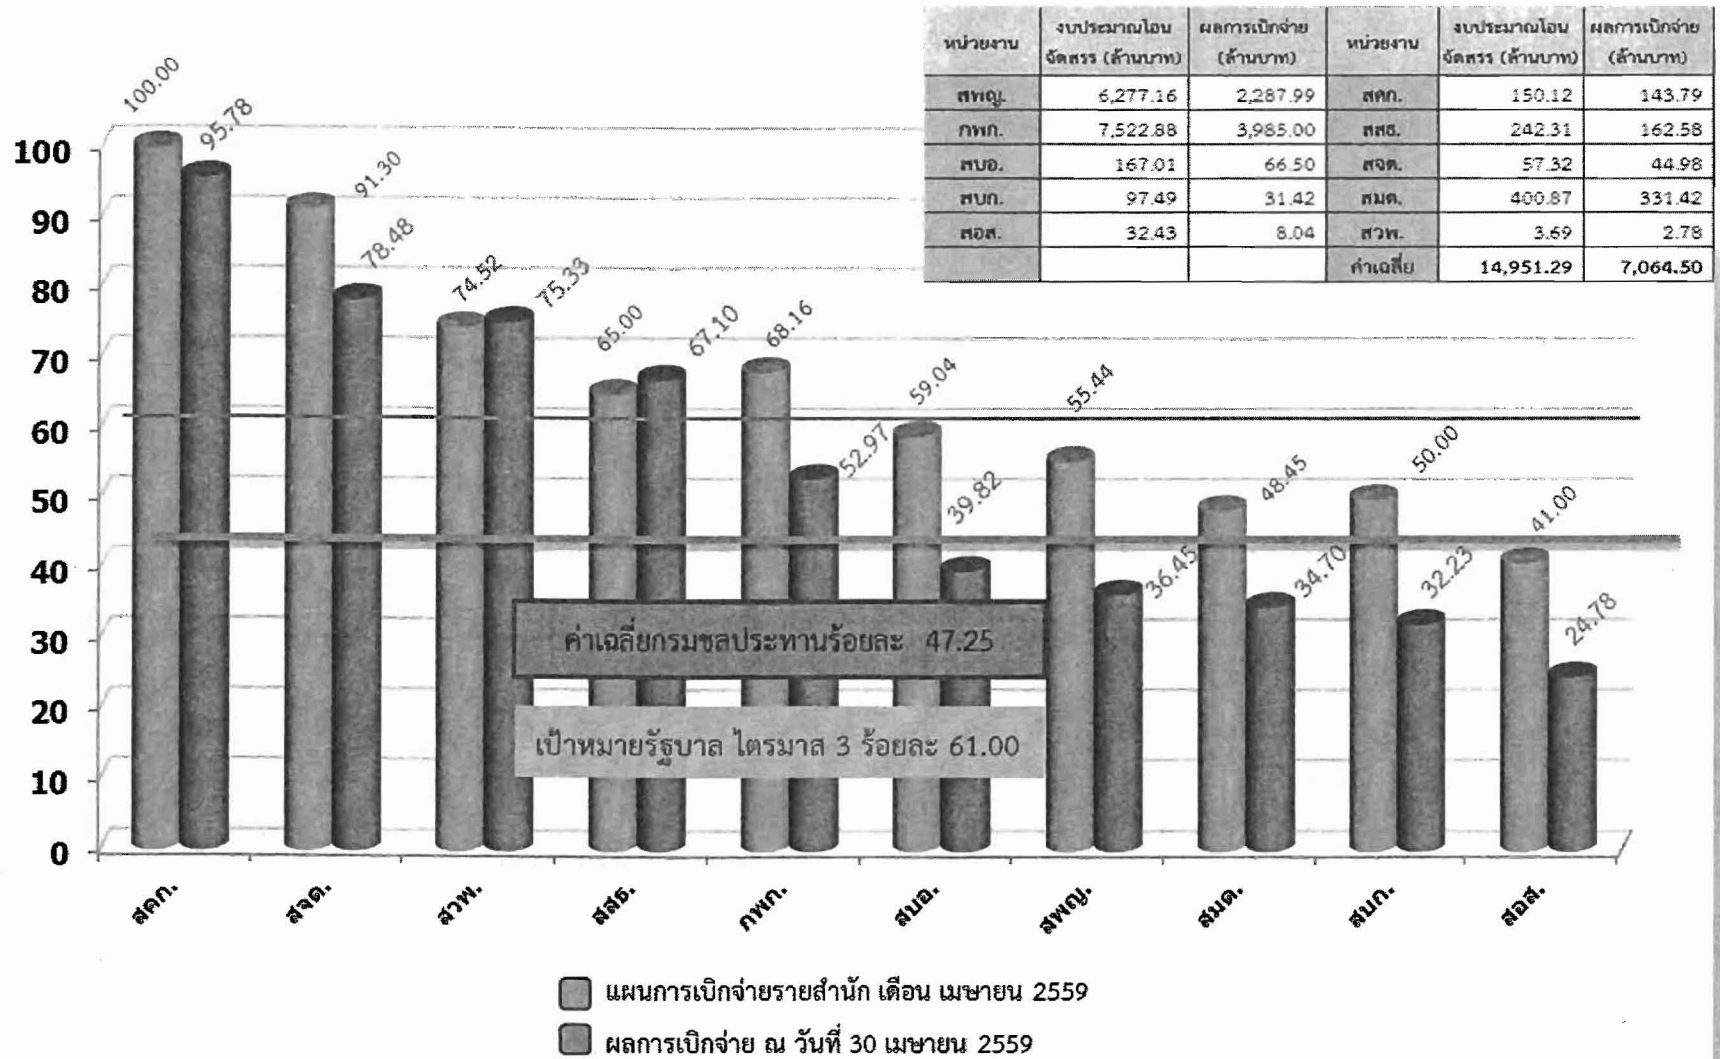

1.3 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559

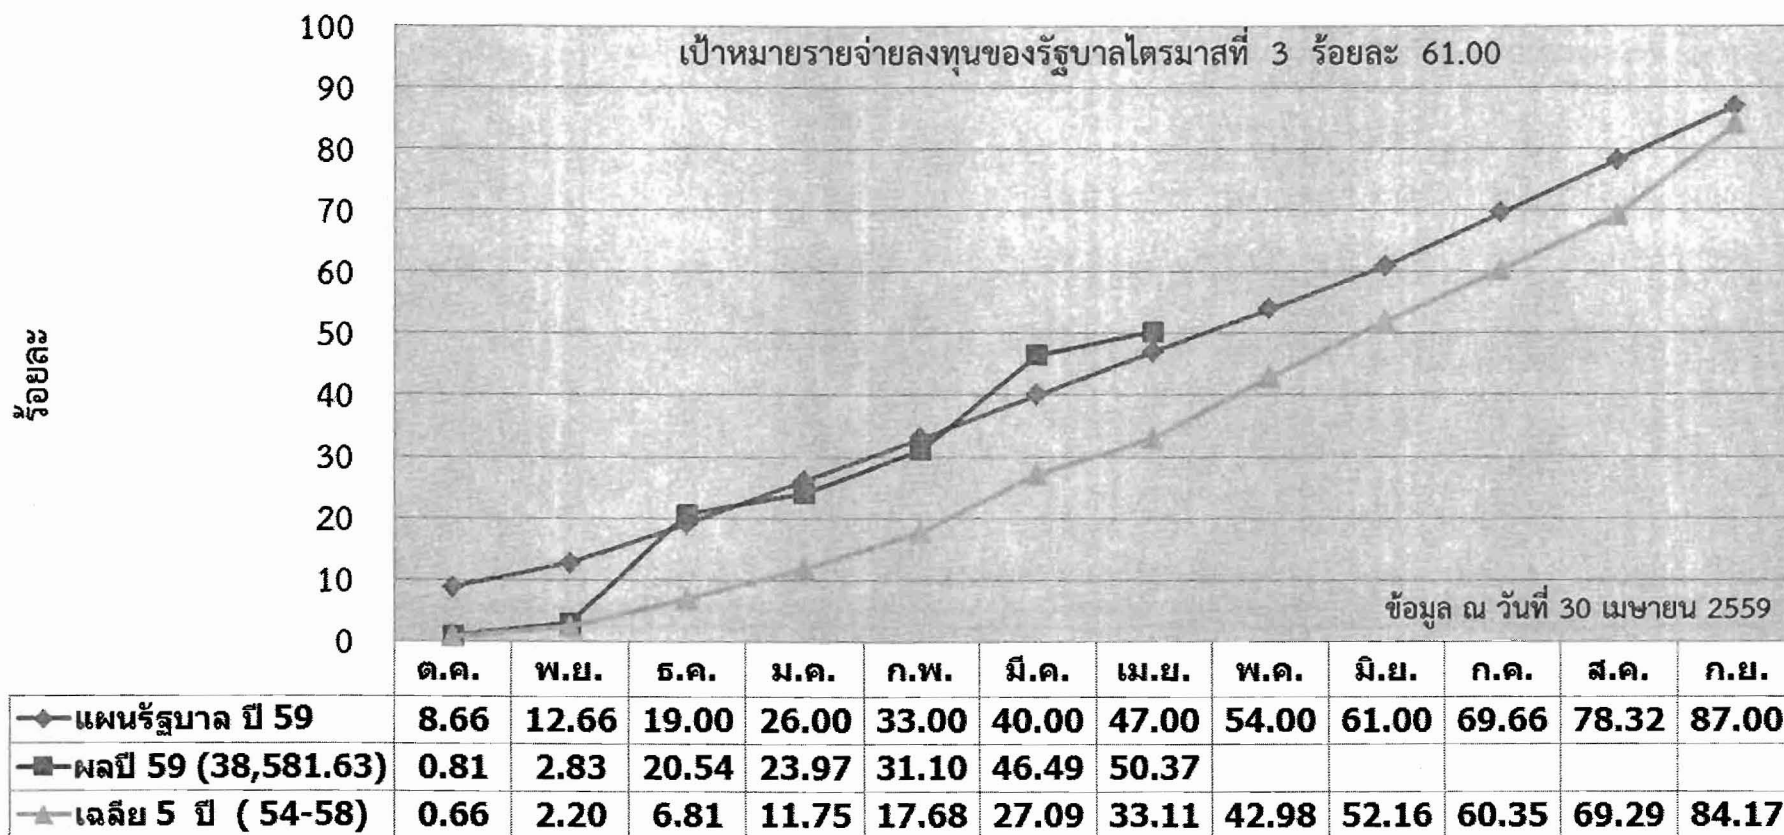


หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 19 % ไตรมาสที่ 2 = 40 % ไตรมาสที่ 3 = 61 % ไตรมาสที่ 4 = 87 %

1.6 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 59) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น.)

ร้อยละ

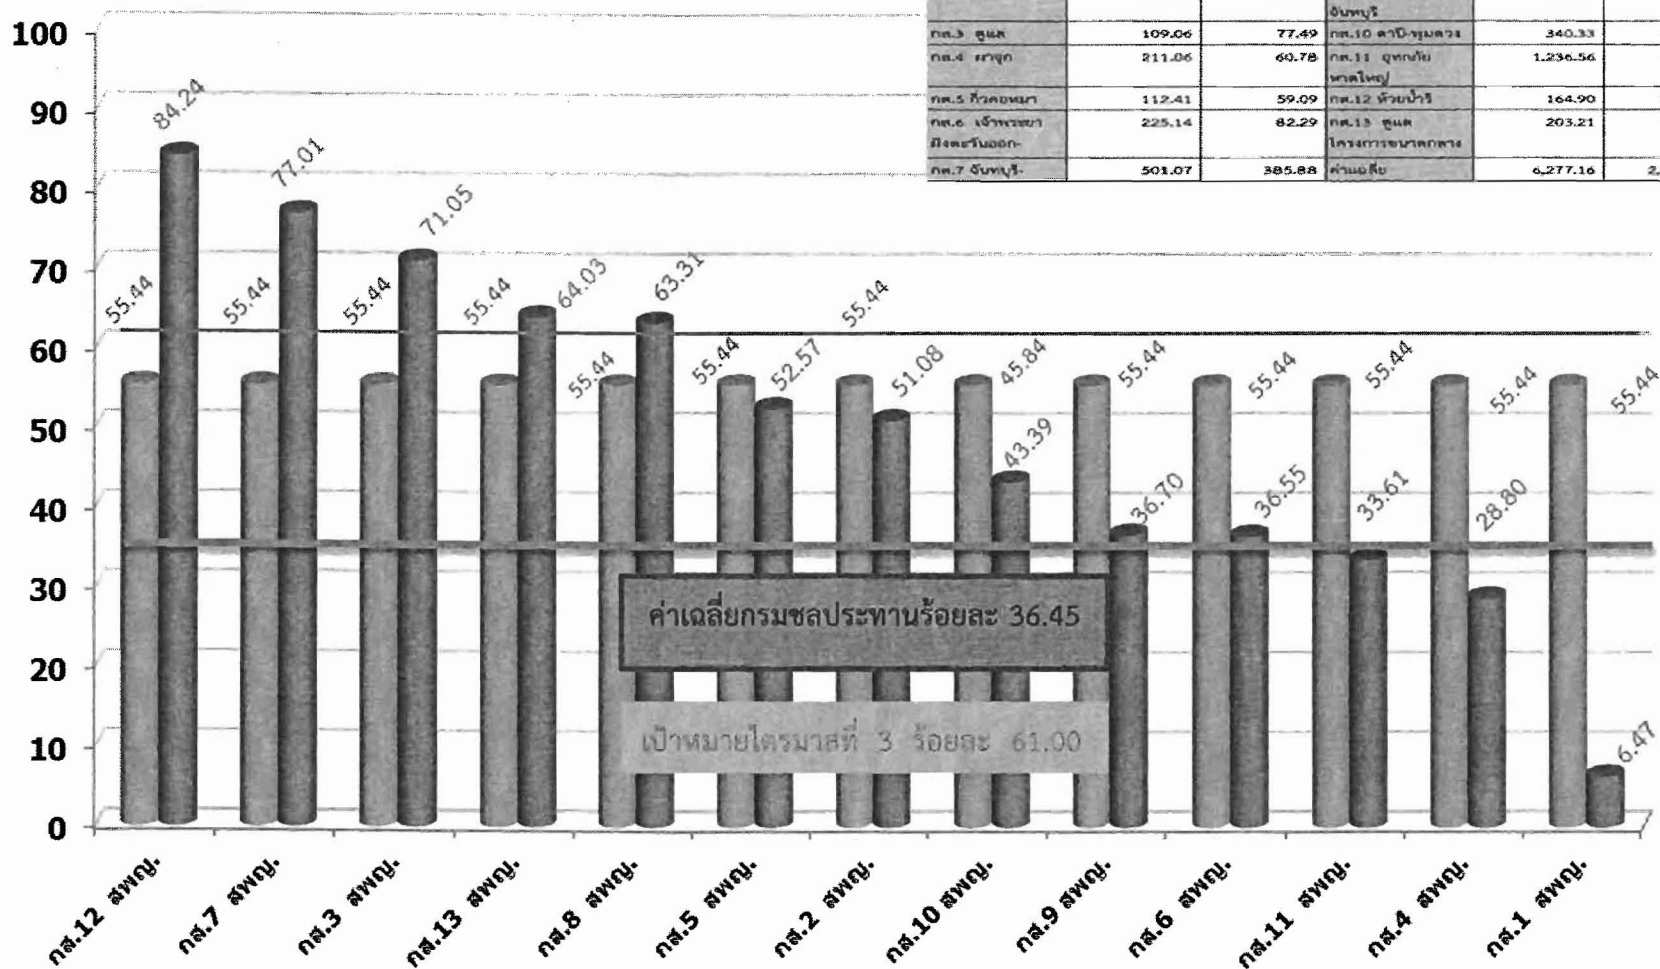

ค่าเฉลี่ยกรมชลประทานร้อยละ 36.45

เป้าหมายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 61.00

- แผนการเบิกจ่ายรายสำนัก เดือน เมษายน 2559
- ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

1.7 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(กรมที่เป็นคู่เทียบ ซึ่งมีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 10,000 ล้านบาท)

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559							
		งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย						
			ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	29 เม.ย.59
1	กรมชลประทาน	38,581.63	0.70 (0.40)	4.73 (2.11)	20.67 (14.74)	23.97 (20.50)	31.14 (30.75)	46.55 (49.13)	50.91
2	กรมทางหลวง ชนบท	44,615.54	1.22 (0.86)	2.49 (4.15)	8.19 (6.17)	13.48 (11.35)	25.69 (24.72)	41.74 (52.16)	50.08
3	กรมทางหลวง	71,951.41	1.19 (1.86)	2.69 (4.15)	6.82 (9.60)	10.54 (13.81)	16.67 (21.67)	28.92 (32.42)	39.13
4	กรมโยธาธิการ และผังเมือง	23,569.54	8.29 (4.40)	10.97 (5.79)	14.76 (10.33)	18.04 (14.68)	23.20 (17.85)	29.92 (24.93)	36.43

- หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 29 เม.ย. 2559 ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ
2. หน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท 36 หน่วยงาน เบิกจ่ายเฉลี่ย 39.84 %
3. ตัวเลขใน (-) เป็นร้อยละเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2558
