



พ.บอ 5607/59

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ผตบ.ผง. ๑๗๔๕ /๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

งพ. ๗๗๕๑

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อธช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เฟิ่งคำ)
ผตบ.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รชบ. รรช. รธว. รธร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

- ๑๗๔๖
- เสีฉน ผอ. ล้วช.
- เพื่อ อทราวม

(นายวิศักดิ์ ชนเดโชพล)
ผอ.ผง.

๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ. 11 ต.ก. 2559

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

ปี พ.ศ. 2559 กรมชลประทาน มีการใช้งบประมาณ จำนวน 6 แห่ง มีรายการงานทั้งสิ้น จำนวน 18,703 รายการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 138 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 525 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,478 รายการ แล้วเสร็จ 13,562 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.51 ได้รับความสรรงงบประมาณ จำนวน 90,302.12 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 69,471.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.93 โดยจำแนก ดังนี้

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)	<p>มีทั้งหมด 7,752 รายการ เป็นงบรายจ่ายลงทุน 37,382.12 ล้านบาท มีรายการผูกพันเดิม 79 รายการ งบประมาณ 5,477.97 ล้านบาท (ก่อนนี้แล้วทั้งหมด) โดยจำแนกสถานะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างเตรียมการ 138 รายการ (ร้อยละ 1.78) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 149 รายการ (ร้อยละ 1.92) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 520 รายการ (ร้อยละ 6.71) - แล้วเสร็จ 6,945 รายการ (ร้อยละ 89.59) <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายภาพรวม ได้รับความสรรงงบประมาณ จำนวน 46,110.23 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 41,819.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.69 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 5.31 (รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 96.00) - งบรายจ่ายลงทุน ได้รับความสรรงงบประมาณ จำนวน 37,382.12 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 33,415.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.39 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 2.39 (รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 87.00) <p>จะเห็นได้ว่า กรมมีส่วนงงบรายจ่ายลงทุนสูง คิดเป็นร้อยละ 81.07 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด รายละเอียดตามตารางที่ 1</p>

หมายเหตุ : รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ส่วนใหญ่เป็นรายการงานที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดำเนินการ

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2558	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/ โอน เปลี่ยนแปลง		
รวม	46,708.93	46,110.23	41,819.23	90.69	96.00	- 5.31
รายจ่ายประจำ	8,127.30	8,728.11	8,404.08	96.29	98.00	- 1.71
รายจ่ายลงทุน	38,581.63	37,382.12	33,415.14	89.39	87.00	+ 2.39

หมายเหตุ 1. ข้อมูลจากระบบ GMIS + มากกว่าเป้าหมาย - น้อยกว่าเป้าหมาย

2. ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายจ่ายลงทุน จำนวน 598.69 ล้านบาท


แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
2. งบกลาง	<p>ผลการดำเนินงาน มีทั้งหมด 9,440 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 356 รายการ (ร้อยละ 3.77) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 3,680 รายการ (ร้อยละ 38.98) - แล้วเสร็จ 5,404 รายการ (ร้อยละ 57.25) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 16,445.26 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,425.10 ล้านบาท (ร้อยละ 51.23)</p> <p>หมายเหตุ : ยกเลิก 1 รายการ</p>
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน	<p>ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 89 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 4 รายการ (ร้อยละ 4.49) - แล้วเสร็จ 85 รายการ (ร้อยละ 95.51) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 2,284.37 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,619.50 ล้านบาท (ร้อยละ 70.89)</p>
2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่นำร่อง (ระยะสั้น)	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 42 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แล้วเสร็จ 42 รายการ (ร้อยละ 100) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 40.65 ล้านบาท เบิกจ่าย 40.65 ล้านบาท (ร้อยละ 100)</p> <p>หมายเหตุ : ปิดโครงการ</p>
2.3 โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 5,054 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แล้วเสร็จ 5,054 รายการ (ร้อยละ 100) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 3,350.75 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,322.26 ล้านบาท (ร้อยละ 99.15)</p> <p>หมายเหตุ : ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ</p>
2.4 งบกลางคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2558	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 101 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ (ร้อยละ 4.95) - แล้วเสร็จ 96 รายการ (ร้อยละ 95.05) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 1,887.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,635.63 ล้านบาท (ร้อยละ 86.64)</p>
2.5 งบกลางคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2559	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 105 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 9 รายการ (ร้อยละ 8.57) - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 47 รายการ (ร้อยละ 44.76) - แล้วเสร็จ 49 รายการ (ร้อยละ 46.67) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 1,528.88 ล้านบาท เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท (ร้อยละ 61.11)</p>

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
<p>2.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน</p> <p>โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน</p>	<p>ดำเนินการโครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศระยะ เร่งด่วนจำนวน 28 รายการงบประมาณ 578.66 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 567.28 ล้านบาท (ร้อยละ 98.03) แล้วเสร็จ 28 รายการ (ร้อยละ 100) โดยแยกเป็น</p> <p>2.6.1 ดำเนินการโดยกองทัพบก (22 รายการ)</p> <p>- แล้วเสร็จ 22 รายการ (ร้อยละ 100)</p> <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 373.66 ล้านบาท เบิกจ่าย 362.78 ล้านบาท (ร้อยละ 97.09)</p> <p>2.6.2 ดำเนินการโดยกรมชลประทาน (6 รายการ)</p> <p>- แล้วเสร็จ 6 รายการ (ร้อยละ 100)</p> <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 205.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 204.50 ล้านบาท (ร้อยละ 99.76)</p> <p>หมายเหตุ : ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ</p>
<p>2.7 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหายั่งยืน และอุทกภัย</p>	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 1,049 รายการ</p> <p>- อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 347 รายการ (ร้อยละ 33.08)</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 653 รายการ (ร้อยละ 62.25)</p> <p>- แล้วเสร็จ 49 รายการ (ร้อยละ 4.67)</p> <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 5,765.53 ล้านบาท เบิกจ่าย 305.12 ล้านบาท (ร้อยละ 5.29)</p> <p>หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรจาก ส.ป. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 59 งบประมาณ 1,390.66 ล้านบาท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.59 งบประมาณ 1,353.48 ล้านบาท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.59 งบประมาณ 1,942.93 ล้านบาท และ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ก.ย.59 งบประมาณ 1,078.46 รวมได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 5,765.53 ล้านบาท เดิมมี 1,050 รายการ ยกเลิก 1 รายการ คงเหลือ 1,049 รายการ งบประมาณ 5,765.53 ล้านบาท</p>
<p>2.8 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ (กำจัดผักตบชวา)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 295 รายการ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ 294 รายการ (ร้อยละ 99.66)</p> <p>- แล้วเสร็จ 1 รายการ (ร้อยละ 0.34)</p> <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 60.91 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.06 ล้านบาท (ร้อยละ 0.09)</p> <p>หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรจาก ส.ป. เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 59 งบประมาณ 60.91 ล้านบาท</p>


แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
<p>2.9 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (งานซ่อมแซมโครงการ)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 2,677 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,677 รายการ (ร้อยละ 100) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 947.64 ล้านบาท</p> <p>ผลการเบิกจ่าย 0.26 ล้านบาท (ร้อยละ 0.03)</p> <p>หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรจาก สงป. เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 59 งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท</p>
<p>3. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (เงินกู้)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 723 รายการ งบประมาณ 23,856.38 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 13 รายการ (ร้อยละ 1.80) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 127 รายการ (ร้อยละ 17.57) - แล้วเสร็จ 583 รายการ (ร้อยละ 80.64) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 21,671.09 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 15,432.53 ล้านบาท (ร้อยละ 71.21)</p> <p>หมายเหตุ : แฉ่งคืนเงิน จำนวน 755.27 ล้านบาท (เงินเหลือจ่าย)</p>
<p>4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2558</p>	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 314 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 120 รายการ (ร้อยละ 38.22) - แล้วเสร็จ 194 รายการ (ร้อยละ 61.78) <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <p>ได้รับจัดสรรเงินกันเหลือปี 2554-2558 จำนวน 4,768.35 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,713.75 ล้านบาท (ร้อยละ 56.91)</p> <p>หมายเหตุ : เดิม 530 รายการ งบประมาณ 4,910.66 ล้านบาท เงินพับ/หมดความจำเป็น จำนวน 216 รายการ งบประมาณ 142.31 ล้านบาท คงเหลือ 314 รายการ งบประมาณ จำนวน 4,768.35 ล้านบาท</p>
<p>5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 416 รายการ (งบลงทุน : ครุภัณฑ์ และโครงการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ (ร้อยละ 1.68) - อยู่ระหว่างดำเนินการ 25 รายการ (ร้อยละ 6.01) - แล้วเสร็จ จำนวน 384 รายการ (ร้อยละ 92.31) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 560.00 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 371.58 ล้านบาท (ร้อยละ 66.35)</p>

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2559	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 58 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 6 รายการ (ร้อยละ 10.34) - แล้วเสร็จ จำนวน 52 รายการ (ร้อยละ 89.66) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 747.19 ล้านบาท เบิกจ่าย 709.05 ล้านบาท (ร้อยละ 94.90)</p>

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

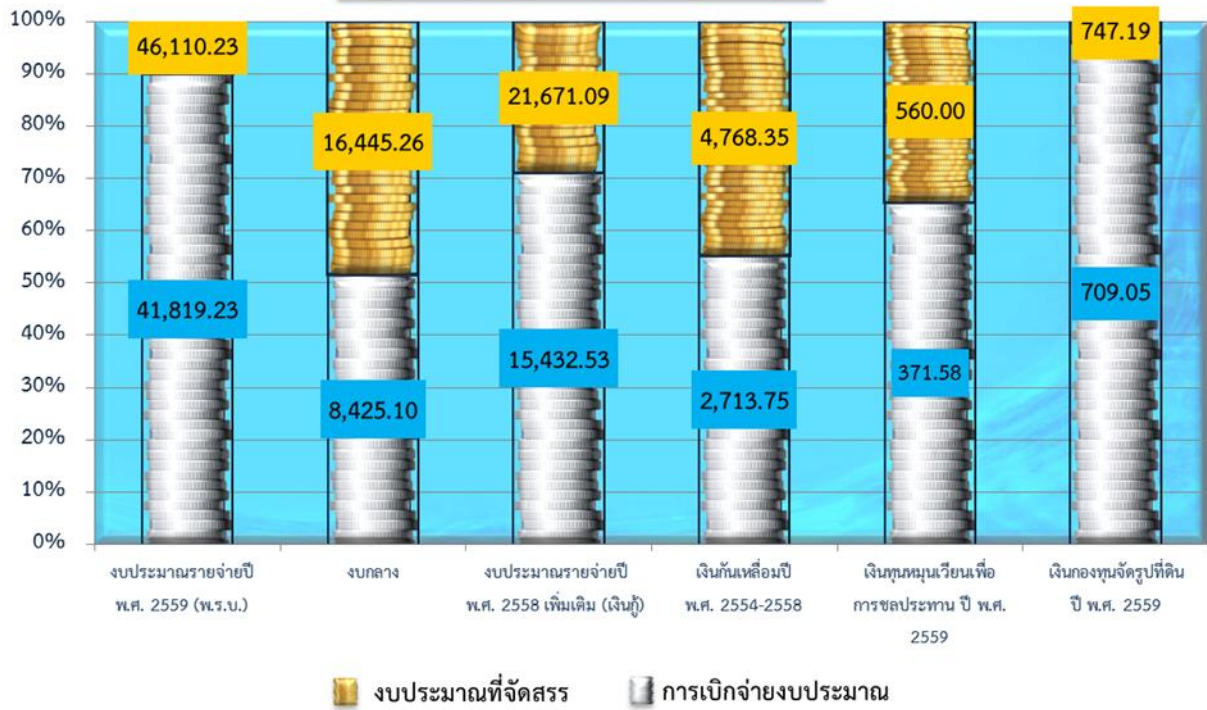

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

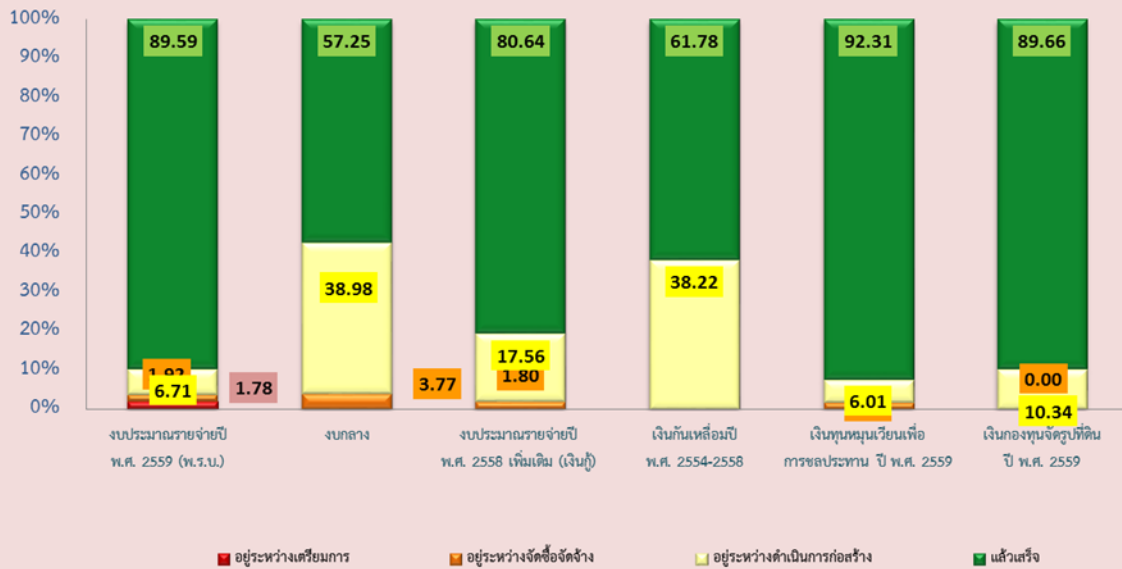

ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง					การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	จำนวนงบประมาณที่จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวม	18,703	138	525	4,478	13,562	90,302.12	69,471.25	76.93	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)	7,752	138	149	520	6,945	46,110.23	41,819.23	90.69	รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ส่วนใหญ่ เป็นรายการงานที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดำเนินการ
2. งบกลาง	9,440	-	356	3,680	5,404	16,445.26	8,425.10	51.23	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	89	-	-	4	85	2,284.37	1,619.50	70.89	
2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่น้ำร่อง (ระยะสั้น)	42	-	-	-	42	40.65	40.65	100.00	ปิดโครงการ
2.3 งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ	5,054	-	-	-	5,054	3,350.75	3,322.26	99.15	ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ
2.4 งบกลาง กปร.58	101	-	-	5	96	1,887.87	1,635.63	86.64	
2.5 งบกลาง กปร.59	105	-	9	47	49	1,528.88	934.35	61.11	
2.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน	28	-	-	-	28	578.66	567.28	98.03	ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ
2.7 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหากล้งและอุทกภัย	1,049	-	347	653	49	5,765.53	305.12	5.29	ปัจจุบันได้รับจัดสรรจาก สงป. 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 59 งบประมาณ 1,390.66 ล้านบาท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.59 งบประมาณ 1,353.48 ล้านบาท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.59 งบประมาณ 1,942.93 ล้านบาท และ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ก.ย.59 งบประมาณ 1,078.4603 ล้านบาท รวมได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 5,765.5289 ล้านบาท
2.8 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ (กำจัดฝักตบขวา)	295			294	1	60.91	0.06	0.09	ได้รับจัดสรรจาก สงป. เมื่อวันที่ 15 ก.ย.59 งบประมาณ 60.91 ล้านบาท
2.9 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (งานซ่อมแซมโครงการ)	2,677			2,677		947.64	0.26	0.03	ได้รับจัดสรรจาก สงป. เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 59 งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท
3. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (เงินกู้)	723	-	13	127	583	21,671.09	15,432.53	71.21	ยอดจัดสรร 22,426.36 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้จ่ายจริง 21,671.09 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 583 รายการ มีเงินเหลือจ่าย 755.27 ล้านบาท
4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2558	314	-	-	120	194	4,768.35	2,713.75	56.91	เดิม 530 รายการ งบประมาณ 4,910.66 ล้านบาท เงินทับ/หมดความจำเป็น จำนวน 216 รายการ งบประมาณ 142.31 ล้านบาท คงเหลือ 314 รายการงบประมาณ จำนวน 4,768.35 ล้านบาท
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานปี พ.ศ.	416		7	25	384	560.00	371.58	66.35	
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2559	58	-	-	6	52	747.19	709.05	94.90	
