



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖
ที่ ผตป.ผง. ๑๖๐๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

๖๐.๙๙๐๖

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทศักดิ์ ชนเดโชพล)

ผอ.ผง.

๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙

- ทงน
- เจียน ๓๐.๓๐๓

ที่อทกม.

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทุกแหล่งงบประมาณ)


กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 6 แหล่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 62,918.81 ล้านบาท ปริมาณงาน 12,222 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการ 647 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.30 จัดซื้อจัดจ้าง 1,974 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.15 ดำเนินการก่อสร้าง 7,853 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.25 และแล้วเสร็จ 1,748 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.30 สรุป ดังนี้

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งหมด	12,222	647	1,974	7,853	1,748	62,918.81	10,575.95	16.81	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)	6,647	350	1,638	4,659	-	39,044.64	3,126.80	8.01	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน
1.1 งบประมาณต่ำกว่า 2 ล้านบาท	4,705	166	1,063	3,476	-	3,399.99	771.88	22.70	
1.2 งบประมาณตั้งแต่ 2 - 1,000 ล้านบาท	1,928	184	572	1,172	-	32,991.24	2,192.36	6.65	
1.3 งบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาท	14	-	3	11	-	2,653.41	162.57	6.13	
2. งบกลาง	4,041	-	45	2,415	1,581	10,321.68	3,833.36	37.14	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	4	1	583.00	40.39	6.93	ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้วเสร็จ 84 รายการ เบิกจ่าย 1,619.50 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 583.00 ล้านบาท
2.2 งบกลาง กปร.58	10	-	-	4	6	252.91	160.16	63.33	ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.87 ล้านบาท แล้วเสร็จ 91 รายการ เบิกจ่าย 147.01 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.59	66	-	1	50	15	1,312.05	799.63	60.95	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้วเสร็จ 39 รายการ เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05 ล้านบาท
2.4 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหายั่งยืน และอุทกภัย	999	-	44	714	241	5,736.18	1,241.04	21.60	ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 2 รายการ งบประมาณ 8.10 ล้านบาท คงเหลือ 1,048 รายการ งบประมาณ 5,757.43 ล้านบาท แล้วเสร็จ 49 รายการ ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 999 รายการ งบประมาณ 5,736.18 ล้านบาท
2.5 งบกลาง โครงการตามมาตรการกระตุ้น การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี 2559	2,674	-	-	1,483	1,191	2,378.61	1,551.84	65.24	ปริมาณงาน 2,677 รายการ งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท ยกเลิก 3 รายการ งบประมาณ 4.97 ล้านบาท คงเหลือ 2,674 รายการ งบประมาณ 2,378.61 ล้านบาท
2.6 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ(ฝักคบขวา)	287	-	-	160	127	58.93	40.30	68.39	ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท ยกเลิก 8 รายการ งบประมาณ 1.98 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ ดำเนินการซ้ำซ้อนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 287 รายการ งบประมาณ 58.93 ล้านบาท
3. เงินกู้	145	-	12	133	-	7,924.23	2,523.30	31.84	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	114	-	6	108	-	6,717.83	2,486.40	37.01	ปริมาณงาน 723 รายการ ยอดจัดสรร 22,426.36 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้จริง 21,671.09 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 609 รายการ คงเหลือ 114 รายการ งบประมาณ 6,717.83 ล้านบาท
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	31	-	6	25	-	1,206.40	36.90	3.06	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอนจัดสรรแล้ว 31 รายการ งบประมาณ 1,206.40 ล้านบาท มีการแก้ไขข้อ และอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณโอนจัดสรร จำนวน 4 รายการ
4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559	478	-	-	389	89	4,810.14	1,046.80	21.76	ปริมาณงาน 590 รายการ งบประมาณ 4,895.62 ล้านบาท เงินทับ/หมดความจำเป็น จำนวน 112 รายการ งบประมาณ 85.48 ล้านบาท รดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 478 รายการ งบประมาณ 4,810.14 ล้านบาท
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560	853	297	273	205	78	86.32	1.95	2.25	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 0.08 ล้านบาท เนื่องจากรายการซ้ำ
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	58	-	6	52	-	731.81	43.74	5.98	

สรุปการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

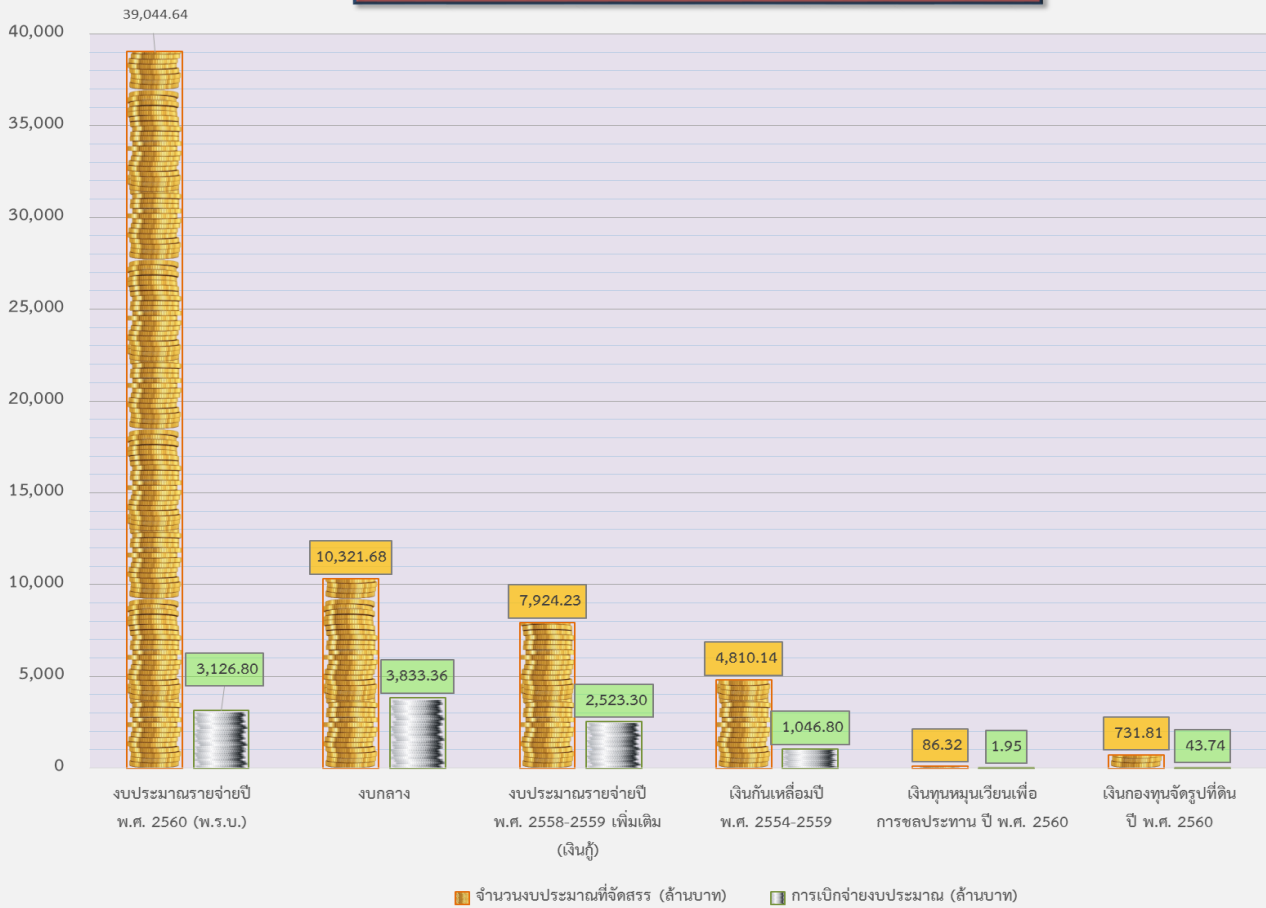

สรุปความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

