



บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖
ที่ ผตบ.ผง. ๒๓ /๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปรายงานก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

ร.๗.๒๗๗

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปรายงานก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อ
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เฟื่องคำ)
ผตบ.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิศักดิ์ ชนเดโชพล)
ผอ.ผง.

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๐

- ททท

- เรือน ผอ.สอ

เพื่อททท.

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทุกแหล่งงบประมาณ)


กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 6 แหล่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 63,303.05 ล้านบาท ปริมาณงาน 12,184 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการ 388 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.18 จัดซื้อจัดจ้าง 966 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.93 ดำเนินการก่อสร้าง 7,325 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.12 และแล้วเสร็จ 3,505 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.77 สรุป ดังนี้

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งหมด	12,184	388	966	7,325	3,505	63,303.26	16,694.05	26.37	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)	6,593	195	717	5,681	-	39,044.64	7,392.71	18.93	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุนตาม พ.ร.บ. (ยังไม่โอนเปลี่ยนแปลง)
1.1 งบประมาณต่ำกว่า 2 ล้านบาท	4,663	89	412	4,162	-	3,399.99	1,905.84	56.05	
1.2 งบประมาณตั้งแต่ 2 - 1,000 ล้านบาท	1,916	106	302	1,508	-	32,991.24	5,157.51	15.63	
1.3 งบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาท	14	-	3	11	-	2,653.41	329.36	12.41	
2. งบกลาง	4,041	-	21	895	3,125	10,321.68	5,029.94	48.73	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	3	2	583.00	41.51	7.12	ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้วเสร็จ 84 รายการ เบิกจ่าย 1,619.50 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 583.00 ล้านบาท
2.2 งบกลาง กปร.58	10	-	-	4	6	252.91	175.76	69.50	ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.87 ล้านบาท แล้วเสร็จ 91 รายการ เบิกจ่าย 147.01 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.59	66	-	1	44	21	1,312.05	872.29	66.48	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้วเสร็จ 39 รายการ เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05 ล้านบาท
2.4 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหายั่งยืน และอุทกภัย	999	-	20	462	517	5,736.18	1,766.90	30.80	ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 2 รายการ งบประมาณ 8.10 ล้านบาท คงเหลือ 1,048 รายการ งบประมาณ 5,757.43 ล้านบาท แล้วเสร็จ 49 รายการ ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 999 รายการ งบประมาณ 5,736.18 ล้านบาท
2.5 งบกลาง โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี 2559	2,674	-	-	293	2,381	2,378.61	2,127.14	89.43	ปริมาณงาน 2,677 รายการ งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท ยกเลิก 3 รายการ งบประมาณ 4.97 ล้านบาท คงเหลือ 2,674 รายการ งบประมาณ 2,378.61 ล้านบาท
2.6 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ(ฝักคบขวา)	287	-	-	89	198	58.93	46.34	78.64	ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท ยกเลิก 8 รายการ งบประมาณ 1.98 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 287 รายการ งบประมาณ 58.93 ล้านบาท
3. เงินกู้	145	-	8	137	-	7,924.23	2,801.49	35.35	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	114	-	6	108	-	6,717.83	2,703.57	40.24	ปริมาณงาน 723 รายการ ยอดจัดสรร 22,426.36 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้จริง 21,671.09 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 609 รายการ คงเหลือ 114 รายการ งบประมาณ 6,717.83 ล้านบาท
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	31	-	2	29	-	1,206.40	97.92	8.12	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอนจัดสรรแล้ว 31 รายการ งบประมาณ 1,206.40 ล้านบาท มีการแก้ไขชื่อ และอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณโอนจัดสรร จำนวน 4 รายการ
4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559	494	-	-	361	133	5,176.14	1,314.36	25.39	ปริมาณงาน 606 รายการ งบประมาณ 5,261.61 ล้านบาท เงินพับ/หมดความจำเป็น จำนวน 112 รายการ งบประมาณ 85.48 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 361 รายการ งบประมาณ 3,861.78 ล้านบาท
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560	853	193	219	194	247	103.25	15.72	15.23	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 0.08 ล้านบาท เนื่องจากรายการซ้ำ
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	58	-	1	57	-	733.33	139.83	19.07	

สรุปการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

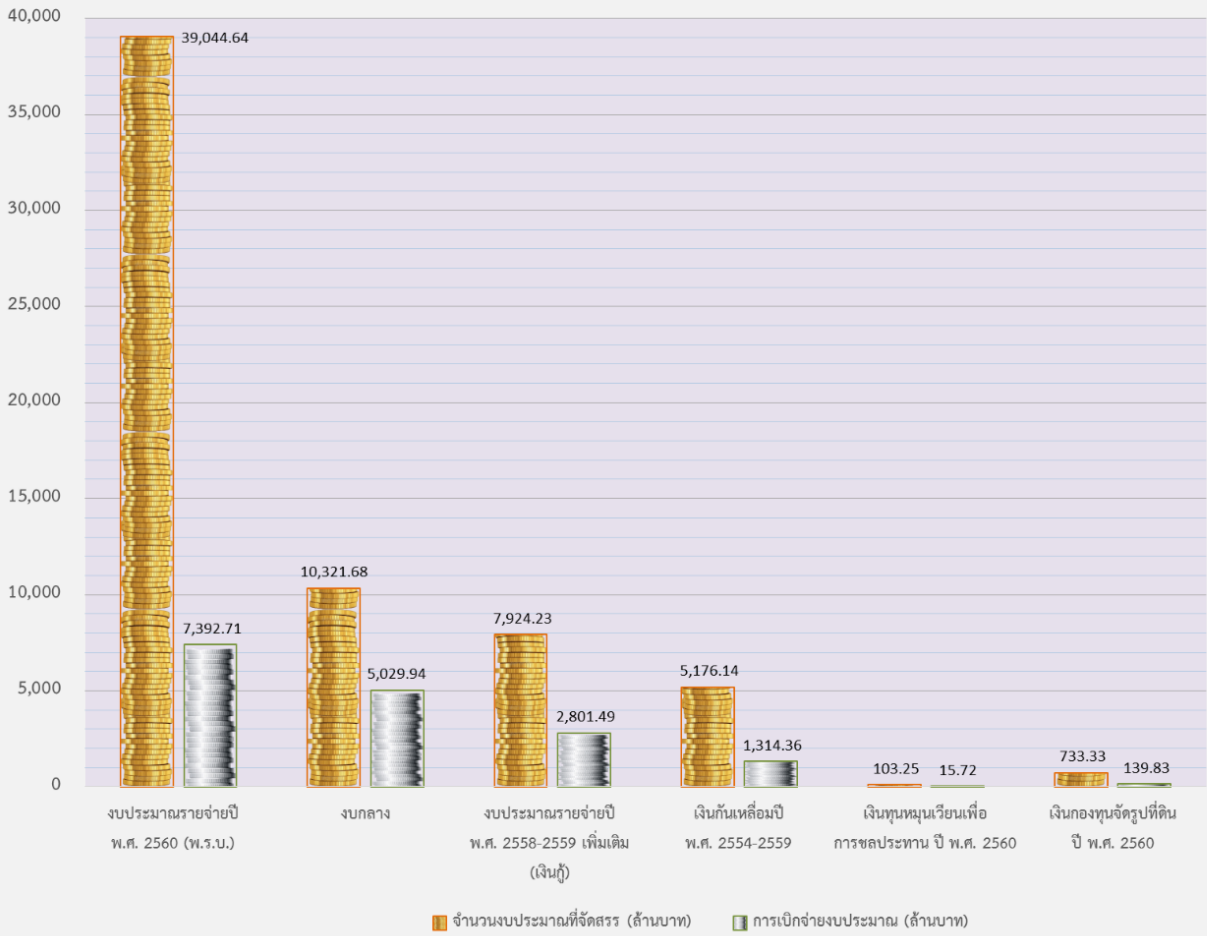

สรุปความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

