



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ผตบ.ผง. ๑๐๕๒/๒๕๖๐ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.)

ร.บ. ๕๓๘๘

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำแนกตามสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบ

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศิริธร)

ตป.๑. ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตบ.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

- ๗ ส.ค. ๒๕๖๐

- ทราบ

เรียน ผอ.ส่วน ผอช.ภาค ทน.๑-๙ บอ. และ ผบท.บอ. (ด.ม.บ., พ.ด.บ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลิศชัย ศรีอ่อน)

ผส.บอ. - 8 ส.ค. 2560

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปังบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สขป.1-17 และส่วนกลาง

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.52 น.)

สำนัก/กอง	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย				ทำข้อผูกพัน (รายการ)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	40,215.18	34,695.09	25,649.37	73.93	6,707	61	127	6,519	154	93	181	414	1,183	4,494
สขป. 1	1,128.28	1,061.18	919.31	86.63	355	2	16	337	1	0	7	25	88	216
สขป. 2	1,063.84	963.78	817.40	84.81	299	0	5	294	3	2	8	15	50	216
สขป. 3	922.41	644.49	515.48	79.98	294	6	3	285	2	1	6	14	54	208
สขป. 4	1,161.98	931.83	757.83	81.33	272	0	0	272	6	4	4	14	39	205
สขป. 5	1,426.11	1,214.80	1,016.52	83.68	409	1	3	405	7	3	5	31	55	304
สขป. 6	1,558.77	1,405.37	1,041.55	74.11	358	0	1	357	6	6	8	26	63	248
สขป. 7	1,502.55	1,344.29	1,190.92	88.59	271	0	0	271	0	0	4	15	32	220
สขป. 8	1,545.69	1,333.52	1,021.18	76.58	402	0	3	399	1	5	8	30	52	303
สขป. 9	1,740.94	1,463.19	1,050.48	71.79	500	0	3	497	4	3	7	29	90	364
สขป. 10	992.97	892.34	751.09	84.17	458	0	1	457	10	6	6	15	40	380
สขป. 11	1,204.55	1,131.08	809.78	71.59	456	0	4	452	4	11	17	15	100	305
สขป. 12	1,953.16	1,804.79	1,443.72	79.99	473	0	0	473	2	6	13	21	56	375
สขป. 13	1,071.52	935.04	733.28	78.42	489	1	3	485	8	3	12	35	139	288
สขป. 14	1,128.75	996.66	704.63	70.70	185	5	2	178	4	1	1	12	35	125
สขป. 15	1,138.46	987.05	703.14	71.24	289	2	23	264	4	3	6	13	48	190
สขป. 16	1,223.32	1,155.98	925.57	80.07	295	0	0	295	0	3	2	13	30	247
สขป. 17	921.45	793.60	667.93	84.16	227	6	7	214	4	1	5	7	33	164
สบก.	420.07	282.24	108.98	38.61	22	0	3	19	5	2	2	6	0	4
สบอ.	266.92	182.10	126.04	69.21	114	2	14	98	27	3	2	5	44	17
กพก.	8,998.98	8,401.38	6,098.94	72.59	191	1	7	183	19	11	21	42	64	26
สพญ.	7,052.28	5,557.43	3,145.50	56.60	169	0	21	148	34	18	29	18	27	22
สสธ.	330.23	241.69	215.76	89.27	36	0	8	28	0	0	1	2	23	2
สอส.	51.84	49.86	20.09	40.30	3	0	0	3	0	0	2	1	0	0
ศทส.	1.00	-	-	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
สมด.	715.42	694.59	647.93	93.28	40	11	0	29	1	0	2	4	11	11
สดก.	206.82	203.63	193.16	94.85	43	0	0	43	1	1	2	6	9	24
สจด.	427.31	23.19	23.19	99.99	54	24	0	30	0	0	0	0	0	30
สลก.	59.57	-	-	0	2	0	0	2	0	0	1	0	1	0

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามผลผลิต

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.52 น.)

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย				ทำข้อผูกพัน (รายการ)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	40,215.18	34,695.09	25,649.37	73.93	6,707	61	127	6,519	154	93	181	414	1,183	4,494
ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	7,018.05	6,192.00	5,556.46	89.74	5,221	20	76	5,125	65	37	66	207	701	4,049
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	5,738.14	5,083.09	3,903.31	76.79	435	0	2	433	11	11	21	53	151	186
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	15,483.21	13,826.69	10,328.61	74.70	541	38	14	489	27	18	41	100	177	126
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	539.13	416.62	311.43	74.75	171	0	2	169	2	1	4	2	76	84
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,287.66	5,424.42	3,576.83	65.94	217	3	20	194	25	10	28	38	58	35
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	132.72	83.66	72.59	86.77	9	0	3	6	0	0	1	0	5	0
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัด	394.25	320.14	242.37	75.71	16	0	3	13	4	2	5	0	1	1
โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	306.81	231.84	38.53	16.62	11	0	0	11	5	1	4	0	0	1
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	672.69	-	-	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรดิต์	506.08	290.20	97.81	33.71	19	0	0	19	3	4	1	5	1	5
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	728.63	713.66	360.00	50.44	9	0	0	9	2	2	2	2	0	1
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	1,014.16	651.60	431.65	66.24	17	0	1	16	1	0	2	3	6	4
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	88.87	87.98	19.90	22.62	6	0	1	5	2	1	0	0	2	0
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	314.25	297.73	198.92	66.81	10	0	1	9	1	2	2	1	3	0
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอลาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	420.95	508.12	375.26	73.85	13	0	2	11	2	3	4	2	0	0
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิต์	569.57	567.35	135.71	23.92	10	0	0	10	4	1	0	1	2	2

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.52 น.)


หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560	งบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่ายสะสม						เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ร้อยละ)
		31 กรกฎาคม 2560		7 สิงหาคม 2560		เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน			
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
รวมทั้งสิ้น	52,040.89	34,279.27	65.87	35,461.14	68.14	1,181.87	2.27	-	-
รวม งบ พ.ร.บ.60	46,212.90	33,194.03	71.83	34,224.85	74.06	1,030.82	2.23	96	-21.94
รายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.60)	8,294.04	6,835.79	82.42	6,894.71	83.13	58.92	0.71	98	-14.87
รายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.60)	37,918.86	26,358.24	69.51	27,330.14	72.08	971.90	2.56	87	-14.92
รายจ่ายลงทุน (งบปี60 เพิ่มเติม)	5,827.99	1085.24	18.62	1,236.29	21.21	151.05	2.59	-	-

หมายเหตุ : ผลต่างร้อยละมีค่า - แสดงว่ารายการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล
ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายจ่ายลงทุน จำนวน 288,846,300 บาท

4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560


ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560

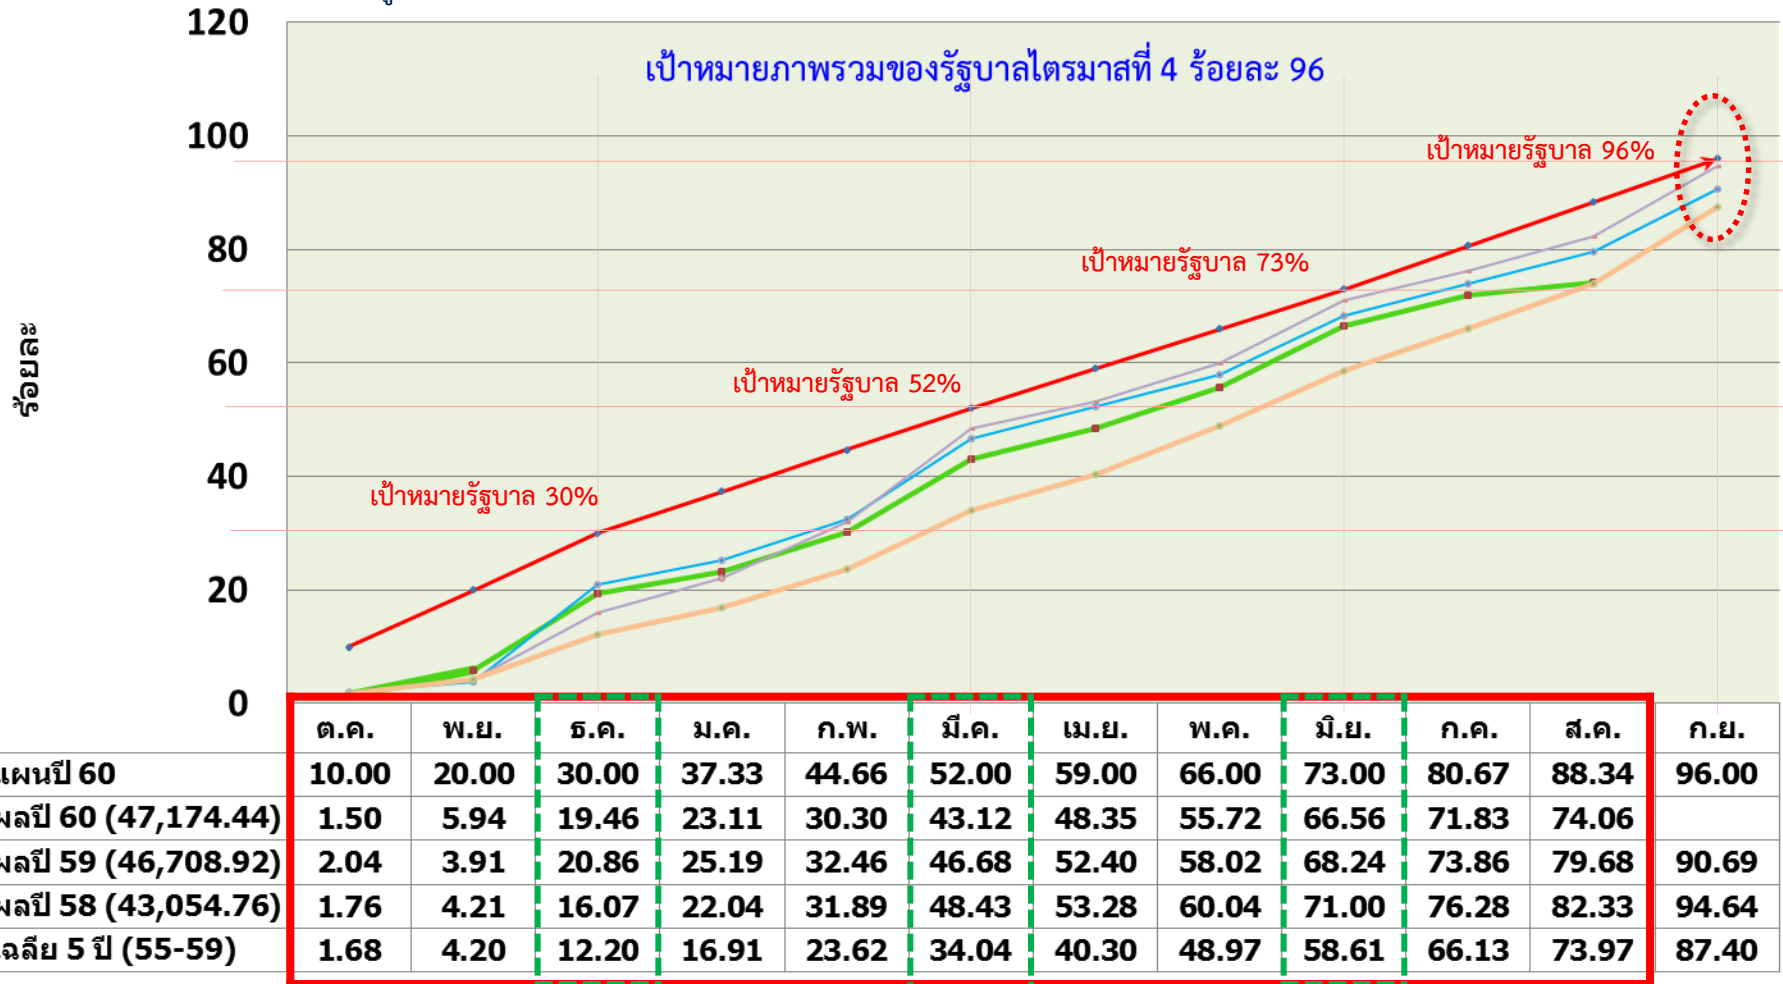

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30 % ไตรมาสที่ 2 = 52 % ไตรมาสที่ 3 = 73 % ไตรมาสที่ 4 = 96

5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560


ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

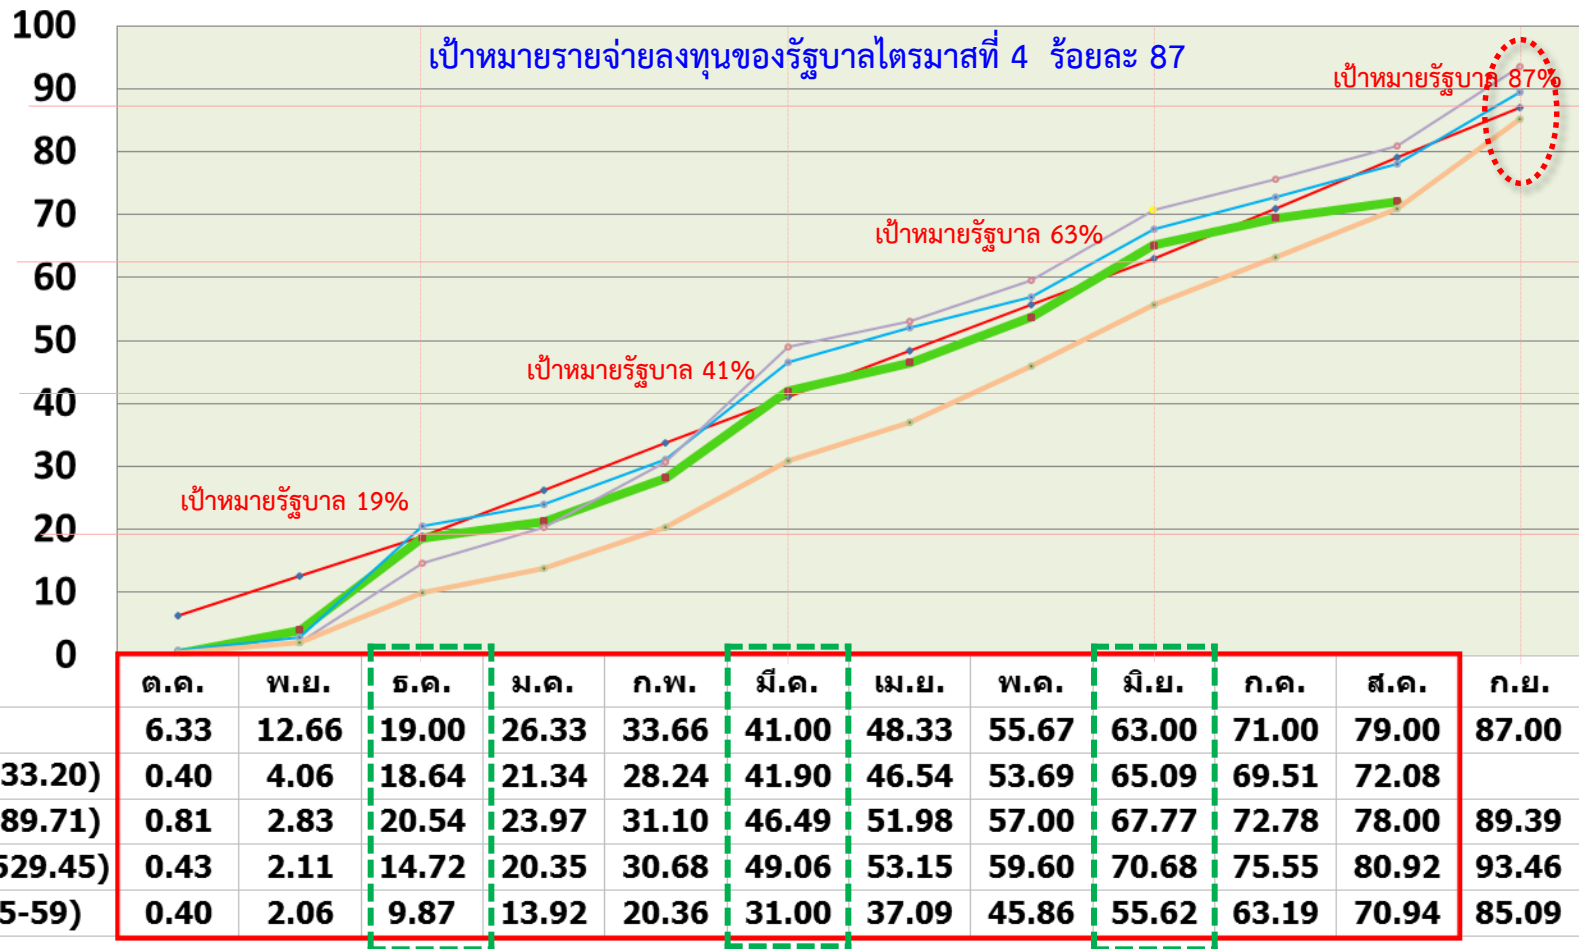

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 19 % ไตรมาสที่ 2 = 41 % ไตรมาสที่ 3 = 63 % ไตรมาสที่ 4 = 87 %

6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.60) ของ สชป. 1-17

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.13 น.)

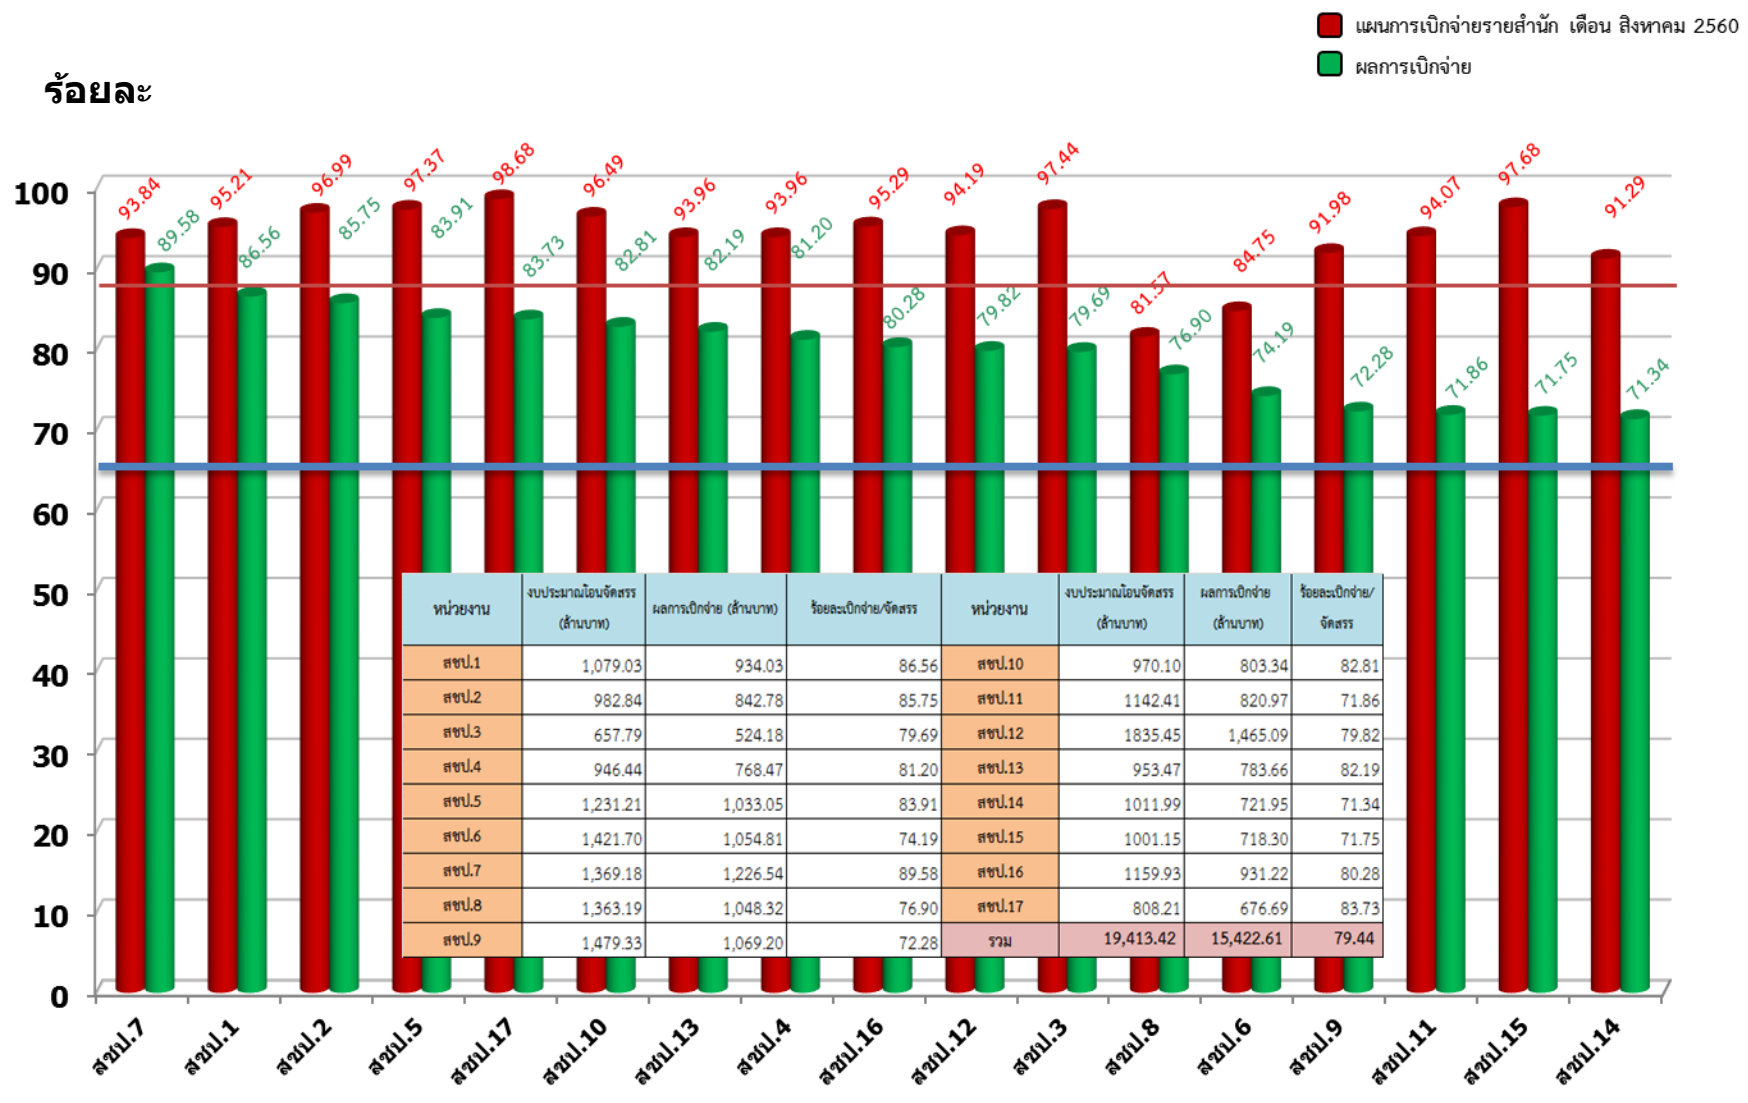


ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 72.08

เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 ร้อยละ 87


7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 60) ของ ส่วนกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.13 น.)

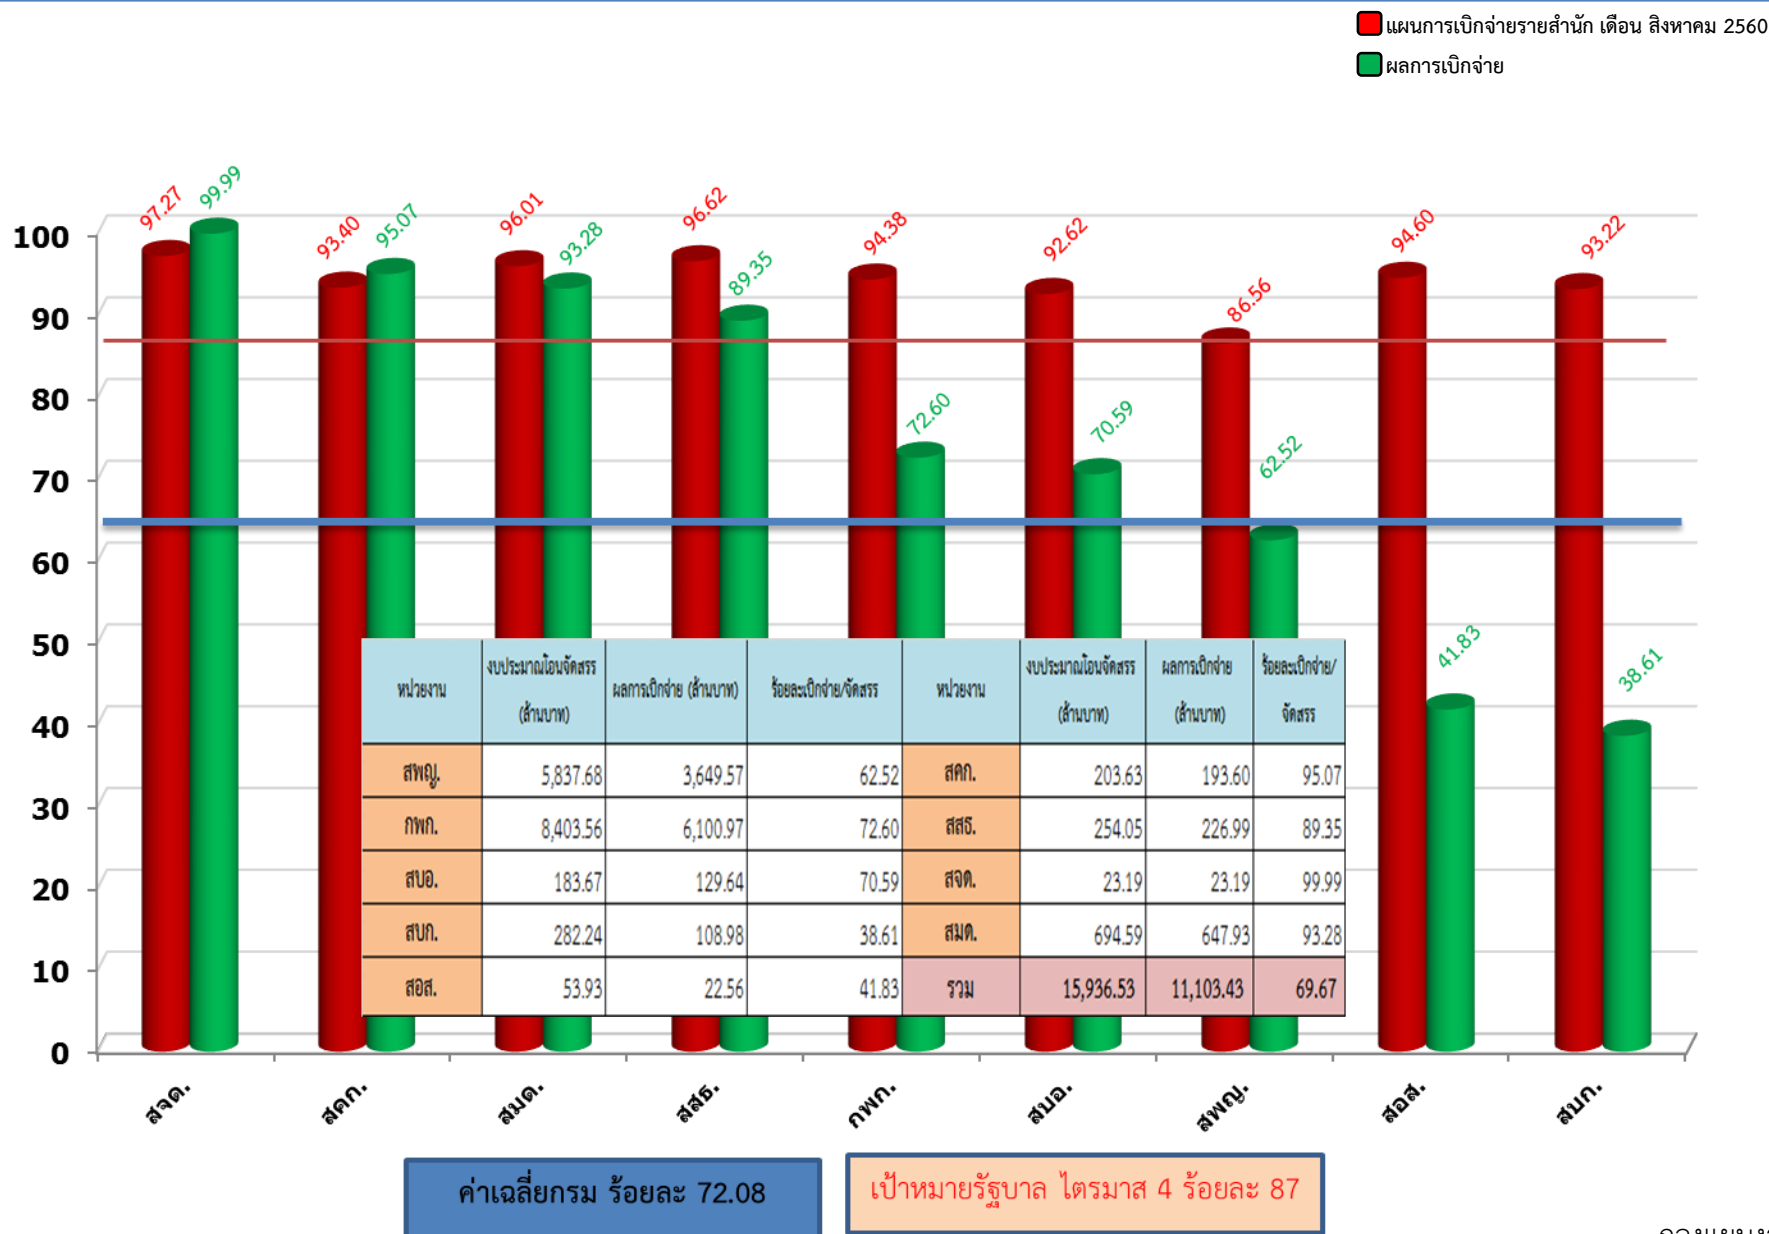

8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 60) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.13 น.)

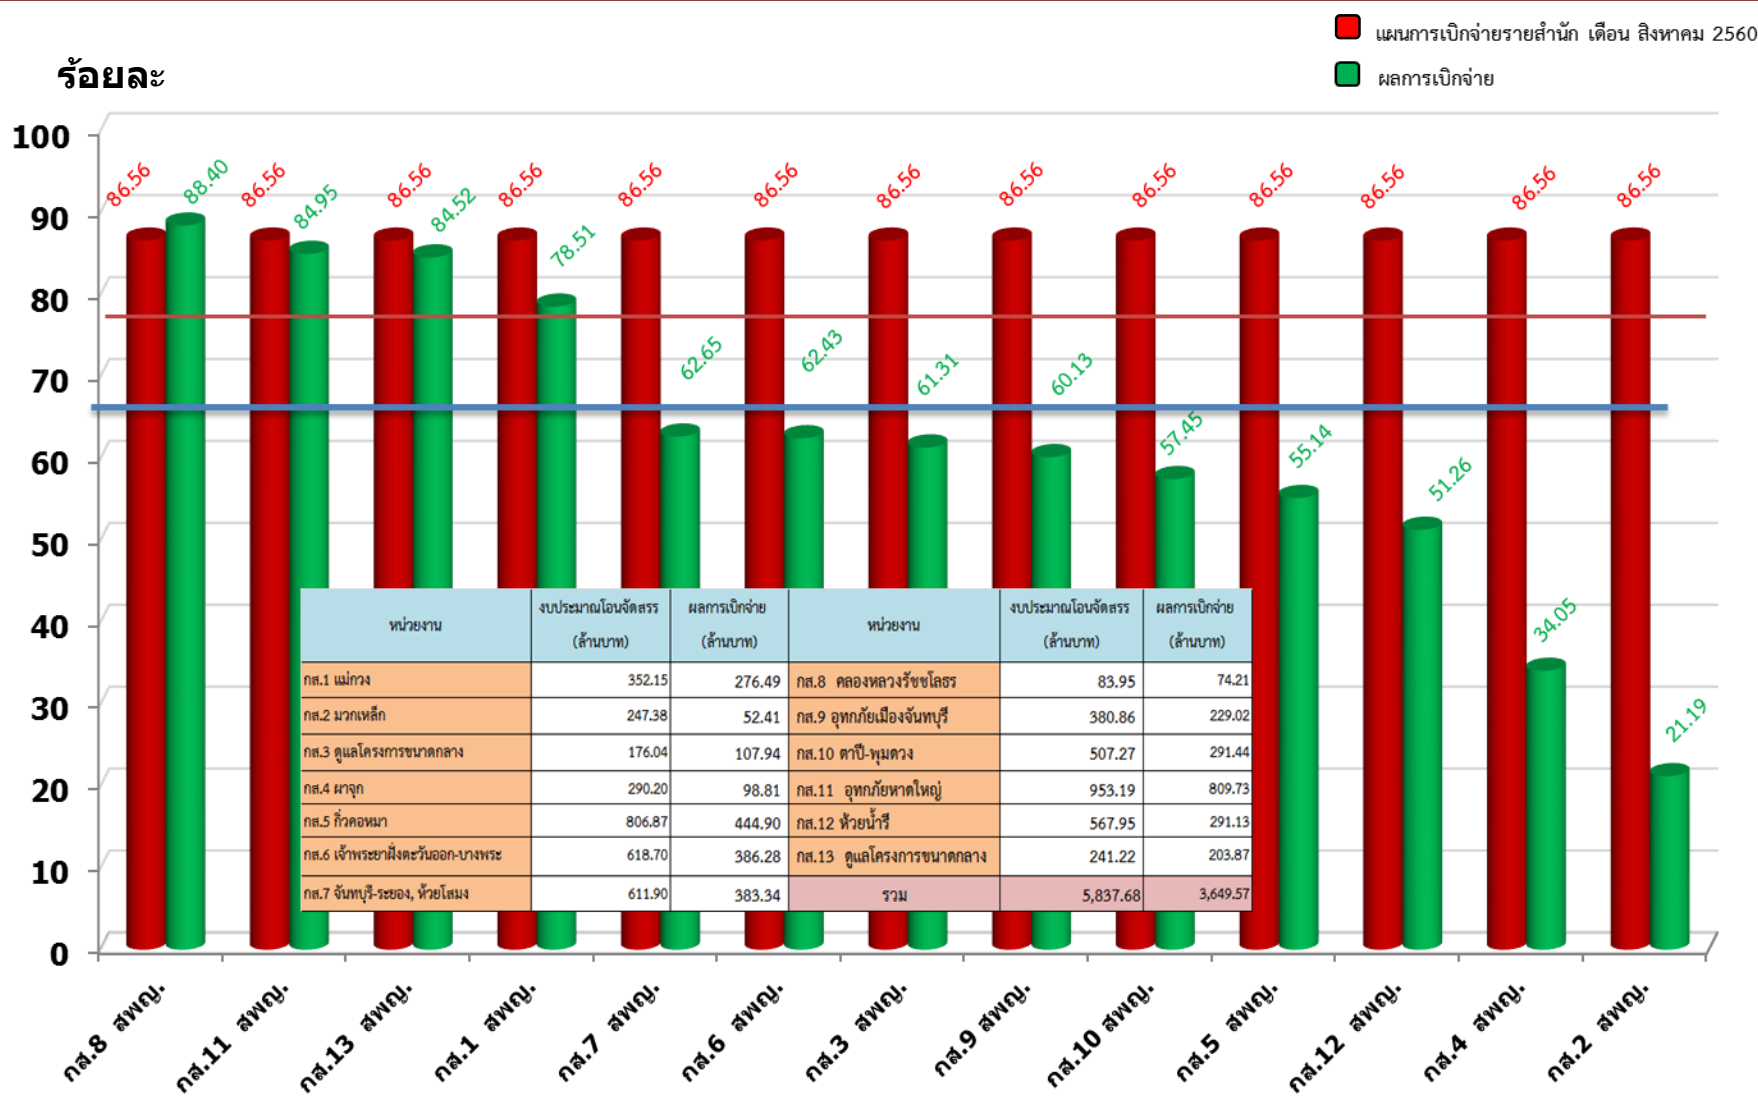

ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 72.08 เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 ร้อยละ 87

9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 60) กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.13 น.)



ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 72.08 เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 ร้อยละ 87

10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
	ระดับกระทรวง (ที่มีงบเกิน 10,000 ล้านบาท)			
1	กระทรวงศึกษาธิการ	43,768.42	34,152.65	78.03
2	กระทรวงคมนาคม (งบรายจ่ายลงทุนสูงสุด)	137,648.08	104,230.46	75.72
3	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (งบรายจ่ายลงทุนลำดับที่ 4)	45,963.60	31,718.15	70.03
4	กระทรวงสาธารณสุข	19,602.31	10,942.45	55.82
5	กระทรวงกลาโหม	49,449.33	26,647.41	53.89
6	กระทรวงมหาดไทย	49,083.13	25,486.96	52.29
7	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,995.60	6,182.53	47.57
	ระดับกรม (คู่เทียบ)			
1	กรมพัฒนาที่ดิน (มีงบรายจ่ายลงทุนอันดับ2 ของ กษ.)	3,181.24	2,662.00	83.68
2	กรมทางหลวงชนบท	44,231.62	34,403.25	77.78
3	กรมทางหลวง	85,393.76	66,032.40	77.33
4	กรมชลประทาน (มีงบรายจ่ายลงทุนอันดับ1 ของ กษ.)	37,918.86	26,412.30	69.65
5	กรมโยธาธิการและผังเมือง	23,206.83	13,311.63	57.36

- หมายเหตุ :
- ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
 - ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 65.78 %
 - ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (42 หน่วยงาน) เฉลี่ย 65.13 %
