



# คำวนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖  
ที่ ผตป.ผง. ๑๑๖๓ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง สรุปรายงานก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

๕๐. ๐๗๕๕

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปรายงานก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อธช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)  
ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง  
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทิต โอชวิช)  
ผวง.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

๕๐๐๐๐ ผอ.ธชช. ผอ.ธชช. ผอ.ธชช.  
เพื่อโปรดทราบ

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)  
ผส.บอ. 23 ส.ค. 2560

## สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

### กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 7 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 94,637.94 ล้านบาท ปริมาณงาน 14,268 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

**1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)** ปริมาณงาน 6,736 รายการ งบประมาณ 37,918.86 ล้านบาท เบิกจ่าย 27,880.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.53

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 80 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.19 ( ส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง )
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 129 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.92
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,858 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.58
- แล้วเสร็จ 4,669 รายการ คิดเป็นร้อยละ 69.31

**2. งบกลาง** ปริมาณงาน 4,646 รายการ งบประมาณ 12,275.74 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,896.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.47

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 22 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.47
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 145 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.12
- แล้วเสร็จ 4,479 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.41

**3. เงินกู้** โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม 2558-2559) ปริมาณงาน 757 รายการ งบประมาณ 22,744.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 18,383.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.83

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 117 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.46
- แล้วเสร็จ 639 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84.41

**4. เงินกู้ยืมเพื่อปี พ.ศ. 2554-2559** ปริมาณงาน 545 รายการ งบประมาณ 6,016.39 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,656.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.78

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 251 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.06
- แล้วเสร็จ 294 รายการ คิดเป็นร้อยละ 53.95

**5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560** ปริมาณงาน 853 รายการ งบประมาณ 232.67 ล้านบาท เบิกจ่าย 122.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.65

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 110 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.90
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 86 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.08
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 75 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.79
- แล้วเสร็จ 582 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.23

**6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560** ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 716.76 ล้านบาท เบิกจ่าย 649.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.61

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 38 รายการ คิดเป็นร้อยละ 65.52
- แล้วเสร็จ 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.48

**7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(60 เพิ่มเติม)** ปริมาณงาน 725 รายการ (ยกเลิก 8 รายการและให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ) งบประมาณ 14,732.65 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,419.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.42

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.89
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.49
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 614 รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.23
- แล้วเสร็จ 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.39


ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>14,268</b>	<b>196</b>	<b>248</b>	<b>3,098</b>	<b>10,726</b>	<b>94,637.94</b>	<b>62,008.52</b>	<b>65.52</b>	
<b>1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)</b>	6,736	80	129	1,858	4,669	37,918.86	27,880.56	73.53	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 รายจ่ายลงทุน วงเงินรวมทั้งสิ้น 288,846,300 บาท
<b>2. งบกลาง</b>	<b>4,646</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>145</b>	<b>4,479</b>	<b>12,275.74</b>	<b>8,896.16</b>	<b>72.47</b>	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	3	2	583.00	91.63	15.72	ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้วเสร็จ 84 รายการ เบิกจ่าย 1,619.50 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 583.00 ล้านบาท
2.2 งบกลาง กปร.58	10	-	-	2	8	252.91	199.77	78.99	ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.87 ล้านบาท แล้วเสร็จ 91 รายการ เบิกจ่าย 147.01 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.59	66	-	-	13	53	1,312.05	1,110.07	84.61	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้วเสร็จ 39 รายการ เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05 ล้านบาท
2.4 งบกลาง กปร.60	53	-	20	32	1	1,118.26	190.40	17.03	ปริมาณงาน 63 รายการ งบประมาณ 1,342.79 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 53 รายการ เป็นเงิน 1,118.26 ล้านบาท
2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง และอุทกภัย	999	-	2	75	922	5,735.35	4,234.29	73.83	ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 3 รายการ งบประมาณ 8.94 ล้านบาท คงเหลือ 1,047 รายการ งบประมาณ 5,765.53 ล้านบาท แล้วเสร็จ 49 รายการ ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 998 รายการ งบประมาณ 5,735.35 ล้านบาท
2.6 งบกลาง โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี 2559	2,672	-	-	7	2,665	2,376.54	2,313.31	97.34	ปริมาณงาน 2,677 รายการ งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท ยกเลิก 5 รายการ งบประมาณ 7.07 ล้านบาท คงเหลือ 2,672 รายการ งบประมาณ 2,376.54 ล้านบาท /ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 รายการ รอเบิกจ่าย 5 รายการ
2.7 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ(กำจัดวัชพืช)	283	-	-	-	283	57.69	56.62	98.15	ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท ยกเลิก 12 รายการ งบประมาณ 3.21 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 283 รายการ งบประมาณ 57.69 ล้านบาท (โครงการปิด 31 มีนาคม พ.ศ.2560)
2.8 งบกลาง แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/2560	558	-	-	13	545	839.94	700.07	83.35	
<b>3. เงินกู้</b>	<b>757</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>117</b>	<b>639</b>	<b>22,744.87</b>	<b>18,383.77</b>	<b>80.83</b>	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	722	-	1	86	635	21,367.40	17,656.61	82.63	ปริมาณงาน 722 รายการ ยอดจัดสรร 22,416.82 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้จริง 21,367.40 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 635 รายการ คงเหลือ 87 รายการ ยกเลิก 3 รายการ
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	35	-	-	31	4	1,377.47	727.16	52.79	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอนจัดสรร 1,377.47 ล้านบาท
<b>4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559</b>	<b>545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>251</b>	<b>294</b>	<b>6,016.39</b>	<b>3,656.49</b>	<b>60.78</b>	
5. เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560	853	110	86	75	582	232.67	122.51	52.65	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 0.08 ล้านบาท เนื่องจากรายการซ้ำ
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	58	-	-	38	20	716.76	649.45	90.61	
7 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ (60 เพิ่มเติม)	673	6	10	614	43	14,732.65	2,419.59	16.42	
ส่วนราชการ	195	-	4	179	12	5,827.99	1074.87	18.44	ปริมาณงาน 239 รายการ ให้นำหน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ
กลุ่มจังหวัด	478	6	6	435	31	8,904.66	1344.71	15.10	ปริมาณงาน 486 รายการ ยกเลิก 8 รายการ

## 1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

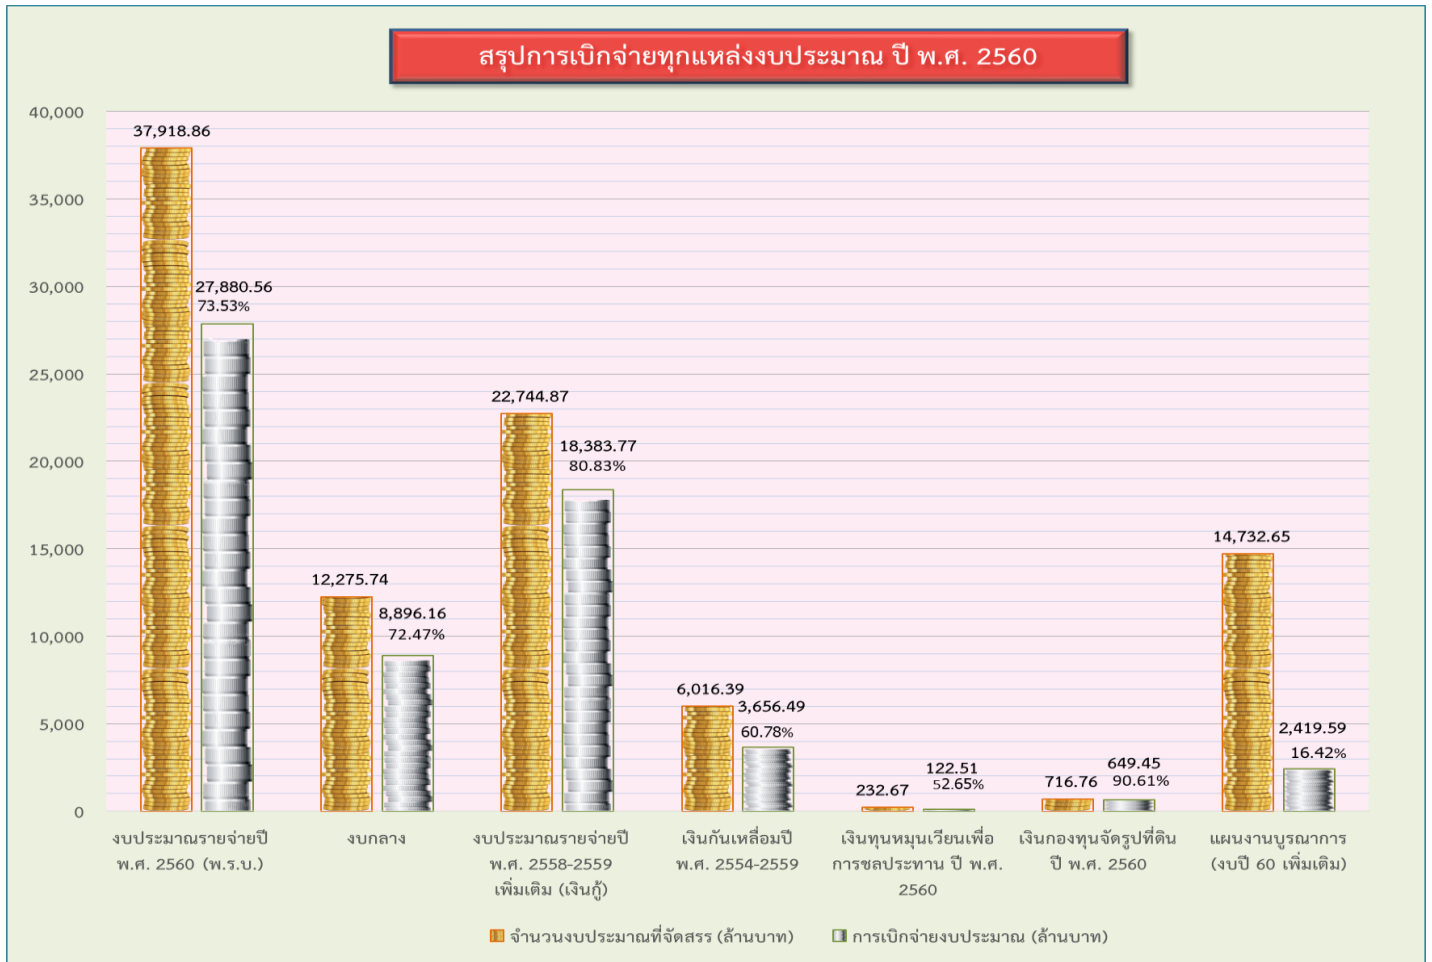

## 2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

