



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๒๕๖๑/๖

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/ ๒๒๘๖ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบ พ.ร.บ.) งบ 1075

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำแนกตามสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)
ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี ผส.ชป. ๑-๑๗ ผส.พญ. ผอ.พก. ผส.บอ. ผส.บก. ผส.อส. ผส.คก. ผส.สร. ผส.จต ผส.มด. และ ผอ.พด.

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทิต โออิชิต)

ผว.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑

ทราบ

เรียน ผอ.ส่วน ผอ.ส.สท. ผนท.นอ.
เพื่อโปรดทราบ

(นายประยูร เย็นใจ)

ผจน.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๑



ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกอบด้วย

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สชป.1 - 17 และส่วนกลาง
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามผลผลิต
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
6. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) กับแผนของสำนัก (ส่วนภูมิภาค)
7. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) กับแผนของสำนัก/กอง (ส่วนกลาง)
8. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
9. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
10. เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายที่สำนัก/กอง แจ้ง
11. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สขป.1-17 และส่วนกลาง
(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.)

สำนัก/กอง	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย				ทำข้อผูกพัน (รายการ)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	47,341.91	35,709.59	8,482.49	621.05	6,926	126	691	6,109	1,874	1,004	613	548	923	1,147
สขป. 1	1,153.99	1,064.44	242.96	22.82	368	2	20	346	98	73	32	14	21	108
สขป. 2	1,065.49	980.39	192.21	19.61	281	5	43	233	76	27	21	37	56	16
สขป. 3	1,056.27	535.07	119.09	22.26	282	3	52	227	49	57	36	26	44	15
สขป. 4	1,136.46	984.53	206.79	21.00	306	1	9	296	111	31	25	47	64	18
สขป. 5	2,038.14	1,646.26	452.34	27.48	430	1	26	403	98	53	26	24	74	128
สขป. 6	1,789.31	1,425.54	295.13	20.70	361	-	10	351	101	31	30	27	81	81
สขป. 7	1,957.05	1,789.92	455.33	25.44	337	-	17	320	62	30	31	30	35	132
สขป. 8	2,967.20	2,054.78	361.62	17.60	436	-	59	377	83	49	37	31	34	143
สขป. 9	2,172.66	1,246.31	190.10	15.25	463	16	37	410	136	55	35	60	67	57
สขป. 10	1,380.83	1,157.23	289.52	25.02	488	1	5	482	100	88	29	22	116	127
สขป. 11	949.05	596.96	148.54	24.88	380	17	28	335	114	95	30	25	59	12
สขป. 12	1,595.11	1,111.55	406.63	36.58	496	-	29	467	112	98	47	53	97	60
สขป. 13	1,217.42	1,018.45	183.06	17.97	482	24	50	408	187	58	71	35	48	9
สขป. 14	961.97	893.40	177.22	19.84	206	-	17	189	43	62	12	5	16	51
สขป. 15	2,342.13	922.48	186.17	20.18	316	11	63	242	57	42	33	25	30	55
สขป. 16	1,484.27	1,322.19	216.99	16.41	308	-	32	276	77	29	29	29	41	71
สขป. 17	664.79	662.20	141.41	21.36	198	4	18	176	48	48	27	13	17	23
สบก.	553.62	253.48	38.58	15.22	28	-	12	16	15	-	-	-	-	1
สบอ.	192.54	138.33	32.01	23.14	126	3	37	86	34	24	18	7	1	2
กพก.	9,454.98	7,865.82	1,618.72	20.58	179	2	50	127	80	15	13	6	5	8
สพญ.	8,448.23	6,170.72	1,563.72	25.34	170	25	31	114	70	24	8	7	2	3
สสธ.	394.56	244.63	70.58	28.85	45	-	21	24	-	1	11	7	2	3
สอส.	94.55	73.01	5.66	7.76	6	4	-	2	2	-	-	-	-	-
ศทส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สมด.	1,312.68	804.68	703.29	87.40	41	-	-	41	24	2	4	5	6	-
สคก.	559.55	559.13	169.81	30.37	169	-	22	147	85	11	8	13	7	23
สจด.	297.83	188.08	15.02	7.99	20	3	3	14	12	1	-	-	-	1
สลก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อื่นๆ	101.24	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามผลผลิต

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.)

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย				ทำข้อผูกพัน (รายการ)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	47,341.91	35,709.59	8,482.49	374.71	6,926	126	691	6,109	1,874	1,004	613	548	923	1,147
ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,513.06	1,344.30	529.83	39.41	1,325	14	148	1,163	360	324	149	88	85	157
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,328.87	1,200.11	310.09	25.84	432	2	37	393	87	59	44	36	65	102
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	13,728.49	11,073.03	2,385.97	21.55	403	10	92	301	205	36	27	19	9	5
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10,482.11	8,124.60	2,724.45	33.53	4,097	59	274	3,764	962	506	357	364	713	862
โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,202.48	4,879.80	697.24	14.29	189	9	62	118	78	20	8	4	5	3
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	407.43	181.22	64.87	35.80	152	4	5	143	27	14	14	30	43	15
งบประมาณบูรณาการ	7,201.42	4,241.48	429.36	10.12	207	9	54	144	106	28	7	2	1	-
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา	1,528.20	1,469.64	518.66	35.29	17	-	2	15	11	3	1	-	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	71.80	67.89	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรดิตถ์	728.58	555.28	5.79	1.04	21	1	4	16	9	5	1	-	-	1
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	307.23	273.86	65.76	24.01	9	-	2	7	5	1	-	-	1	-
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	644.50	390.07	134.19	34.40	13	-	-	13	8	2	-	3	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	489.52	255.97	17.28	6.75	9	3	5	1	1	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	404.73	404.36	24.01	5.94	10	2	4	4	1	2	1	-	-	-
โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	249.34	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจาก	263.99	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)	1,252.08	897.88	444.80	49.54	14	-	-	14	6	3	3	-	1	1
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	538.08	350.09	130.19	37.19	13	-	1	12	7	1	1	2	-	1

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ		
งบ พ.ร.บ.61	55,620.32	51,870.53	12,262.96	22.05	52.29	-30.24
- รายจ่ายประจำ	8,054.12	4,485.79	3,279.18	40.71	55.00	-14.29
- รายจ่ายลงทุน	47,566.20	47,384.74	8,983.78	18.89	43.11	-24.22


หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ : 1.เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30.29 % ไตรมาสที่ 2= 52.29 % ไตรมาสที่ 3 = 74.29 % ไตรมาสที่ 4 =96.00 %
2. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่1 = 21.11 % ไตรมาสที่ 2 = 43.11 % ไตรมาสที่ 3 = 65.11 % ไตรมาสที่ 4 = 88.00 %
3. ร้อยละต้องงบประมาณรายจ่ายตาม พ.ร.บ.

4.

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

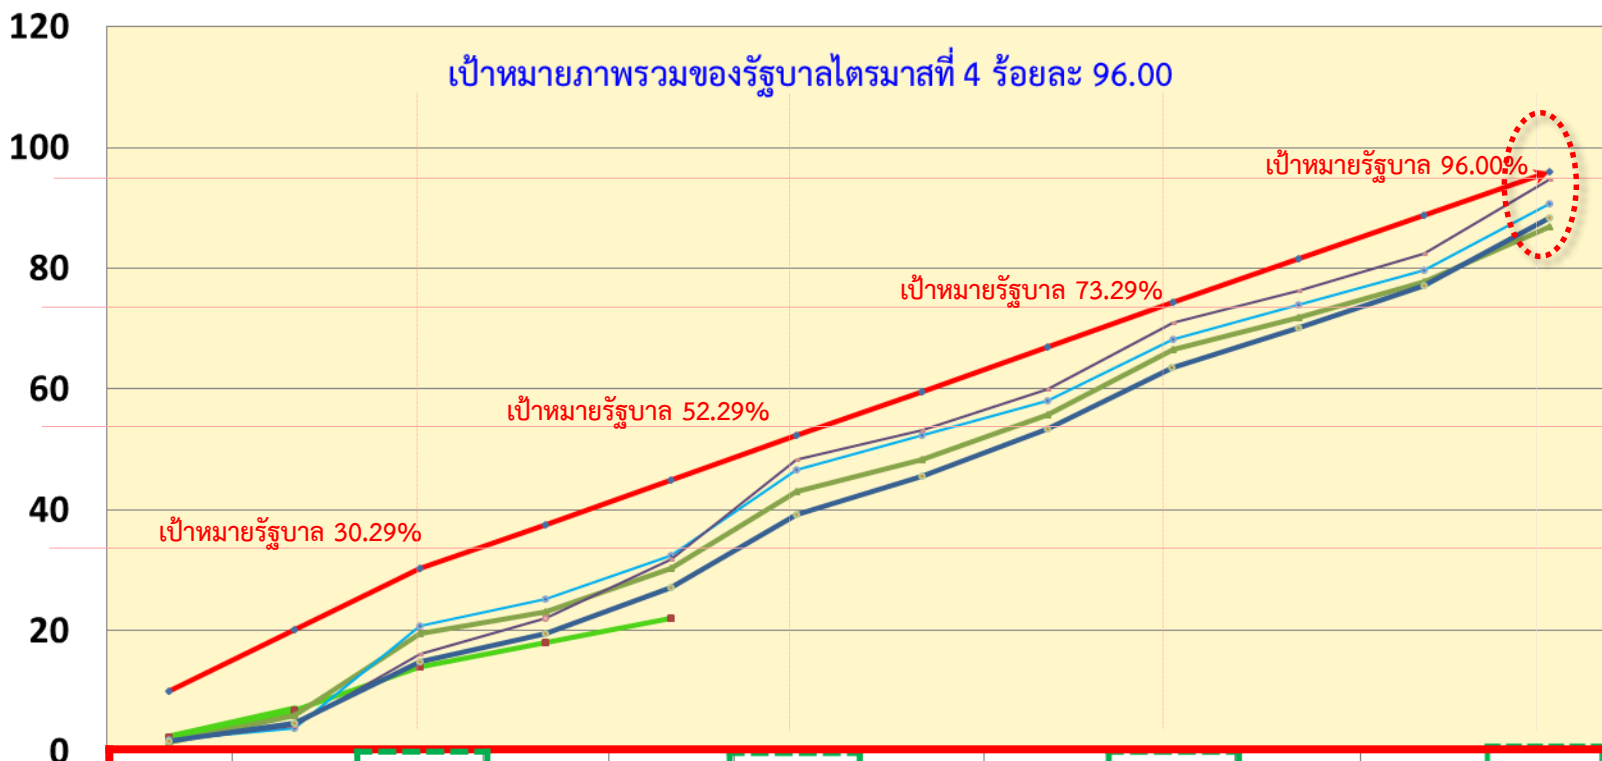


	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
→ เป้าหมายรัฐบาล	10.10	20.20	30.29	37.63	44.96	52.29	59.62	66.95	74.29	81.53	88.77	96.00
ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	22.05							
ผลปี 60 (47,004.27)	1.50	5.94	19.46	23.11	30.30	43.12	48.35	55.72	66.56	71.83	77.86	86.95
ผลปี 59 (46,708.92)	2.04	3.91	20.86	25.19	32.46	46.68	52.40	58.02	68.24	73.86	79.68	90.69
ผลปี 58 (43,054.76)	1.76	4.21	16.07	22.04	31.89	48.43	53.28	60.04	71.00	76.28	82.33	94.64
เฉลี่ย 5 ปี (56-60)	1.73	4.76	14.87	19.57	27.19	39.23	45.65	53.41	63.49	70.14	77.10	88.37

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30.29 % ไตรมาสที่ 2 = 52.29 % ไตรมาสที่ 3 = 74.29 % ไตรมาสที่ 4 = 96.00 %

5.

สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2561

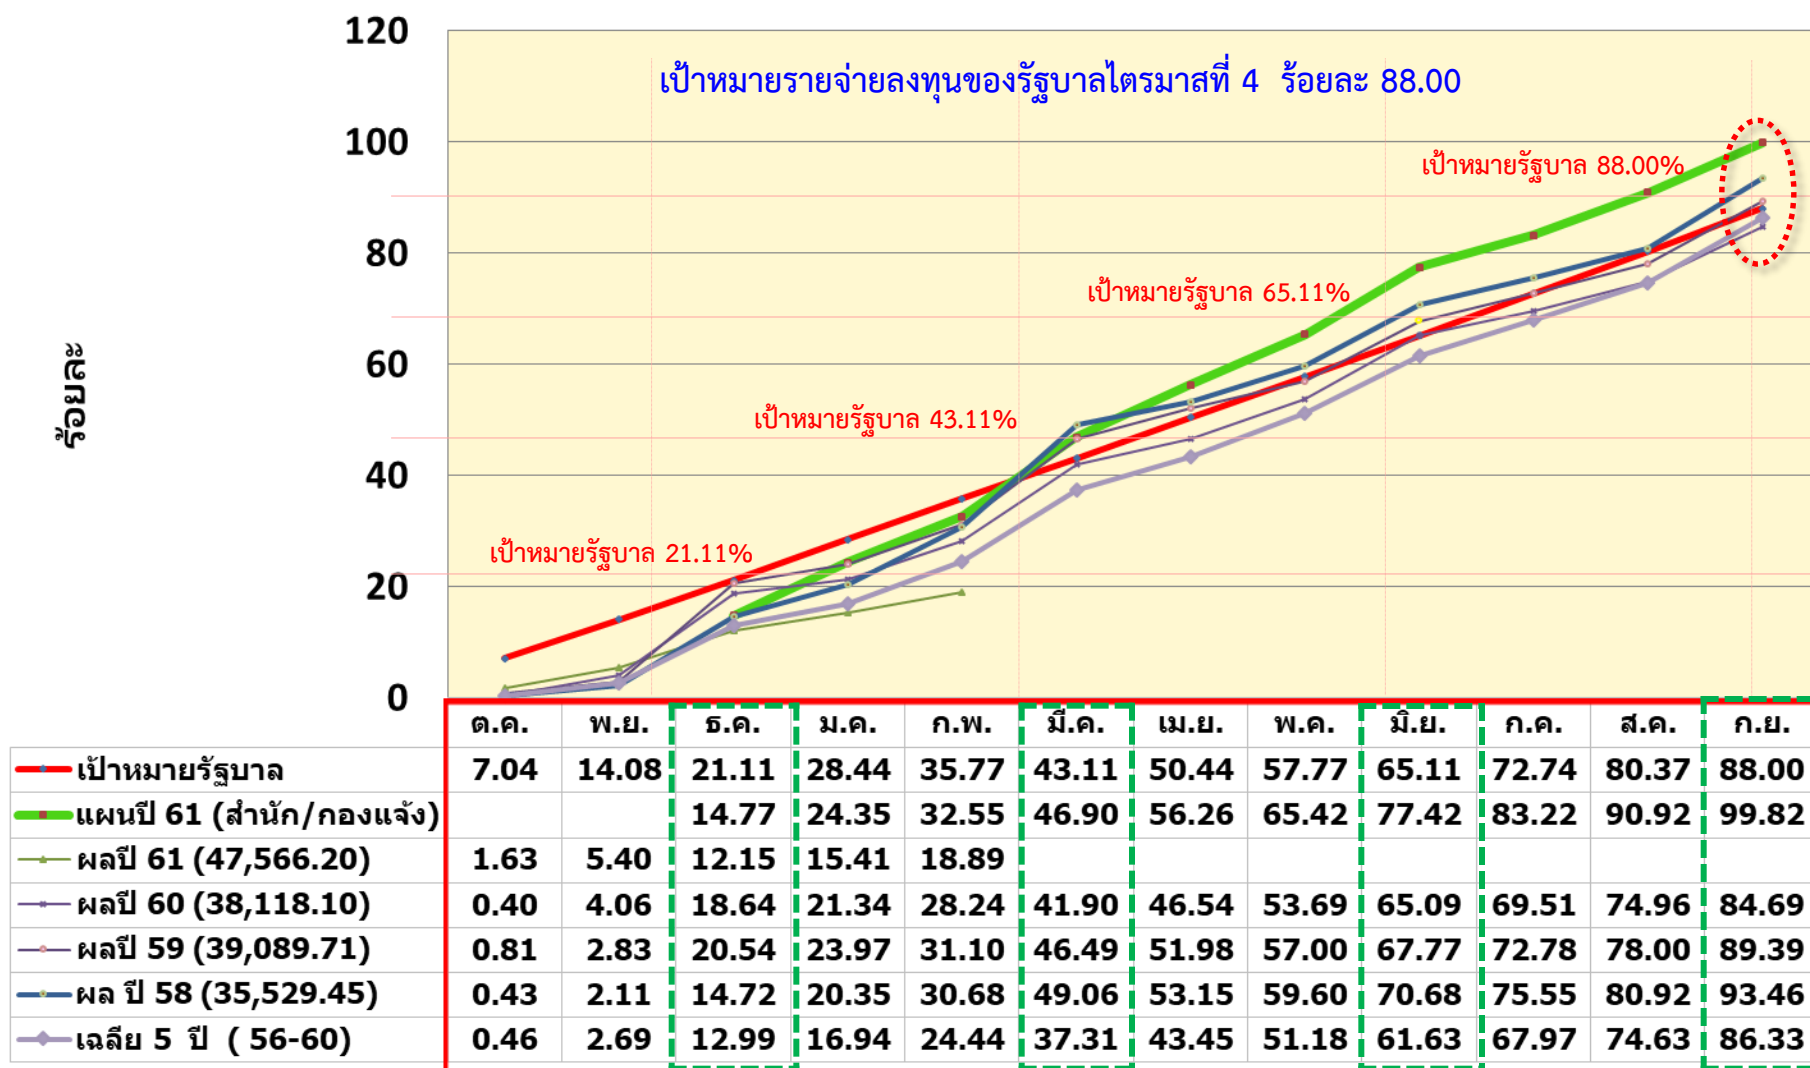


หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 21.11 % ไตรมาสที่ 2 = 43.11 % ไตรมาสที่ 3 = 65.11 % ไตรมาสที่ 4 = 88.00 %

6. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.61) กับแผนของสำนัก (ส่วนภูมิภาค)


(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.)

ร้อยละ

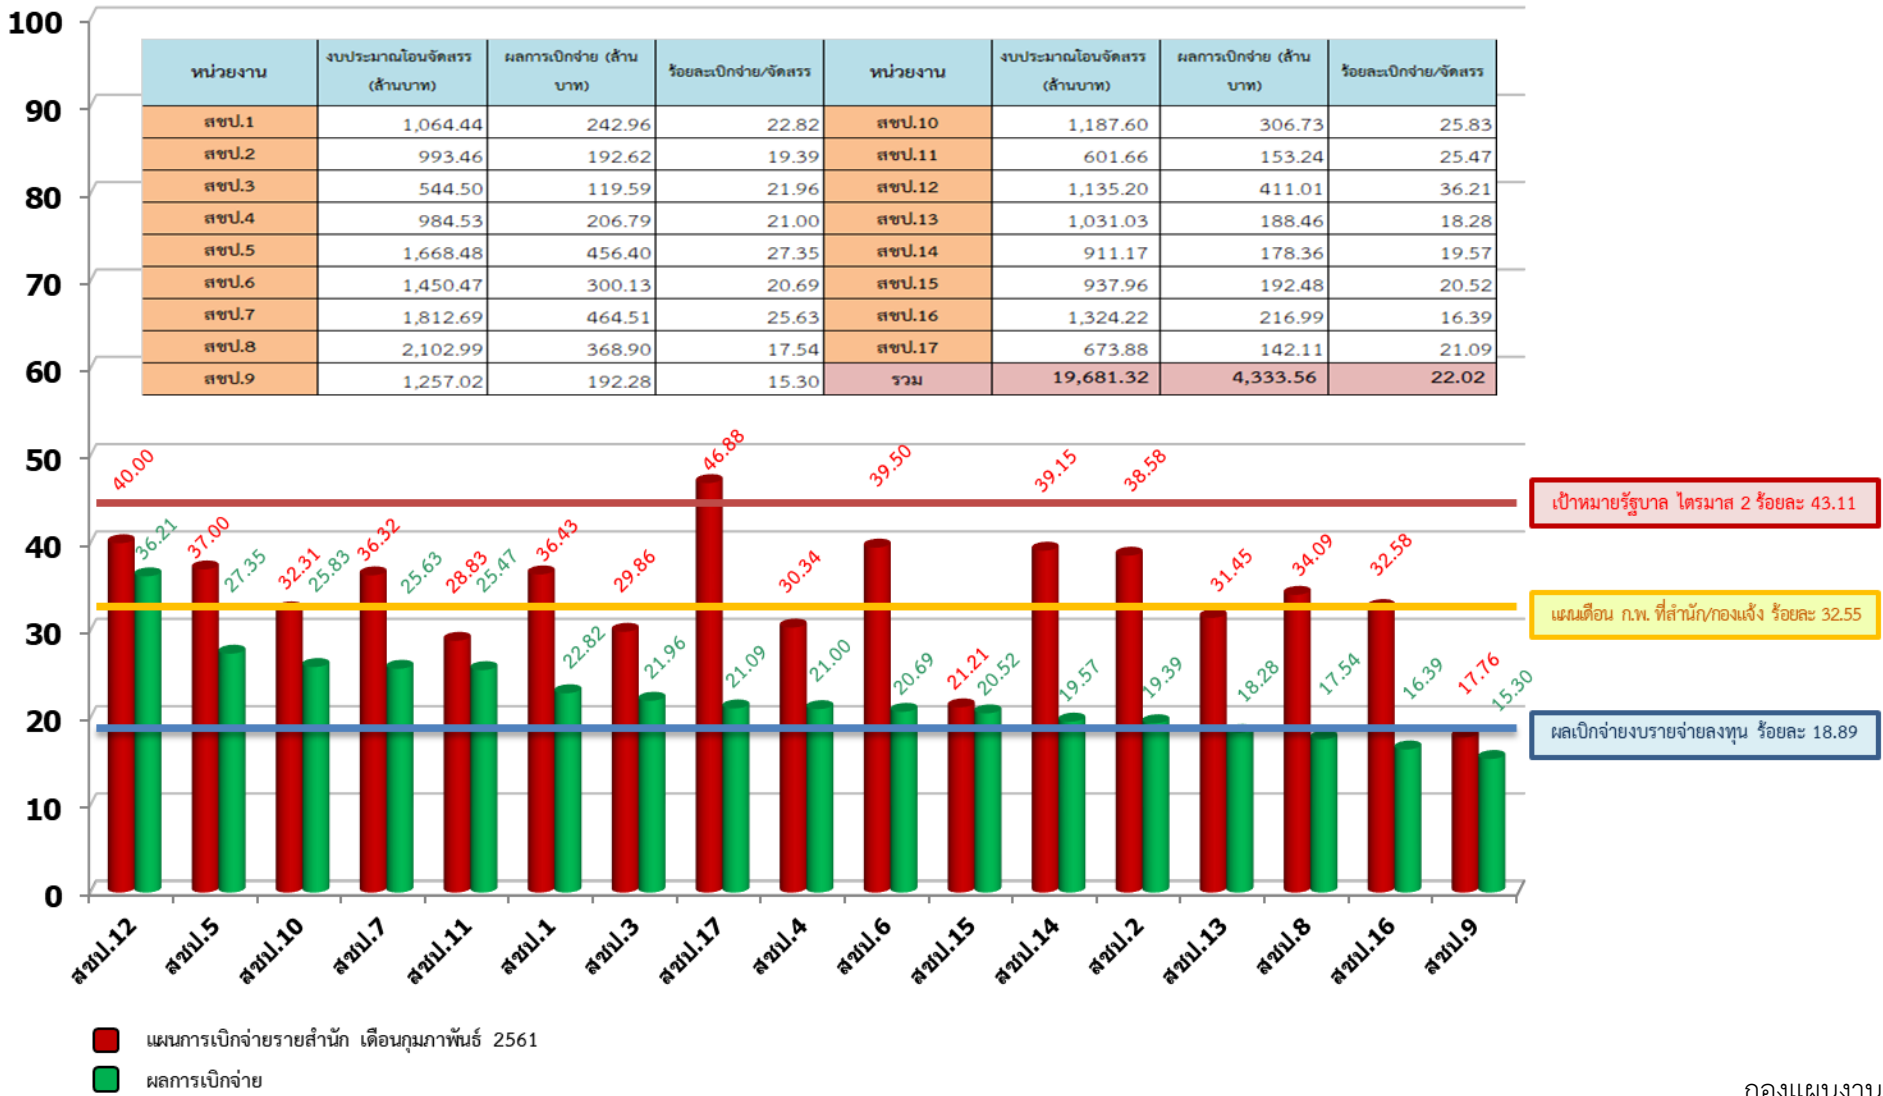


7.เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.61) กับแผนของสำนัก/กอง (ส่วนกลาง)

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.)

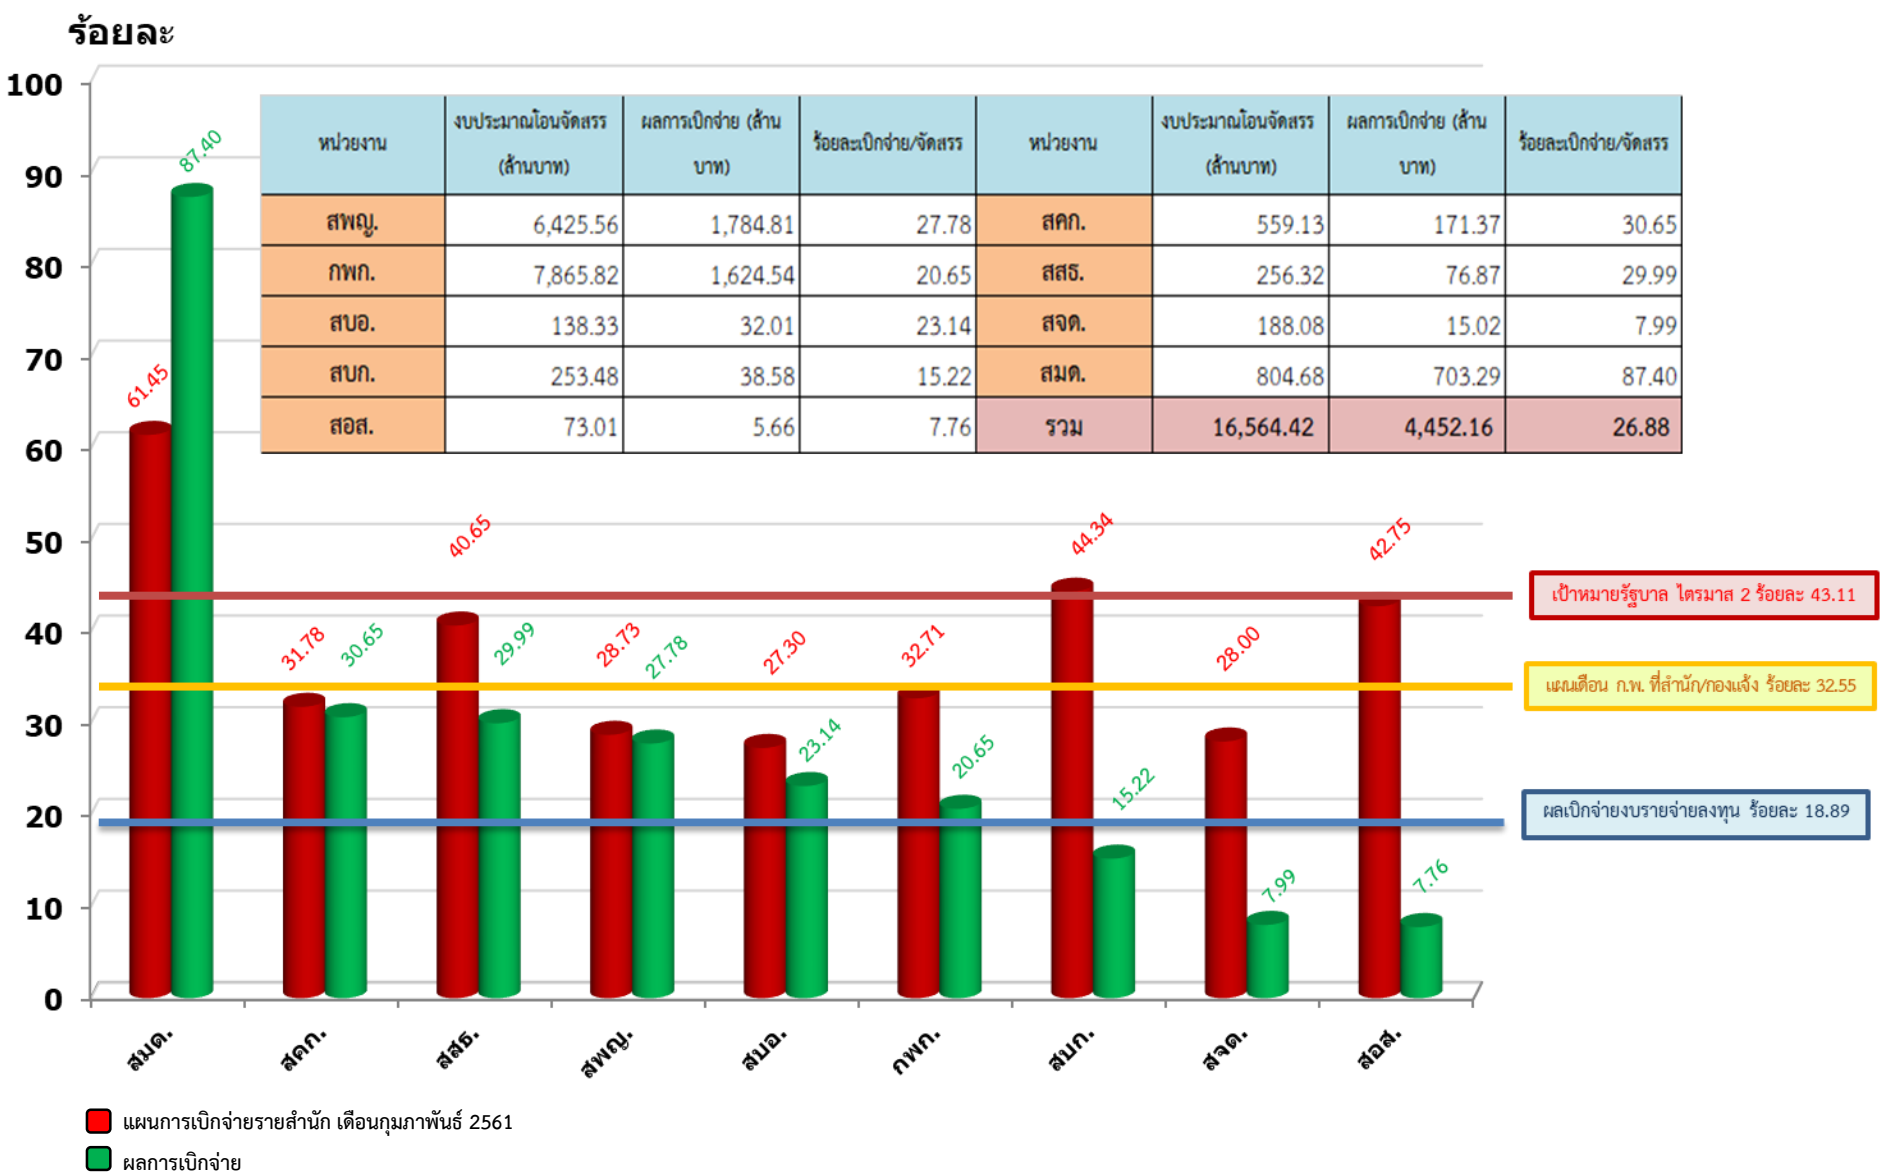

8. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่


(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.)

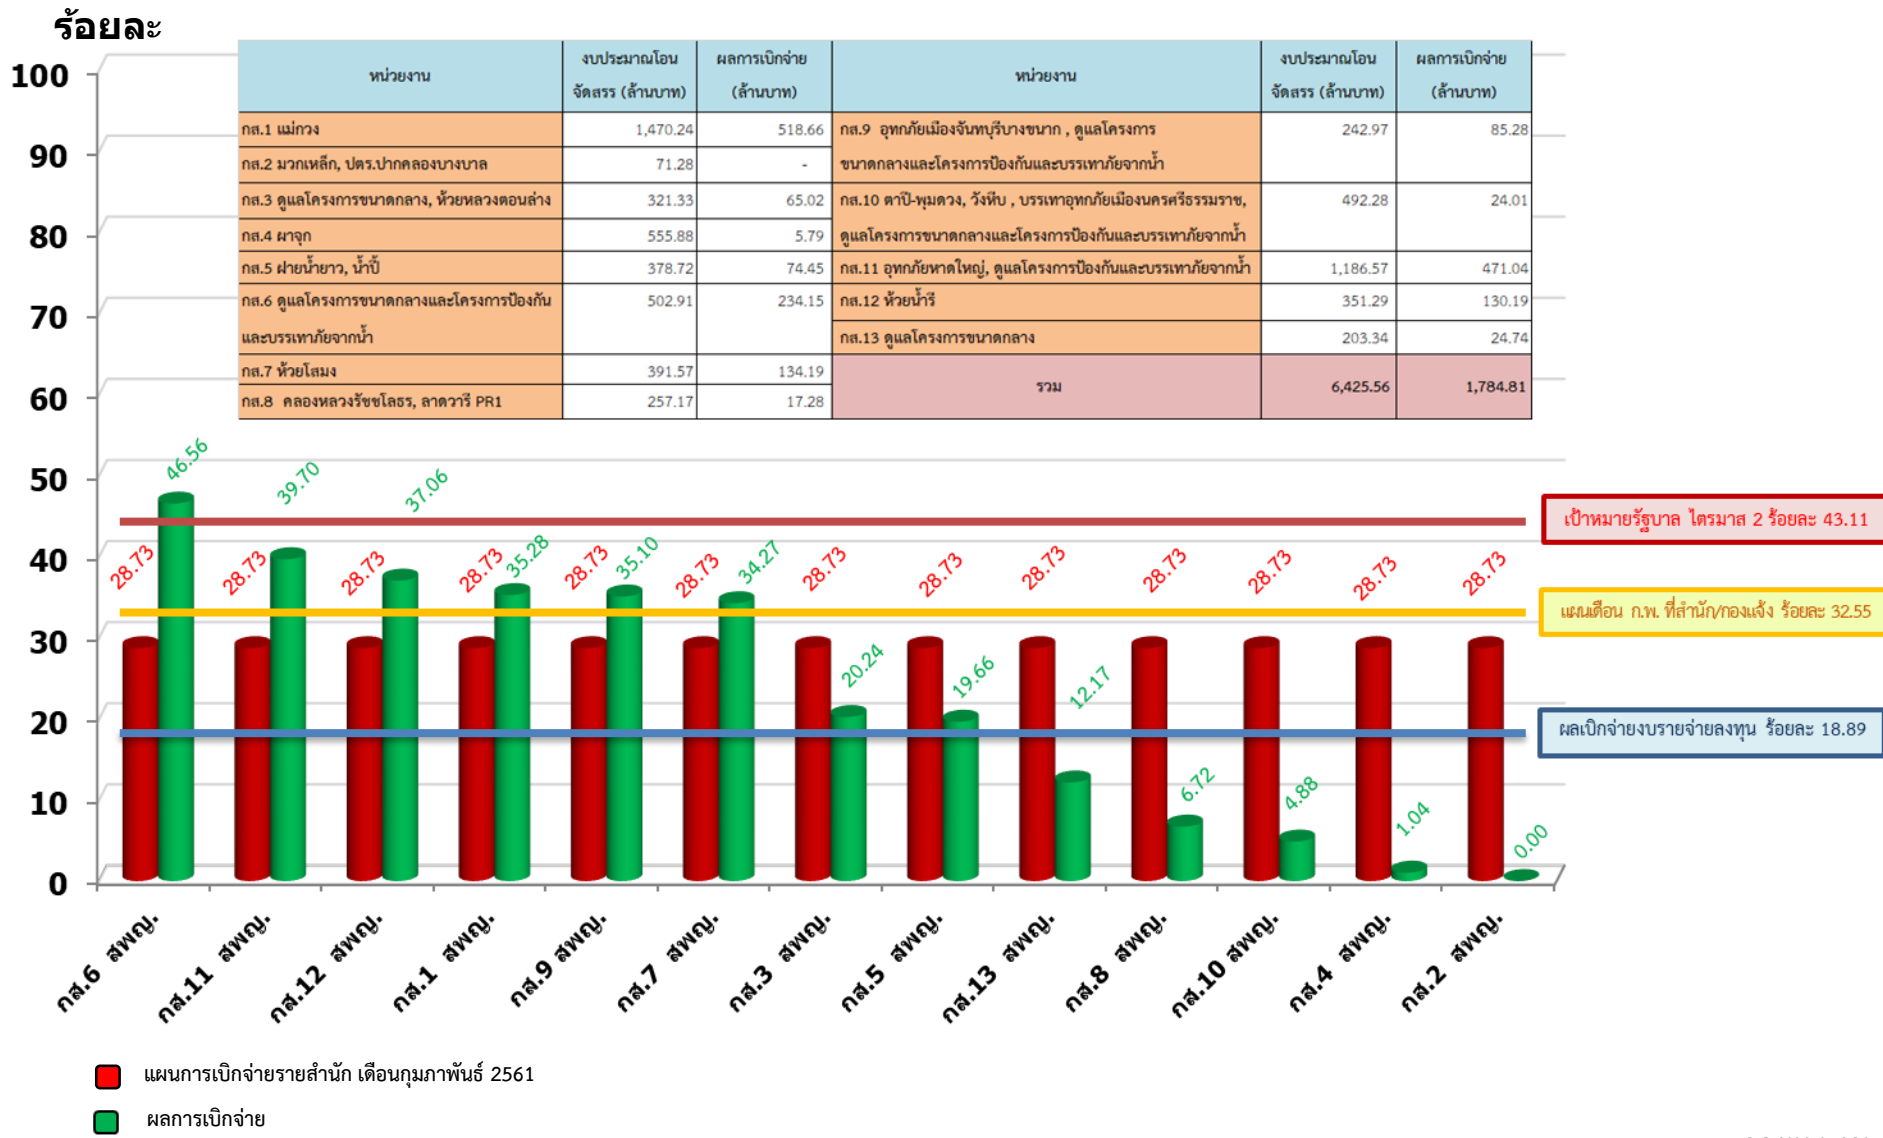

9. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.)

ร้อยละ

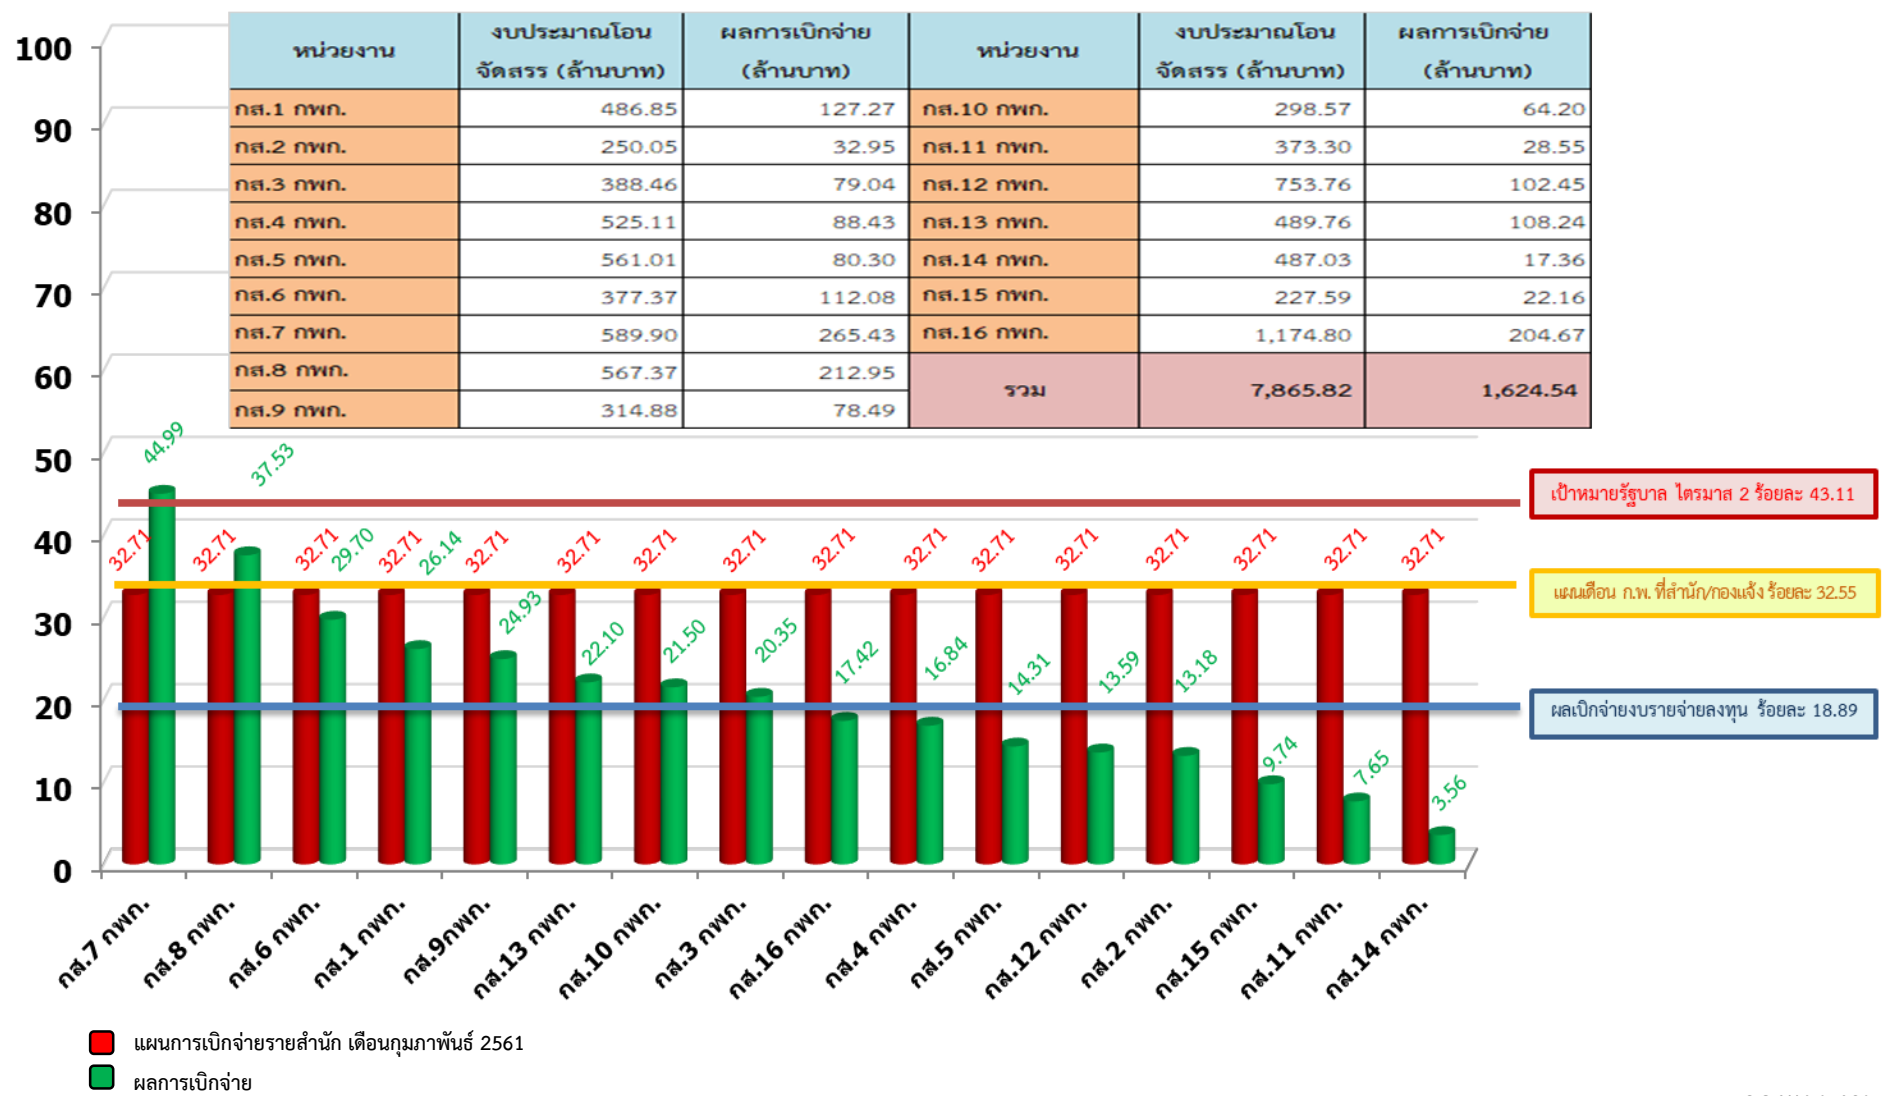

10. เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายที่สำนัก/กอง แจ้ง



(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.)



ผลต่างใกล้เคียงจากเป้าหมาย

สำนัก	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
สชป.15	▼ -0.69 %
สพญ.	▼ -0.95 %

ผลต่างจากเป้าหมายน้อยกว่า ร้อยละ 5

สำนัก	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
สคก.	▼ -1.13 %
สชป.9	▼ -2.46 %
สชป.11	▼ -3.36 %
สชป.12	▼ -3.79 %

ผลต่างจากเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 5 -10

สำนัก	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
สชป.10	▼ -6.49 %
สชป.3	▼ -7.90 %
สชป.4	▼ -9.34 %
สชป.5	▼ -9.65 %

ผลต่างจากเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 10

สำนัก	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
สชป.1	▼ -13.61 %
สชป.2	▼ -19.19 %
สชป.6	▼ -18.81 %
สชป.7	▼ -10.70 %
สชป.8	▼ -16.55 %
สชป.13	▼ -13.17 %
สชป.14	▼ -19.58 %
สชป.16	▼ -16.19 %
สชป.17	▼ -25.80 %
กพก.	▼ -12.06 %
สบก.	▼ -29.12 %
สอส.	▼ -34.99 %
สสธ.	▼ -10.66 %
สจด.	▼ -20.01 %
สมด.	▲ 25.95 %

11. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
<u>ระดับกระทรวง</u> (ที่มีงบเกิน 10,000 ล้านบาท)				
1	กระทรวงศึกษาธิการ	49,344.00	19,918.57	40.37
2	กระทรวงคมนาคม (งบรายจ่ายลงทุนสูงสุด)	156,516.16	40,377.46	25.80
3	กระทรวงสาธารณสุข	22,152.36	4,625.75	20.88
4	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (งบรายจ่ายลงทุนลำดับที่ 4)	55,699.05	10,792.19	19.38
5	กระทรวงกลาโหม	57,406.46	11,083.46	19.31
6	กระทรวงมหาดไทย	60,572.55	6,358.53	10.50
7	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,980.22	964.75	6.44
<u>ระดับกรม</u> (คู่เทียบ)				
1	กรมทางหลวงชนบท	44,777.97	12,831.98	28.66
2	กรมทางหลวง	99,984.66	26,707.29	26.71
3	กรมชลประทาน (มีงบรายจ่ายลงทุนอันดับ 1 ของ กษ.)	47,590.18	8,676.77	18.23
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	25,089.21	4,410.54	17.58

หมายเหตุ :

- ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
- ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 22.05 %
- ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (44 หน่วยงาน) เฉลี่ย 18.89 %
