



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ที่ กพว ๐๖/ ๔๑๒
ค.ศ. ๑๖๓๔/๑๙ ๒-๐๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖
 ที่ กพว ๐๖/ ๔๑๒ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
 เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้
 ใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อชช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เท่งคำ)
ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชธ. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
ผอ.ผง.
๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑

- ทงข

- เรืองน พอ.สอน และ ๒๐๕.๗๗

เพื่อโปรดทราบ.

(นายประยูร เย็นใจ)
ผจน.บอ. รักษาราชการแทน ผส.บอ
๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 7 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 102,007.53 ล้านบาท ปริมาณงาน 10,605 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.) ปริมาณงาน 6,957 รายการ งบประมาณ 47,474.28 ล้านบาท เบิกจ่าย 11,748.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.75

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 83 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.19
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 366 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.26
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 4,945 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.08
- แล้วเสร็จ 1,563 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.47

2. งบกลาง ปริมาณงาน 164 รายการ งบประมาณ 4,997.11 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,633.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.69

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 14 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.54
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 113 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.90
- แล้วเสร็จ 37 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.56

3. เงินกู้ โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม 2558-2559) ปริมาณงาน 757 รายการ งบประมาณ 22,744.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 18,810.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.70

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 104 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.74
- แล้วเสร็จ 652 รายการ คิดเป็นร้อยละ 86.13

4. เงินกัณฑ์ลื้อมปี พ.ศ. 2555-2560 ปริมาณงาน 850 รายการ งบประมาณ 10,351.80 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,879.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.82

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 723 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.06
- แล้วเสร็จ 127 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.94

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2561 ปริมาณงาน 1,117 รายการ งบประมาณ 55.03 ล้านบาท เบิกจ่าย 14.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.81

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 387 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.65
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 466 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.72
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 264 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.63

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 79 รายการ งบประมาณ 1,061.91 ล้านบาท เบิกจ่าย 314.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.58

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.27
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 76 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.20
- แล้วเสร็จ 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.53

7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(60 เพิ่มเติม) ปริมาณงาน 733 รายการ (ยกเลิก 8 รายการและให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ) งบประมาณ 15,322.53 ล้านบาท เบิกจ่าย 5,296.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.57

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.88
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.32
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 456 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.96
- แล้วเสร็จ 210 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.84


ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งหมด	10,605	476	857	6,681	2,591	102,007.53	40,696.46	39.90	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.)	6,957	83	366	4,945	1,563	47,474.28	11,748.29	24.75	
2. งบกลาง	164	-	14	113	37	4,997.11	1,633.37	32.69	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	3	-	-	2	1	526.00	72.25	13.74	ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้วเสร็จ 86รายการ รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี 2560 จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 526.00 ล้านบาท
2.2 งบกลาง กปร.59	2	-	-	2	-	46.63	4.65	9.97	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้วเสร็จ 103 รายการ รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี 2560 จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 46.63 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.60	68	-	2	55	11	1,402.97	682.57	48.65	ปริมาณงาน 80 รายการ งบประมาณ 1,581.92 ล้านบาท แล้วเสร็จ 12 รายการ รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี 2560 จำนวน 68 รายการ งบประมาณ 1,402.97 ล้านบาท
2.4 งบกลาง กปร.61	10	-	9	1	-	224.67	-	0.00	ปริมาณงาน 27 รายการ งบประมาณ 285.67 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 10 รายการ งบประมาณ 224.67 ล้านบาท ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 9 รายการ และอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 17 รายการ
2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูปเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง และอุทกภัย	40	-	-	18	22	1,206.30	591.83	49.06	ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 3 รายการ งบประมาณ 8.94 ล้านบาท คงเหลือ 1,047 รายการ งบประมาณ 5,765.53 ล้านบาท แล้วเสร็จ 12 รายการ รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี 2560 จำนวน 40 รายการ งบประมาณ 1,206.30 ล้านบาท
2.6 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล	41	-	3	35	3	1590.54	282.07	17.73	ดำเนินการโดยกองทัพบก จำนวน 17 รายการ
3. เงินกู้	757	-	1	104	652	22,744.87	18,810.00	82.70	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	722	-	1	77	644	21,367.40	18,001.42	84.25	ปริมาณงาน 722 รายการ ยอดจัดสรร 22,416.82 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้จ่ายจริง 21,367.40 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 643 รายการ คงเหลือ 79 รายการ ยกเลิก 3 รายการ
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	35	-	-	27	8	1,377.47	808.58	58.70	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอนจัดสรร 1,377.47 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมปี พ.ศ. 2555 - 2560	850	-	-	723	127	10,351.80	2,879.51	27.82	ปริมาณงานที่ยกเลิก จำนวน 12 รายการ งบประมาณ 295.10 ล้านบาท
4.1 เงินกู้ยืมปี พ.ศ. 2555	5	-	-	4	1	154.20	0.43	0.28	
4.2 เงินกู้ยืมปี พ.ศ. 2556	6	-	-	4	2	128.81	20.77	16.12	
4.3 เงินกู้ยืมปี พ.ศ. 2557	16	-	-	11	5	282.07	114.47	40.58	
4.4 เงินกู้ยืมปี พ.ศ. 2558	20	-	-	14	6	289.56	13.52	4.67	
4.5 เงินกู้ยืมปี พ.ศ. 2559	118	-	-	100	18	818.30	229.99	28.11	
4.6 เงินกู้ยืมปี พ.ศ. 2560	685	-	-	590	95	8,678.86	2,500.33	28.81	
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2561	1,117	387	466	264	-	55.03	14.20	25.81	เพิ่ม 1 รายการ งบประมาณ 15,965.00 ล้านบาท
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน	79	-	1	76	2	1,061.91	314.12	29.58	
6.1 เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	7	-	-	5	2	114.15	93.32	81.75	ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 711.06 ล้านบาท แล้วเสร็จ 51รายการ รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี 2560 จำนวน 7 รายการ งบประมาณ 115.74 ล้านบาท
6.2 เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2561	72	-	1	71	-	947.76	220.80	23.30	
7 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ (60 เพิ่มเติม)	681	6	9	456	210	15,322.53	5,296.97	34.57	
ส่วนราชการ	195	-	1	137	57	5,868.12	2,953.55	50.33	ปริมาณงาน 239 รายการ ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ
กลุ่มจังหวัด	486	6	8	319	153	9,454.41	2,343.42	24.79	ปริมาณงาน 494 รายการ ยกเลิก 8 รายการ

1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561

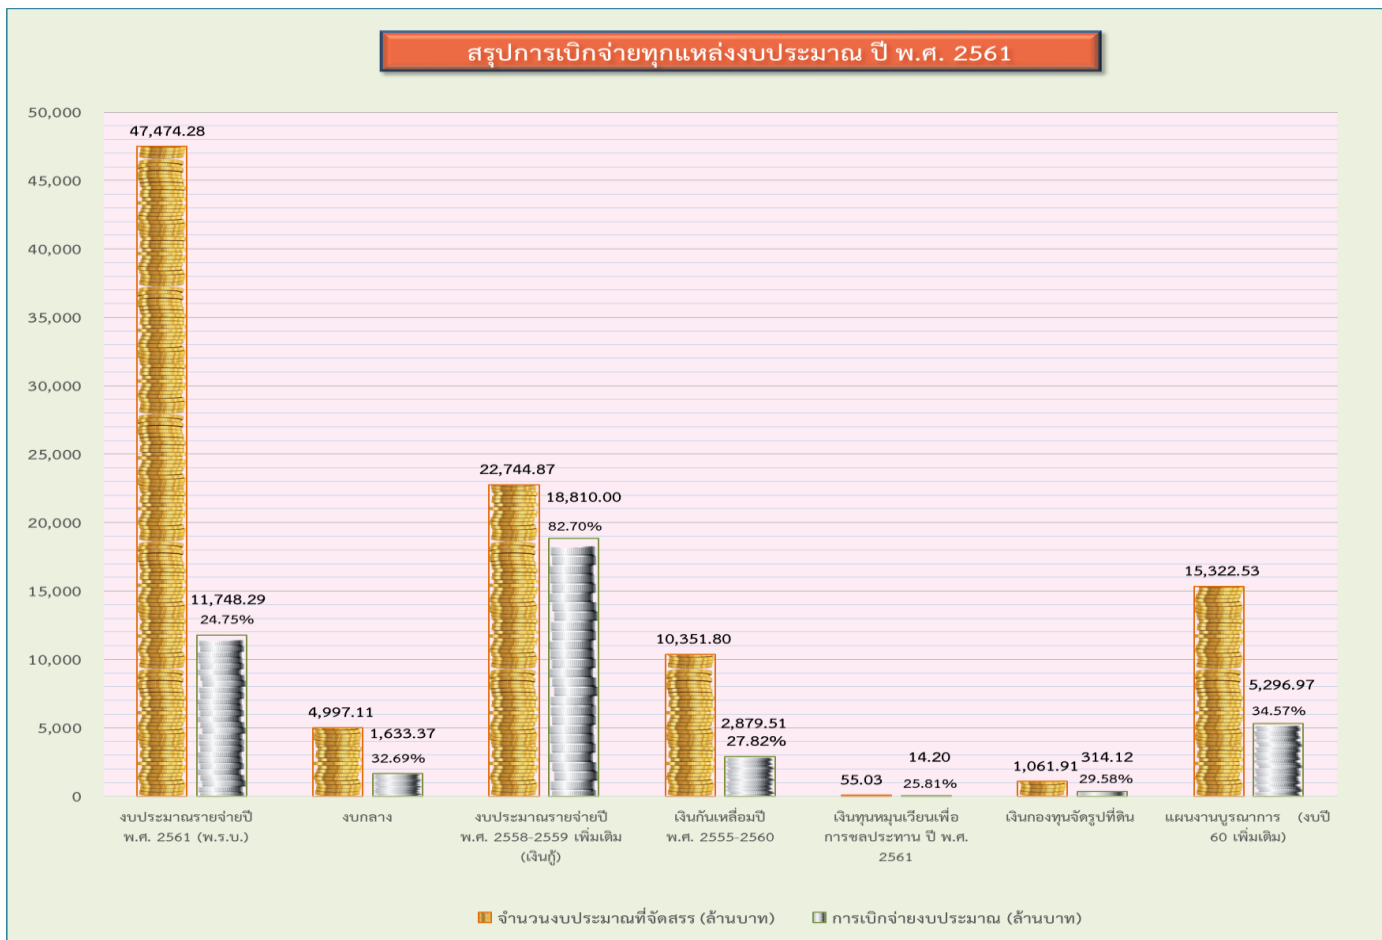

2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561

