



ส่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๑๓๘๒/๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบ พ.ร.บ.) งบ 6179

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำแนกตามสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ศตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

๕ ก.ย. ๒๕๖๑

- ทราบ

- เรียน ผอ.ส่วน, ออ.พต.
เพื่อในจดทบท.

(นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์)

ผส.บอ. - ๕ ก.ย. ๒๕๖๑



ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายละเอียดข้อมูล



ประกอบด้วย

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สขป.1 - 17 และส่วนกลาง
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามผลผลิต
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.61) ของสำนัก/กอง
7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
9. เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2561 (ร้อยละ 80.37)
10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สขบ.1-17 และส่วนกลาง (ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.)

ลำดับ/กอง	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ยอดคงเบิกจ่าย				ทำสัญญา (รายการ)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	47,108.97	41,493.80	28,831.85	69.48	7,034	33	111	6,890	303	185	191	410	1,616	4,185
สขบ. 1	1,153.99	1,029.26	900.50	87.49	368	-	1	367	3	3	8	20	123	210
สขบ. 2	1,065.51	994.83	794.10	79.62	280	1	3	276	3	3	6	19	130	117
สขบ. 3	1,004.60	812.99	572.83	70.46	278	-	-	278	5	6	11	11	87	158
สขบ. 4	1,136.46	942.83	735.62	78.02	306	-	-	306	4	5	1	18	82	196
สขบ. 5	2,005.15	1,764.14	1,413.97	80.15	429	-	4	425	10	7	9	17	64	318
สขบ. 6	1,886.97	1,573.46	1,150.93	73.15	366	-	-	366	7	10	10	23	83	233
สขบ. 7	1,957.05	1,727.43	1,436.40	83.16	337	-	-	337	2	5	5	10	76	239
สขบ. 8	2,841.54	2,182.04	1,371.79	62.87	436	-	-	436	25	16	13	19	74	289
สขบ. 9	2,127.34	1,884.15	674.03	46.39	465	1	2	462	14	9	6	37	126	270
สขบ. 10	1,485.53	1,245.93	929.15	74.58	491	-	1	490	1	3	9	18	74	385
สขบ. 11	956.27	743.38	487.85	65.63	376	1	19	356	20	7	15	18	71	225
สขบ. 12	1,556.67	1,392.92	1,162.16	83.43	497	-	-	497	51	49	8	21	62	306
สขบ. 13	1,189.18	1,016.90	781.70	76.87	488	4	6	480	12	14	11	41	210	192
สขบ. 14	959.42	870.09	679.83	78.13	204	-	-	204	2	1	5	7	47	142
สขบ. 15	2,000.44	1,895.21	817.78	63.15	339	-	27	312	16	2	11	17	60	208
สขบ. 16	1,607.21	1,520.10	1,139.97	74.99	333	3	15	315	2	4	2	5	55	267
สขบ. 17	697.40	634.34	547.44	86.30	204	-	1	203	-	1	4	14	31	153
สขบ.	536.21	347.15	134.97	38.88	28	2	2	24	15	-	1	-	5	3
สขบ.	190.16	187.77	131.19	69.87	127	1	16	110	36	3	4	17	29	21
กพร.	9,252.44	8,753.92	5,994.76	68.48	176	-	8	170	28	12	15	33	55	27
กพร.	8,449.23	7,221.95	4,350.41	60.24	170	9	5	156	29	22	31	27	33	14
มทร.	435.49	360.48	342.21	94.88	97	3	2	92	-	-	-	-	8	44
สอศ.	96.02	96.52	23.70	24.56	6	-	-	6	3	-	3	-	-	-
สอศ.	1,528.31	1,471.23	1,321.78	89.84	64	-	-	64	16	1	4	6	12	29
สอศ.	656.55	636.43	605.42	95.13	174	-	-	174	-	1	-	8	8	157
สอศ.	220.84	181.92	126.02	69.28	20	-	-	20	-	1	1	4	11	3
สอศ.	15.77	6.24	5.14	82.48	9	4	1	4	1	-	-	-	-	3
อื่นๆ	101.24	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1. รายการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มาจากโครงการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ
2. งบประมาณ (พ.ร.บ.) รวมรายการที่มาจากโครงการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามผลผลิต (ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ)


(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ)

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ยอดคงเบิกจ่าย				ทำสัญญา (รายการ)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-75 %	60-99 %	100%
รวม	47,108.97	41,493.80	28,831.85	69.48	7,034	33	111	6,890	303	185	191	410	1,616	4,185
ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,541.37	1,433.69	1,203.57	83.95	1,350	7	26	1,317	60	25	25	111	445	651
โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,355.61	1,201.46	1,024.12	85.24	439	2	-	437	9	2	9	15	121	281
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	13,982.37	12,878.68	9,023.81	70.07	437	4	6	427	60	25	43	64	152	83
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10,478.07	8,933.52	7,243.88	81.09	4,090	7	26	4,057	89	92	56	130	728	2,962
โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,255.78	5,627.53	3,655.28	64.95	233	2	45	186	33	21	21	25	46	40
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	407.03	194.30	131.64	67.73	149	-	1	148	1	-	2	8	14	123
งบประมาณบูรณาการ	6,568.69	5,611.76	3,181.14	56.69	203	-	-	203	29	6	15	38	89	26
โครงการกั้นปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่มอกหลวง	1,528.20	1,472.45	1,202.16	81.64	17	-	-	17	3	2	1	3	5	3
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี	71.80	69.49	1.09	1.56	2	-	-	2	1	-	-	-	1	-
โครงการเขื่อนทดน้ำหางดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	733.62	616.40	329.76	53.50	22	-	-	22	6	3	6	3	1	3
โครงการอ่างเก็บน้ำปากอ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	310.85	300.21	108.31	36.08	11	-	1	10	3	1	2	2	-	2
โครงการห้วยโสมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์	657.17	444.31	237.55	53.47	15	1	-	14	2	4	1	2	4	1
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	494.64	402.83	107.09	26.58	10	-	1	9	1	1	1	2	1	3
โครงการพัฒนาคูน้ำคาวปลา-พุมศร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	407.01	441.80	283.61	64.20	12	1	2	9	-	1	3	3	1	1
โครงการกังหัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	256.54	0.20	0.01	2.05	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	265.30	260.28	12.40	4.76	8	2	3	3	1	-	1	-	-	1
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)	1,255.08	1,096.54	798.37	72.81	15	-	-	15	1	1	5	2	4	2
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	539.83	508.34	288.09	56.67	14	-	-	14	4	1	-	2	4	3

หมายเหตุ : 1. รายการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มาจากโครงการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ
2. งบประมาณ (พ.ร.บ.) รวมรายการที่มาจากโครงการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ


3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.)

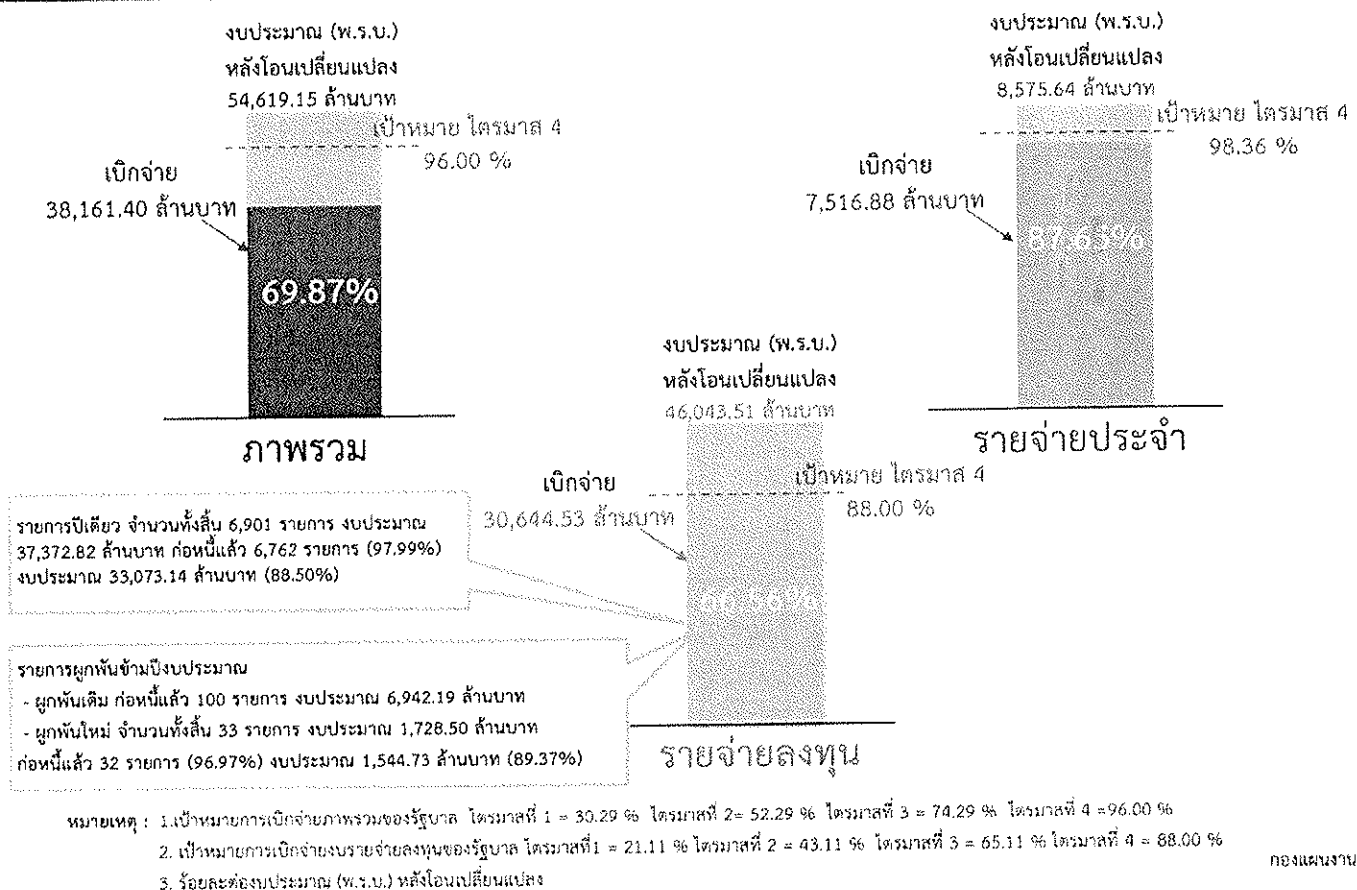


4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

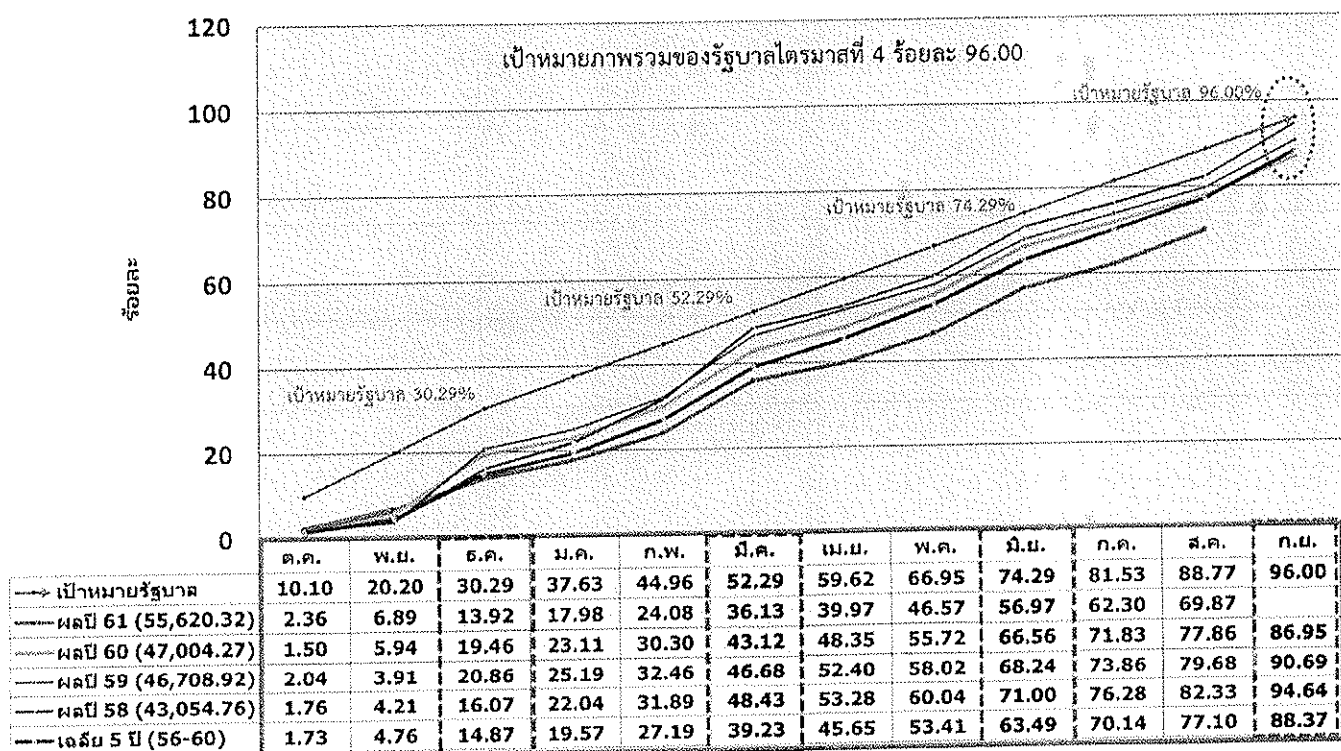

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30.29 % ไตรมาสที่ 2 = 52.29 % ไตรมาสที่ 3 = 74.29 % ไตรมาสที่ 4 = 96.00 %


5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

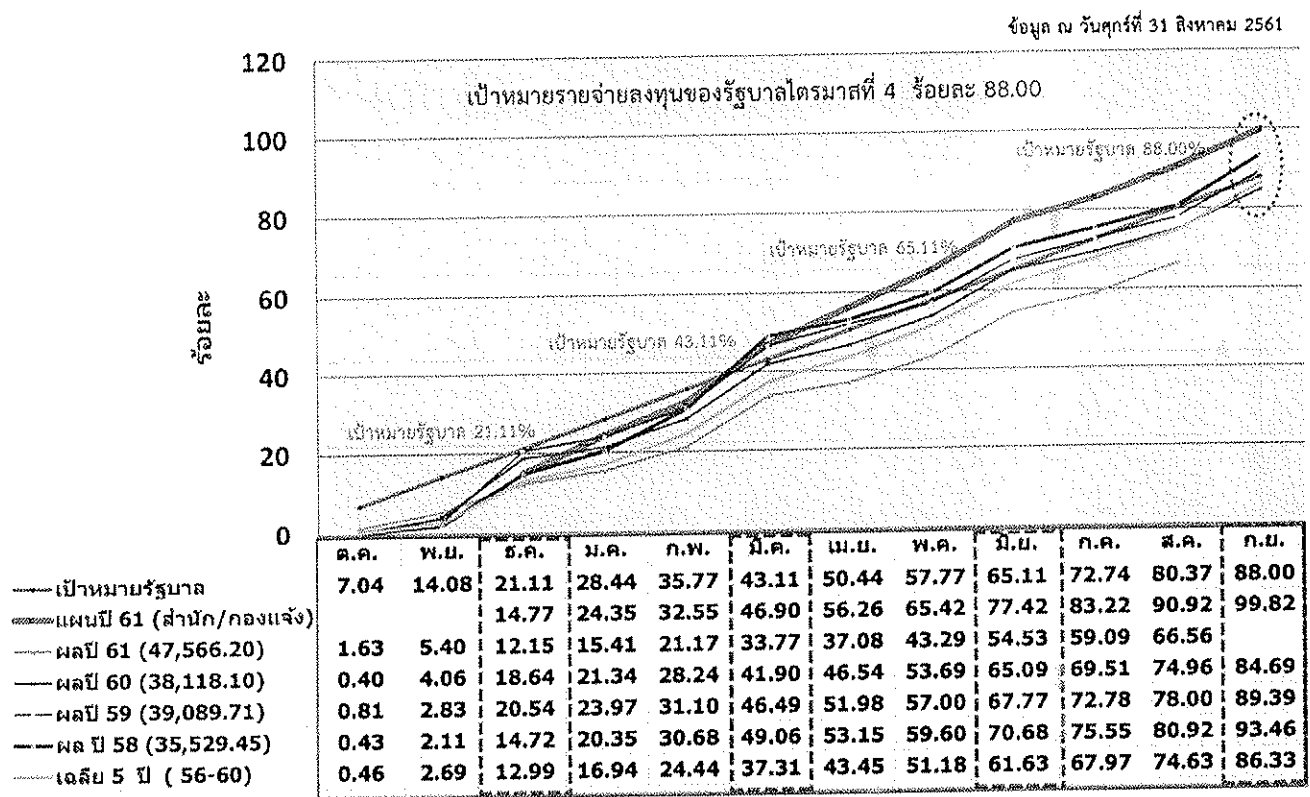

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 21.11 % ไตรมาสที่ 2 = 43.11 % ไตรมาสที่ 3 = 65.11 % ไตรมาสที่ 4 = 88.00 %


6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.61) ของสำนัก/กอง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.)

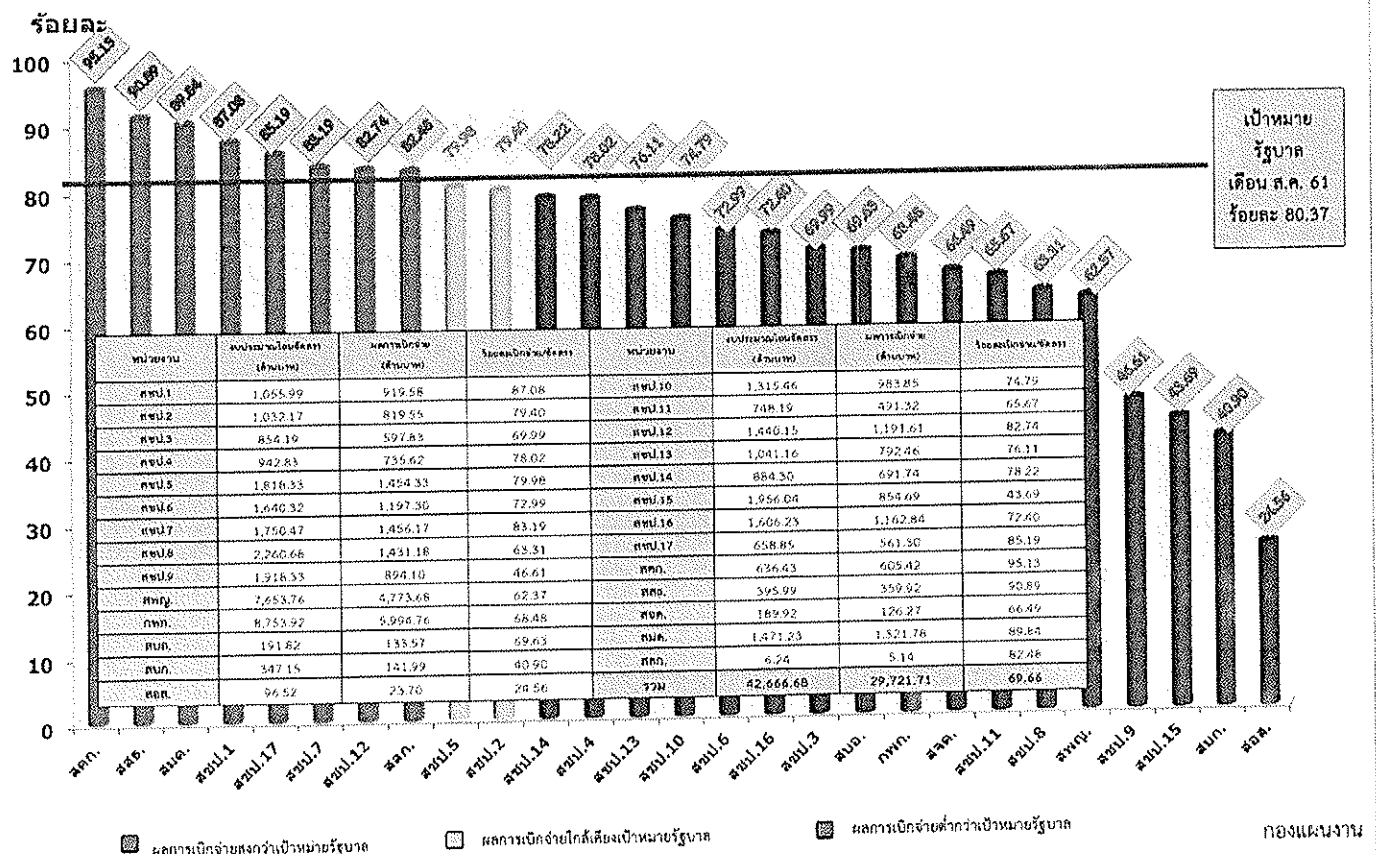


7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.)

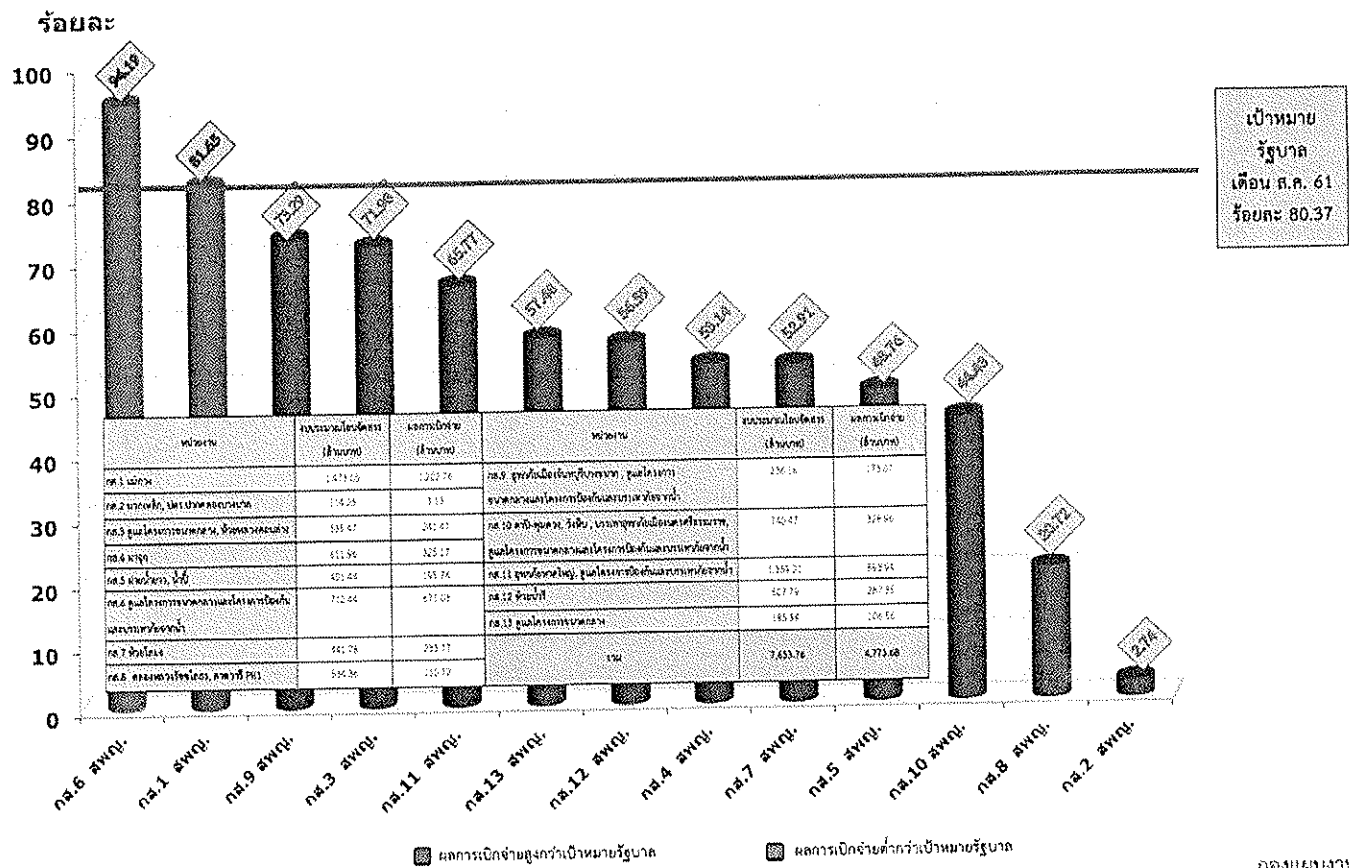

8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.)

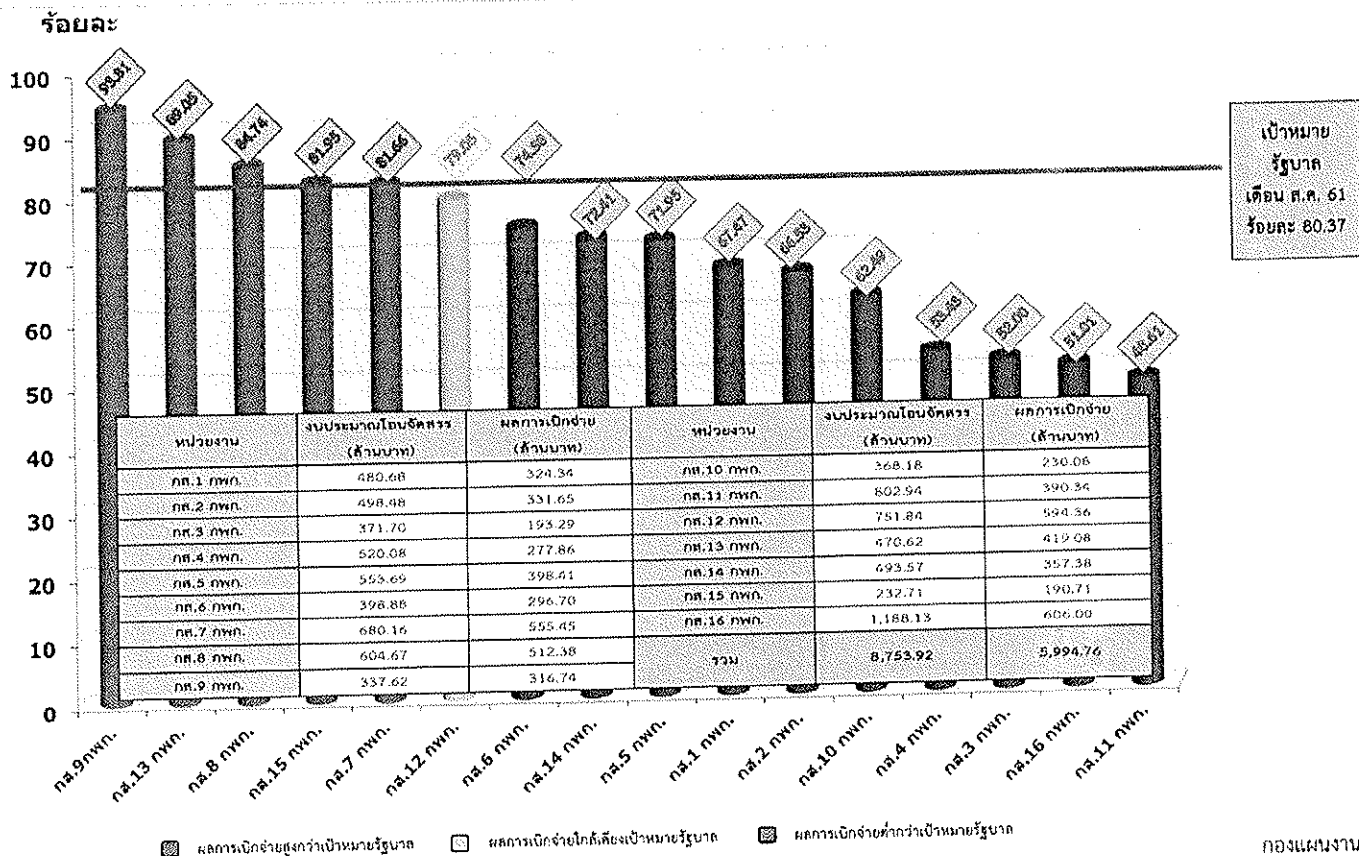

9. เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล เดือน ส.ค. 2561 (ร้อยละ 80.37)

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.

สำนัก/กอง ที่ตั้งเป้าหมาย สูงกว่าหรือเท่ากับ เป้าหมายรัฐบาล

1. สำนัก/กองที่เบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล

สคก.	▲ +14.76 %	สขป.17	▲ +4.82 %
สสธ.	▲ +10.52 %	สขป.7	▲ +2.82 %
สมค.	▲ +9.47 %	สขป.12	▲ +2.37 %
สขป.1	▲ +6.71	สคก.	▲ +2.11 %

2. สำนัก/กองที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล

สขป.5	▼ -0.39 %	กพก.	▼ -11.89 %
สขป.2	▼ -0.97 %	สจค.	▼ -13.88 %
สขป.14	▼ -2.15 %	สขป.11	▼ -14.70 %
สขป.4	▼ -2.35 %	สขป.8	▼ -17.06 %
สขป.13	▼ -4.26 %	สพญ.	▼ -18.00 %
สขป.10	▼ -5.58 %	สขป.9	▼ -33.76 %
สขป.6	▼ -7.38 %	สขป.15	▼ -36.68 %
สขป.16	▼ -7.97 %	สบก.	▼ -39.47 %
สขป.3	▼ -10.38 %	สอส.	▼ -55.81 %

สำนัก/กอง ที่ตั้งเป้าหมาย ต่ำกว่า เป้าหมายรัฐบาล

สำนัก/กองที่เบิกจ่าย	เป้าหมายรัฐบาล
สบอ.	▼ -10.74 %

10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
ระดับกระทรวง (ที่มีงบเกิน 10,000 ล้านบาท)				
1	กระทรวงศึกษาธิการ	45,674.29	35,892.49	78.58
2	กระทรวงคมนาคม (งบรายจ่ายลงทุนสูงสุด)	155,705.11	105,852.21	67.98
3	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (งบรายจ่ายลงทุนลำดับที่ 4)	54,342.11	36,444.77	67.07
4	กระทรวงสาธารณสุข	21,823.15	12,711.75	58.25
5	กระทรวงกลาโหม	56,890.22	30,368.07	53.38
6	กระทรวงมหาดไทย	57,221.74	28,321.14	49.49
7	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,521.53	6,854.06	47.20
ระดับกรม (คู่เทียบ)				
1	กรมทางหลวงชนบท	44,587.36	35,675.19	80.01
2	กรมชลประทาน	46,043.51	30,644.53	66.56
3	กรมทางหลวง	99,602.36	65,722.99	65.99
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	25,073.49	14,069.71	56.11

- หมายเหตุ :
- ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
 - ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 62.79 %
 - ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (44 หน่วยงาน) เฉลี่ย 61.70 %
