



# บันทึกข้อความ ส่วนที่สุค

วล.บอ. 4899/๒๕๖๒

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖  
ที่ กพง ๐๖/๑๐๙๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบ พ.ร.บ.)  
เรียน ผอ.ผง. งน 6768

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ จำแนกตามสายงาน และสำนัก/กอง

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าว และอัปโหลดข้อมูลบนเว็บไซต์ กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๖๗ รายการ ขอให้เร่งรัดการดำเนินการในการก่องหนี่และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบรายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ หากมีความก้าวหน้าให้เร่งบันทึกผลในระบบติดตามออนไลน์ให้เป็นปัจจุบันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ

(นางฐานิย์ จิรานิศาตร์)  
ผตบ.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)  
ผอ.ผง.

- ททท

- เร่งน ผอ.ส่วน., ผอ.ททท.

ศอ.อิมจททท.

  
(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ ๑ ๘ ก.ย. ๒๕๖๒




ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.)

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562



## รายละเอียดข้อมูล

### ประกอบด้วย

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสายงาน
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562
4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562
5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562
6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน
7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง
8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ  
ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสายงาน (ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2562)

สายงาน/สำนักงาน/กอง	งบประมาณ (ล้านบาท)			จำนวนรายการทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ (รายการ)			ยุติการดำเนินการ			ยุติทางดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ยอดคงค้าง		จำนวนรายการ	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	จำนวนรายการ (ล้านบาท)	พัสดุตกชั้น (รายการ)	จำนวน (ล้านบาท)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>56,618.83</b>	<b>50,826.26</b>	<b>39,767.00</b>	<b>8,177</b>	<b>267</b>	<b>619.72</b>	<b>264</b>	<b>1,875.05</b>	<b>7,646</b>	<b>54,124.06</b>	<b>267</b>	<b>146</b>	<b>153</b>	<b>320</b>	<b>1,751</b>	<b>5,009</b>	
บริหาร	3,955.55	4,398.56	4,307.77	713	2	-	17	4.44	694	3,961.11	19	9	14	15	45	592	
สมค.	3,120.97	3,296.89	3,227.13	69	-	-	-	-	69	3,120.97	6	2	3	1	22	35	
สคก.	844.58	1,092.24	1,074.71	637	-	-	17	4.44	620	840.14	10	7	11	14	23	555	
สคก.	-	9.43	5.93	7	2	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-	2	
<b>สงวนและสำรองรักษา</b>	<b>32,119.17</b>	<b>28,875.75</b>	<b>22,260.64</b>	<b>6,953</b>	<b>217</b>	<b>106.28</b>	<b>211</b>	<b>874.97</b>	<b>6,525</b>	<b>31,137.92</b>	<b>211</b>	<b>98</b>	<b>101</b>	<b>250</b>	<b>1,543</b>	<b>4,322</b>	
สขป.1	1,403.92	1,266.19	1,174.69	391	8	-	21	100.10	362	1,303.82	3	3	1	9	137	209	
สขป.2	1,560.81	1,354.80	1,100.11	336	9	9.00	27	291.47	300	1,260.34	19	3	-	9	100	169	
สขป.3	1,112.22	947.67	804.81	255	13	-	2	1.80	240	1,110.42	3	4	-	6	84	143	
สขป.4	1,255.17	974.55	781.67	309	16	48.71	2	8.29	291	1,198.17	9	6	4	9	40	223	
สขป.5	2,031.26	1,941.23	1,599.71	453	1	-	6	1.00	446	2,030.26	12	6	11	26	93	298	
สขป.6	2,477.98	2,106.26	1,766.08	483	6	-	10	-	467	2,477.98	7	10	15	25	80	330	
สขป.7	2,930.04	2,471.42	2,113.17	385	-	-	1	-	384	2,930.04	18	7	8	9	93	249	
สขป.8	3,006.12	2,299.03	1,426.28	520	12	-	14	201.77	494	2,804.35	39	14	14	27	69	331	
สขป.9	2,649.29	2,567.16	1,818.15	481	4	-	6	19.32	471	2,629.97	6	7	8	12	66	372	
สขป.10	1,943.15	1,665.67	1,386.90	470	52	-	-	-	418	1,943.15	16	5	7	20	78	292	
สขป.11	1,692.81	1,564.25	973.44	469	1	-	3	4.76	465	1,688.06	5	7	5	28	147	273	
สขป.12	1,983.20	1,951.84	1,628.02	457	-	-	6	7.51	451	1,975.69	22	9	8	17	92	303	
สขป.13	1,182.98	1,191.65	1,007.34	502	-	-	3	0.70	499	1,182.29	15	2	5	21	221	235	
สขป.14	2,097.03	2,210.63	1,367.93	326	58	-	1	-	267	2,097.03	17	2	5	11	52	180	
สขป.15	1,532.68	1,010.86	864.98	344	1	-	16	91.29	327	1,441.39	9	2	3	5	86	222	
สขป.16	1,923.71	1,786.69	1,471.70	367	9	-	-	-	358	1,923.71	1	-	2	2	59	294	
สขป.17	1,085.08	1,328.47	822.67	265	22	28.82	5	18.00	238	1,038.26	3	5	3	12	27	188	
สบอ.	251.71	237.38	152.99	140	5	19.75	88	128.97	47	102.99	7	6	2	2	19	11	
<b>ก่อสร้าง</b>	<b>19,327.21</b>	<b>16,325.81</b>	<b>12,491.68</b>	<b>404</b>	<b>21</b>	<b>92.93</b>	<b>29</b>	<b>917.85</b>	<b>354</b>	<b>18,316.42</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>152</b>	<b>54</b>	
พทก.	8,905.29	8,358.73	7,121.24	191	1	-	9	54.00	181	8,851.29	16	11	12	17	98	27	
พพญ.	10,420.22	7,915.79	5,341.23	196	19	92.93	19	863.85	158	9,463.44	14	28	19	27	45	25	
สจต.	1.70	51.29	29.20	17	1	-	1	-	15	1.70	-	-	-	4	9	2	
<b>วิชาการ</b>	<b>1,057.90</b>	<b>1,226.14</b>	<b>706.91</b>	<b>104</b>	<b>24</b>	<b>271.50</b>	<b>7</b>	<b>77.80</b>	<b>73</b>	<b>708.60</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	
สบก.	506.79	705.10	225.91	39	20	251.50	3	22.00	16	233.29	1	-	1	5	3	6	
สสб.	447.64	405.89	393.95	44	1	20.00	3	55.80	40	371.84	-	-	-	2	3	35	
สอต.	103.47	104.94	87.04	7	1	-	-	-	6	103.47	-	-	6	-	-	-	
พทล.	-	-	-	9	2	-	1	-	6	-	6	-	-	-	-	-	
สจพ.	-	10.21	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	
<b>หมายเหตุ : งบล่าช้า</b>	<b>149.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>149.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

หมายเหตุ : 1. รายการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นรายการที่วางการโอนเปลี่ยนแปลงงบจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มีค่าเงินการ

2. งบประมาณ (พ.ร.บ.) รวมรายการที่มาจากกรโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มีค่าเงินการ


## 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึ่งงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามผลิตภัณฑ์ (ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2562)

ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน					อัตราการดำเนินงาน (รายการ)							
	งบประมาณ	งบประมาณ ที่สร้างพัสดุ	เบิกจ่าย	จำนวน รายการ พึ่งพิง	ส่งมอบเงินการ		ชำระหนี้เงินจ้าง		ทำสัญญาทัน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	อัตราการดำเนินงาน (รายการ)					
					จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
<b>รวม</b>	<b>56,618.83</b>	<b>50,826.26</b>	<b>39,767.00</b>	<b>8,177</b>	<b>267</b>	<b>620</b>	<b>264</b>	<b>1,875.05</b>	<b>7,646</b>	<b>54,124.06</b>	<b>267</b>	<b>146</b>	<b>153</b>	<b>320</b>	<b>1,751</b>	<b>5,009</b>
ผลผลิตโครงการน้ำชลประทาน	1,507.37	1,431.59	1,217.53	1,232	6	15	57	136.74	1,169	1,355.88	20	10	11	68	386	674
ผลผลิตโครงการเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,279.37	1,908.94	1,321.22	609	31	9	9	8.10	569	1,262.27	11	11	8	33	133	373
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	6,065.68	4,691.28	2,558.80	668	59	78	20	217.53	589	5,770.61	99	31	15	20	70	354
แผนงานบูรณาการพื้นที่ชนบทที่ระดับภาค	7,442.87	6,689.93	5,079.05	445	71	-	11	4.92	363	7,437.95	24	10	17	36	142	134
ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	9,884.01	9,827.92	8,633.80	4,215	55	225	120	179.95	4,040	9,479.06	46	29	48	85	693	3,139
ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน	15,668.96	14,518.78	12,579.37	497	24	81	18	324.30	455	15,244.16	21	20	27	27	223	137
ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,242.67	5,201.23	3,884.46	269	10	100	6	150.14	253	5,992.54	28	14	17	28	70	96
ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ	264.64	171.20	76.11	97	-	-	1	0.66	96	263.98	7	2	-	3	7	77
ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	174.93	266.19	265.63	99.79	7	2	3	-	5	171.93	-	-	-	2	3	-
ผลผลิตโครงการบรรเทาภัยกับเขื่อนชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	120.00	91.97	81.09	88.16	2	-	-	-	2	120.00	-	-	-	-	2	-
ผลผลิตโครงการบรรเทาภัยกับเขื่อนชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	100.00	318.13	261.09	82.07	2	-	-	-	2	100.00	-	-	-	-	1	1
ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งเสือเต้น	1,632.87	1,414.62	950.53	67.19	23	-	5	-	18	1,632.87	3	5	2	1	6	1
จังหวัดเชียงใหม่																
ผลผลิตโครงการล่องระบอบน้ำหลาก บางบลด-บางไพร	250.00	348.63	197.20	56.56	4	-	1	-	3	250.00	-	1	1	-	-	1
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา																
ผลผลิตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	233.98	301.80	231.78	76.80	2	-	-	-	2	233.98	-	-	1	-	-	1
ผลผลิตโครงการเชื่อมทตนาภาคอุบลราชธานี	820.55	915.42	542.89	59.30	19	-	1	0.58	18	819.96	1	2	2	2	4	7
ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	413.30	122.90	97.20	79.09	9	-	-	-	9	413.30	-	3	-	2	2	2
ผลผลิตโครงการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี	413.13	290.53	209.91	72.25	15	-	-	-	15	413.13	1	1	2	4	3	4
ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	188.70	113.55	58.60	51.61	9	1	40	43.99	3	104.72	1	1	-	1	-	-
ผลผลิตโครงการบรรเทาภัยกับเขื่อนศรีนครินทร์รวมจาก	1,045.36	209.16	166.35	79.54	13	7	4	657.66	2	317.77	-	2	-	-	-	-
พระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช																
ผลผลิตโครงการบรรเทาภัยกับอ่างหอนใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	1,503.02	751.16	432.87	57.63	14	1	5	141.48	8	1,361.53	1	1	2	4	-	-
ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	701.91	783.78	604.75	77.16	16	-	-	-	16	701.91	2	3	-	2	5	4
จังหวัดอุตรดิตถ์																
ผลผลิตโครงการระบบบำบัดน้ำเสียโรงบำบัดน้ำเสียเมืองมาจกพระราชดำริ	650.51	435.36	303.76	69.77	8	-	-	-	8	650.51	2	-	-	1	1	4
อำเภอเขียงคาบ จังหวัดลย																
ผลผลิตโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด	35.00	22.19	13.01	58.64	2	-	1	9.00	1	26.00	-	-	-	1	-	-

หมายเหตุ : 1. รายการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นรายการที่รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ จำนวน 1,182 รายการ งบประมาณ 5,189.47 ล้านบาท  
 2. งบประมาณ (พ.ร.บ.) รวมรายการที่รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ

### 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 16 กันยายน 2562)

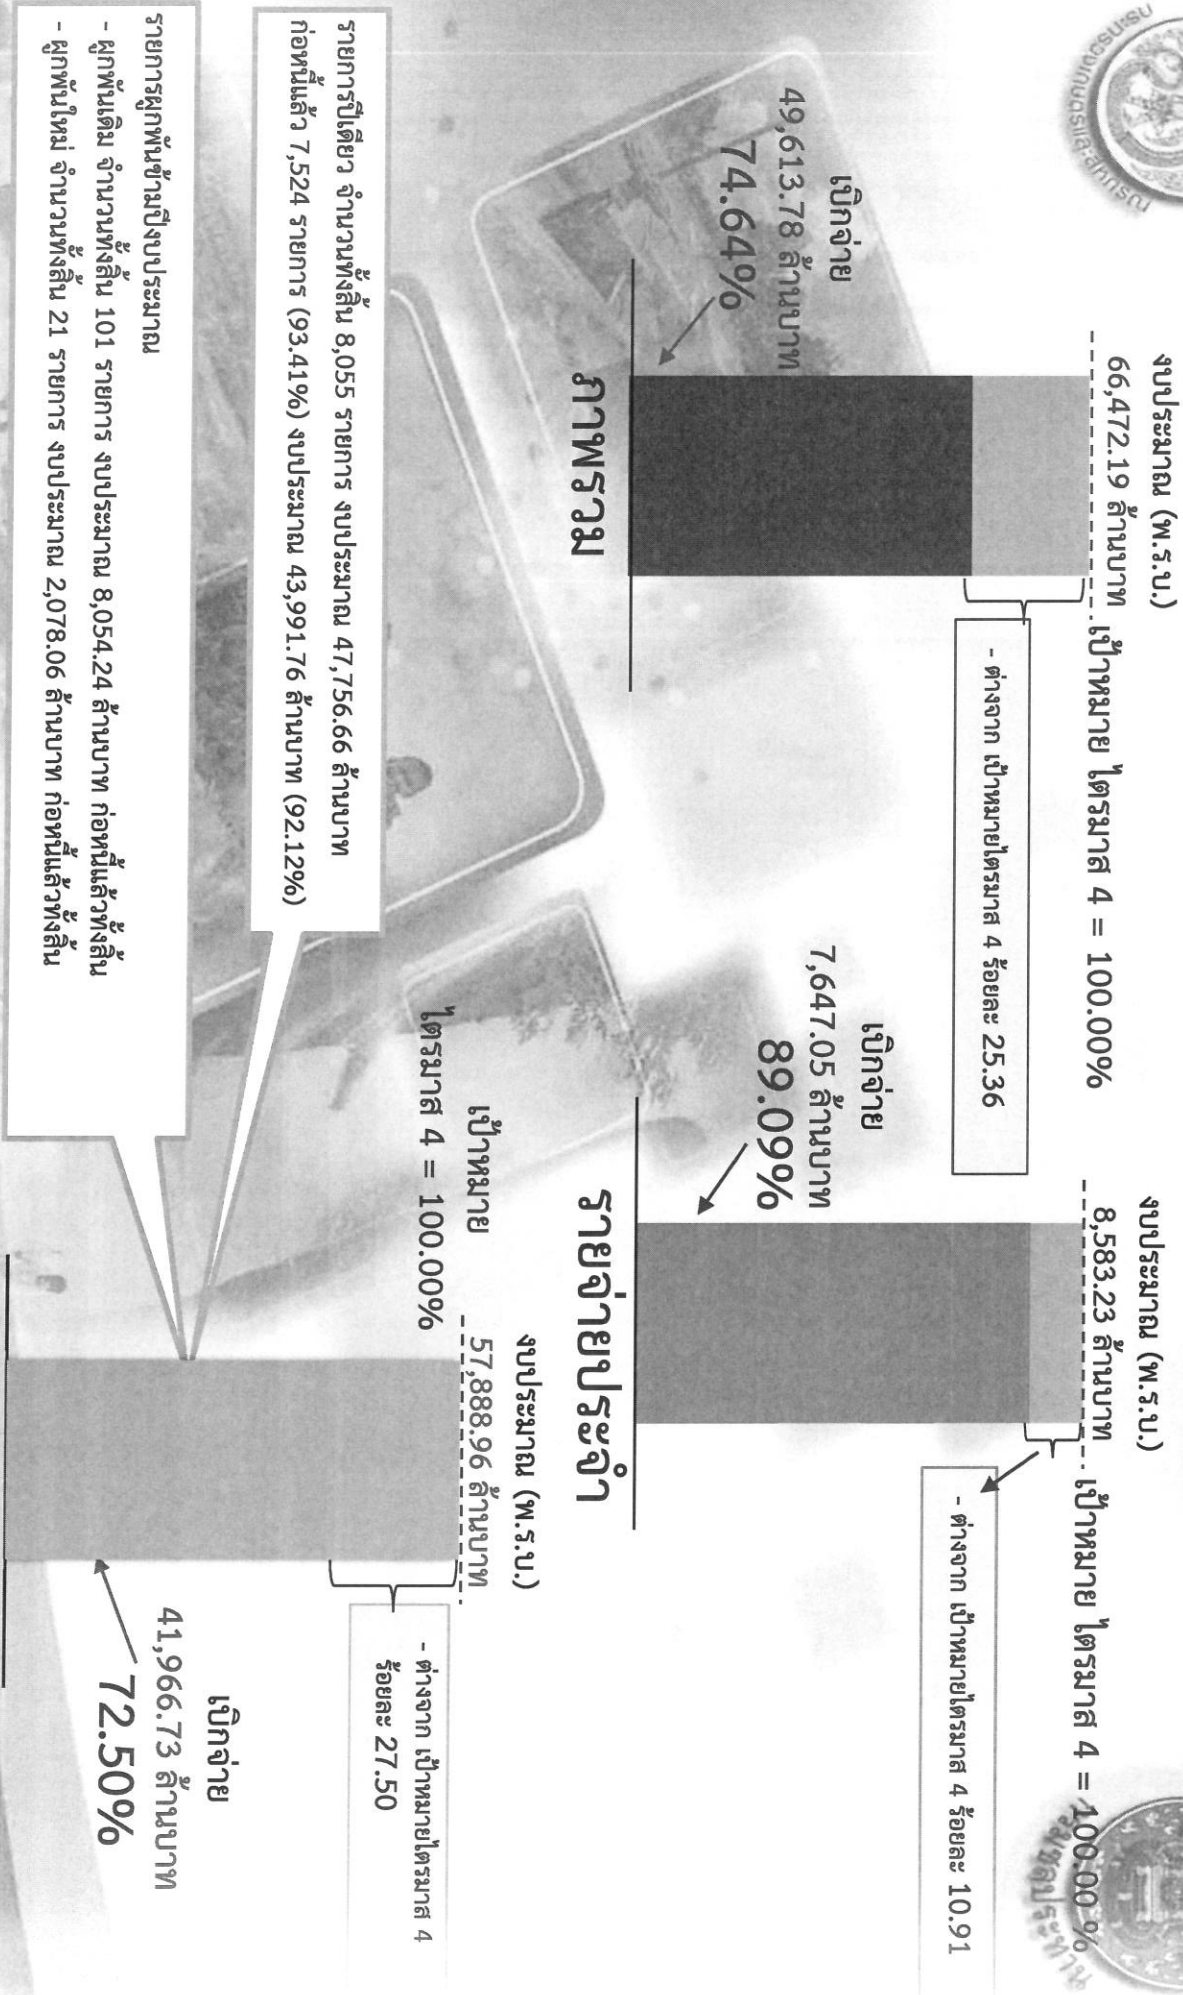


รายการผูกพันซึ่งเป็นประมาณ

- ผู้กัณฑ์เดิม จำนวนทั้งสิ้น 101 รายการ งบประมาณ 8,054.24 ล้านบาท ก่อหนี้แล้วทั้งสิ้น
- ผู้กัณฑ์ใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ งบประมาณ 2,078.06 ล้านบาท ก่อหนี้แล้วทั้งสิ้น

#### 4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562



ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2562

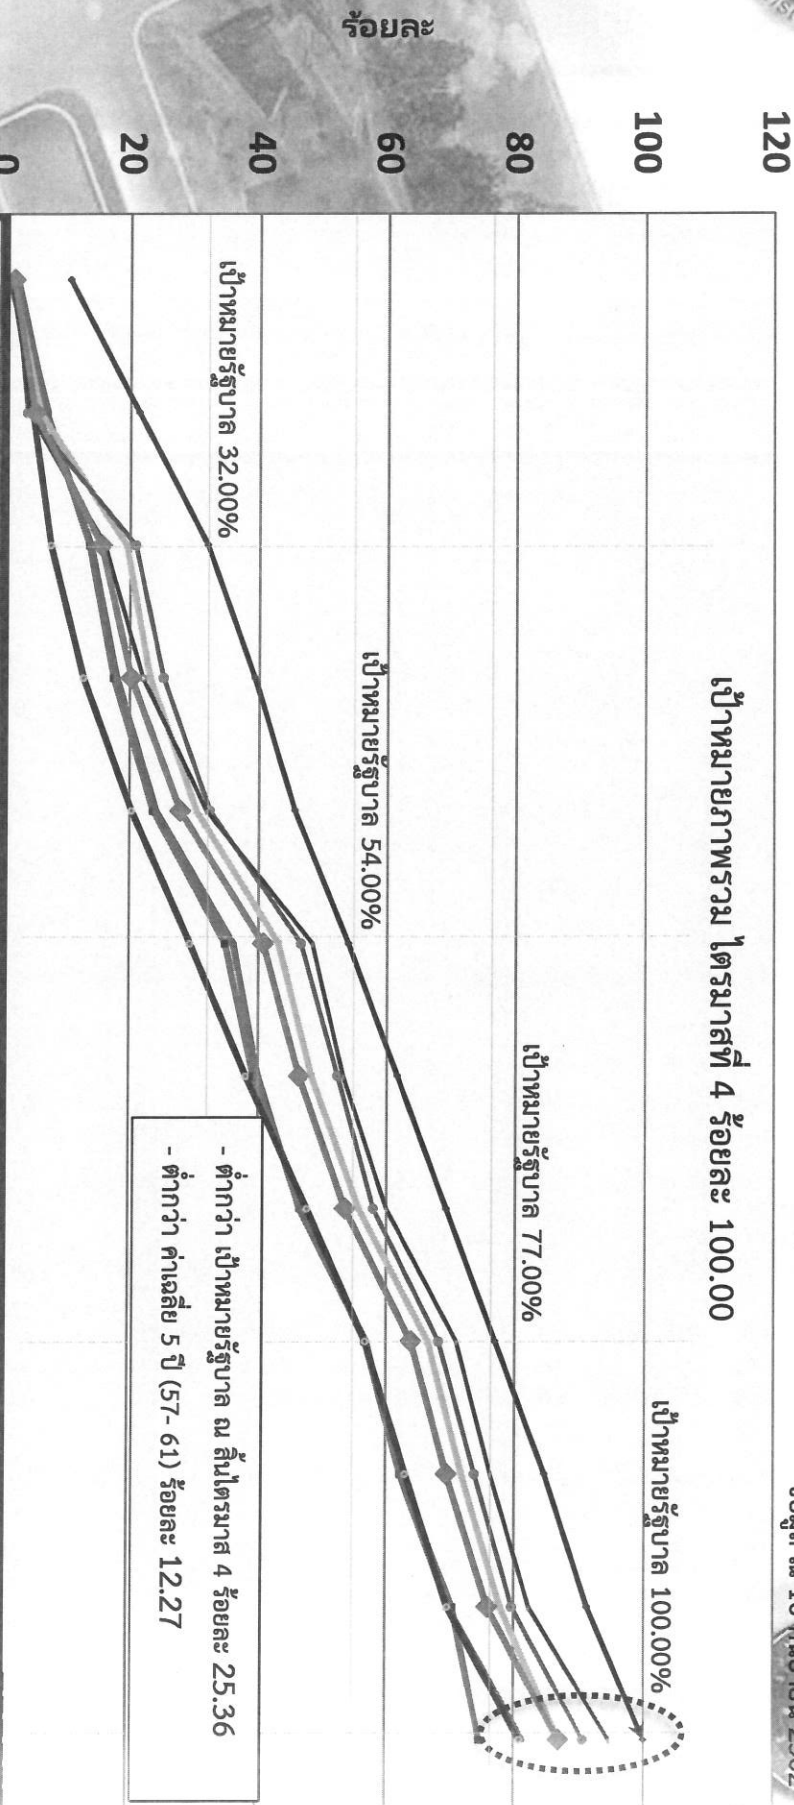


ไตรมาส	10.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
← แผนปี 62	10.66	21.33	32.00	39.33	45.66	54.00	61.66	69.32	77.00	84.66	91.32	100.00
— ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	74.64
— ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
— ผลปี 60 (47,004.27)	1.50	5.94	19.46	23.11	30.30	43.12	48.35	55.72	66.56	71.83	77.86	86.95
— ผลปี 59 (46,708.92)	2.04	3.91	20.86	25.19	32.46	46.68	52.40	58.02	68.24	73.86	79.68	90.69
— ผลปี 58 (43,054.76)	1.76	4.21	16.07	22.04	31.89	48.43	53.28	60.04	71.00	76.28	82.33	94.64
— ผลปี 57 (40,094.61)	1.54	4.73	7.67	12.82	20.33	29.41	38.14	47.74	56.80	63.13	69.69	80.86
เฉลี่ย 5 ปี (57-61)	1.84	5.14	15.60	20.23	27.81	40.75	46.43	53.62	63.91	69.48	75.89	86.91

5. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562



ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

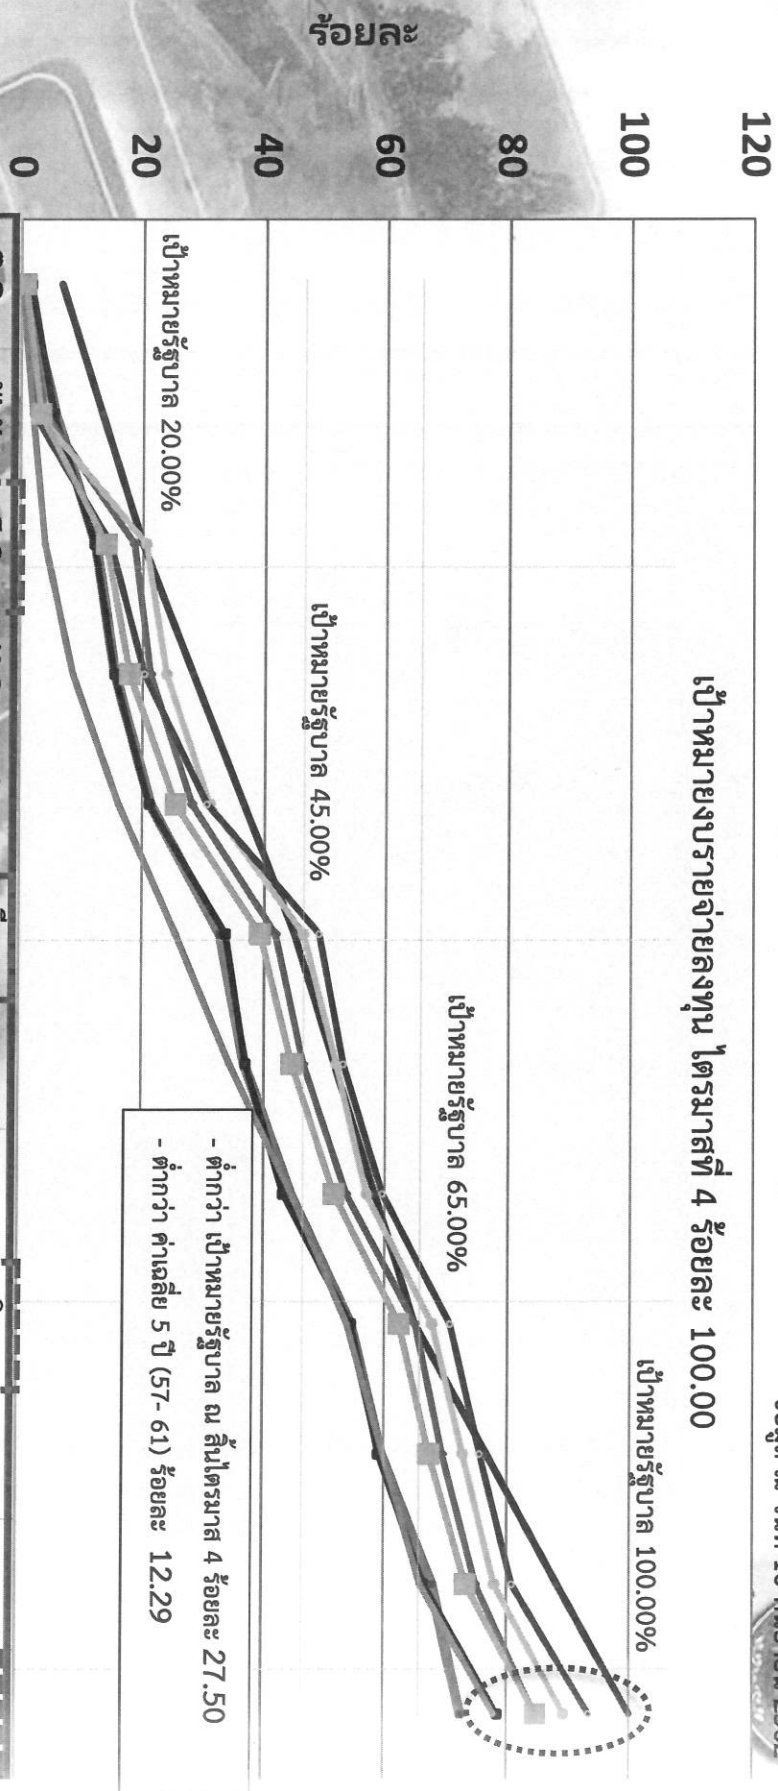


-ต่ำกว่า เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 27.50  
-ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 5 ปี (57- 61) ร้อยละ 12.29

	ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนปี 62	6.66	13.32	20.00	28.33	36.66	45.00	51.66	58.33	65.00	76.66	88.32	100.00
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	72.50
ผลปี 61 (47,566.20)	1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
ผลปี 60 (38,118.10)	0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69
ผลปี 59 (39,089.71)	0.81	2.83	20.54	23.97	31.10	46.49	51.98	57.00	67.77	72.78	78.00	89.39
ผลปี 58 (35,529.45)	0.43	2.11	14.72	20.35	30.68	49.06	53.15	59.60	70.68	75.55	80.92	93.46
ปี 57 (32,368.05)	0.11	1.98	4.03	8.65	16.16	25.57	34.51	44.61	53.89	59.81	66.04	77.92
เฉลี่ย 5 ปี (51)	0.68	3.28	14.02	17.94	25.47	39.36	44.65	51.64	62.39	67.35	73.30	84.79



6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง จำนวนตามสายงาน  
(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2562)

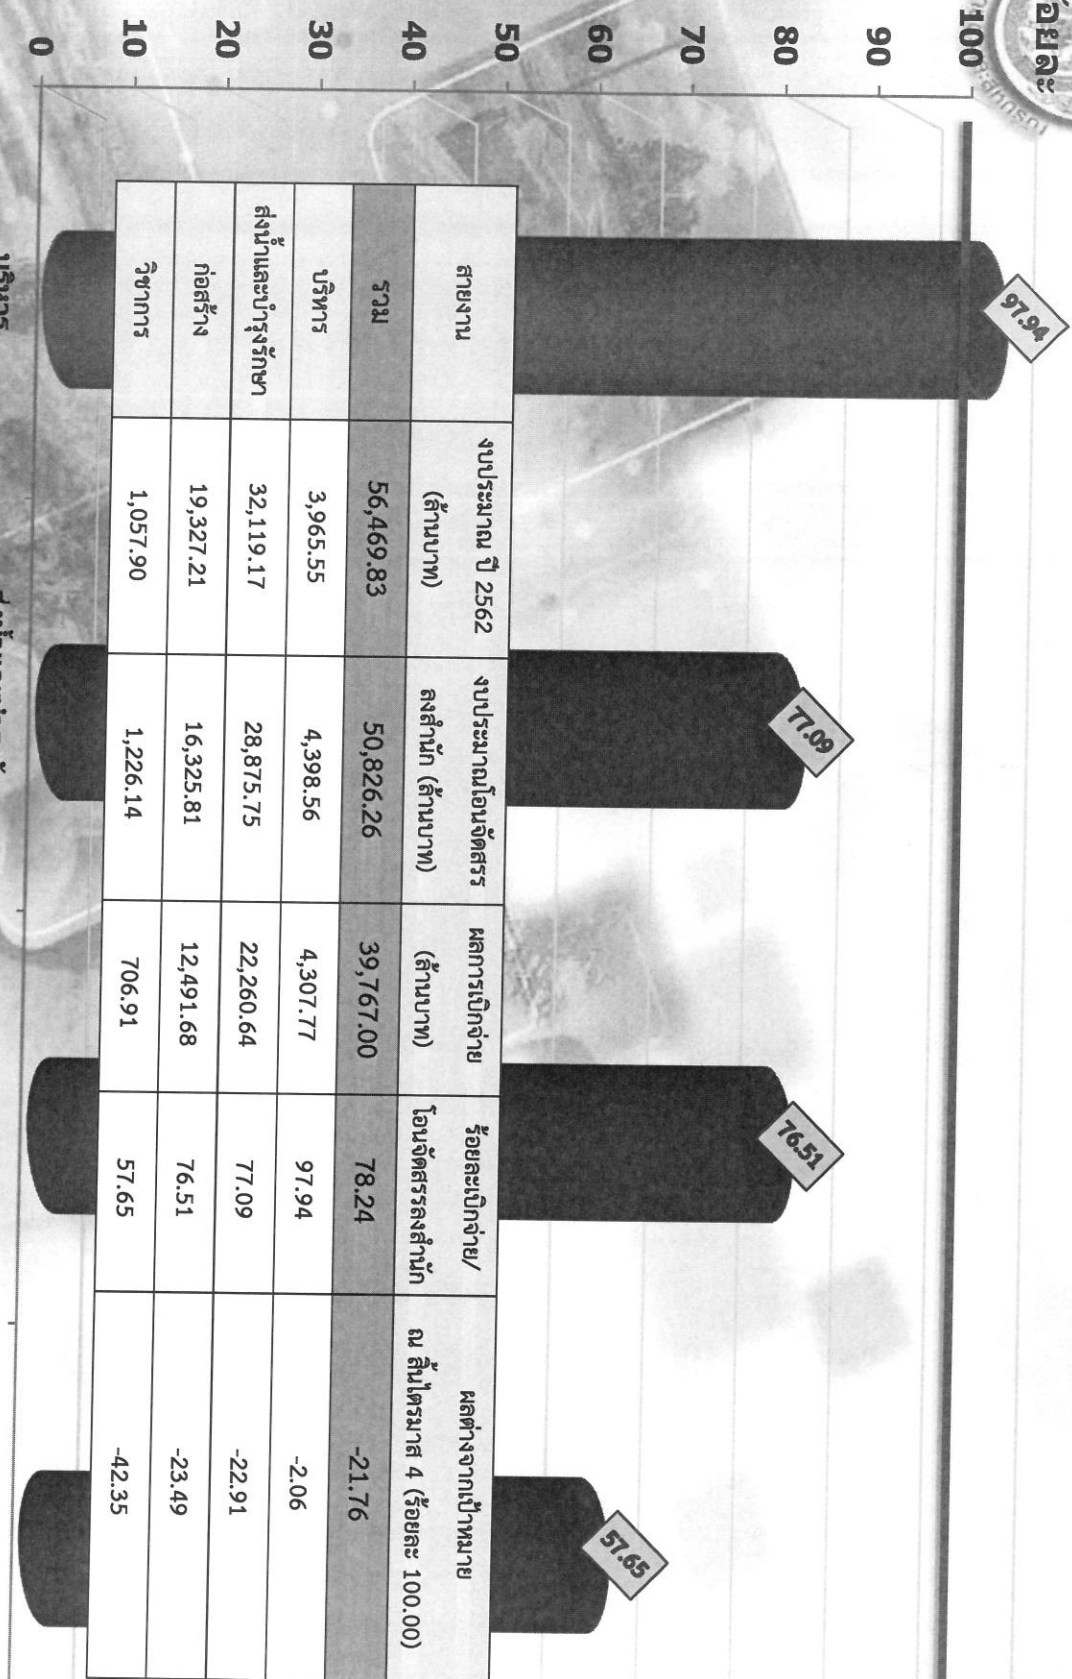

เป้าหมาย  
ณ สิ้นไตรมาส 4  
ร้อยละ 100.00

บริหาร  ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

ส่งน้ำและบำรุงรักษา  ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

ก่อสร้าง  ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล


วิชาการ  ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

หมายเหตุ : 1. งบประมาณปี 2562 ยังไม่รวมงบล่าช้า จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 149.00 ล้านบาท  
2. รายการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มาจากภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก  
มาดำเนินการ จำนวน 1,182 รายการ งบประมาณ 5,189.47 ล้านบาท



# 8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2562)




หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	หน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
กส.1 แม่เมาะ	1,387.49	936.08	กส.9 อุทกภัยเมืองจันทบุรีบางซอก, อุบลโครงการ	291.97	283.97
กส.2 ฆากเหล็ก, ปตร.ป่าทอของบางบาล	421.73	215.04	กส.10 คาบิ-หุบควง, รั้งหีบ, บร.ระกุกุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช,	470.87	427.51
กส.3 อุบลโครงการขนาดกลาง, ผู้ช่วยลงจดตอนล่าง	925.90	561.06	กส.11 อุทกภัยหาคดใหญ่, อุบลโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	909.94	490.81
กส.4 ผาสุก	904.57	532.04	กส.12 หัวน้สี	1,218.21	907.58
กส.5 ฝายน้ำขาว, น้สี	246.87	200.17	กส.13 อุบลโครงการขนาดกลาง	190.93	108.94
กส.6 อุบลโครงการขนาดกลางและโครงการป้องกัน	338.98	291.58	รวม	7,915.79	5,341.23
กส.7 หัวน้สี	288.73	208.11			
กส.8 คลองหลวงรัชชโยธิน, ลาดยาวี PR1	319.59	178.35			

ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

# 9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2562)



หน่วยงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	หน่วยงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
กส.1 ทพท.	284.41	201.51	กส.10 ทพท.	259.15	254.23
กส.2 ทพท.	498.17	442.65	กส.11 ทพท.	449.03	227.36
กส.3 ทพท.	314.20	222.50	กส.12 ทพท.	334.77	242.68
กส.4 ทพท.	184.74	163.11	กส.13 ทพท.	203.51	202.51
กส.5 ทพท.	473.41	432.16	กส.14 ทพท.	700.45	635.71
กส.6 ทพท.	942.88	861.02	กส.15 ทพท.	457.12	391.88
กส.7 ทพท.	809.43	803.69	กส.16 ทพท.	1,275.48	964.82
กส.8 ทพท.	421.89	341.00	รวม	8,358.73	7,121.24
กส.9 ทพท.	750.07	734.38			

ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

# 10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ			
	<b>ระดับกระทรวง (ที่มีงบเกิน 10,000 ล้านบาท)</b>									
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	65,357.51	47,354.03	72.45	54,232.42	38,531.69	71.05	1.40		
2	กระทรวงคมนาคม	166,804.59	116,475.36	69.83	155,686.12	110,667.26	71.08	-1.25		
3	กระทรวงมหาดไทย	62,517.00	35,598.26	56.94	57,178.96	30,170.81	52.77	4.17		
	<b>ระดับกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>									
1	กรมพัฒนาที่ดิน	2,962.69	2,505.05	84.55	2,985.18	2,586.42	86.64	-2.09		
2	กรมชลประทาน	57,888.96	41,966.73	72.50	45,866.46	32,568.11	71.01	1.49		
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,320.10	628.42	47.60	1,334.74	691.68	51.82	-4.22		
	<b>ระดับกรม (คู่เทียบ)</b>									
1	กรมทางหลวงชนบท	45,063.65	35,978.91	79.84	44,586.86	37,401.06	83.88	-4.04		
2	กรมชลประทาน	57,888.96	41,966.73	72.50	45,866.46	32,568.11	71.01	1.49		
3	กรมทางหลวง	111,174.84	75,040.24	67.50	99,589.14	67,966.78	68.25	-0.75		
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	24,487.59	14,686.37	59.97	25,073.49	15,148.38	60.42	-0.45		

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 63.76%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (44 หน่วยงาน) เฉลี่ย 63.10%

## รายการที่ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	จัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
	<b>รวม 267 รายการ</b>				<b>1,990,873,138</b>	<b>778,470,546</b>	
1	(1.4.4) บำรุงรักษาประปาโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161640 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	13,163,700		
2	(1.4.6) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดการน้ำโดยความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161642 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	144,000	144,000	
3	(1.4.8) บำรุงรักษาโทรมาตรน้ำถาวร 120 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161644 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	1,440,000	1,440,000	
4	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รายการเพิ่มเติม3) - [ 174886 ]	สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	8,667,000	7,017,000	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
5	ปรับปรุงระบบงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง4) - [ 175551 ]	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	1,961,900		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
6	โครงการพัฒนาข้อมูลโครงการ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและงบประมาณ (โอนเปลี่ยนแปลง4) - [ 175552 ]	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	3,991,100		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
7	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและเก็บกักน้ำ ภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จำนวน 1 สาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174998 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,500,000	3,500,000	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
8	ซ่อมแซมและปรับปรุงลานจอดรถบริเวณที่ทำการศูนย์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175029 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,200,000	1,200,000	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
9	ซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 8 ครอบครัว พร้อมอาคารประกอบ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175030 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,319,000	1,319,000	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175031 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,450,000	1,450,000	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
11	ซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างอาคารภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175032 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	920,000	920,000	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
12	อ่างเก็บน้ำบ้านป่าตั้งงาม (อ่างเก็บน้ำห้วยกอลง) พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) จังหวัดลำพูน (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174973 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,880,000	9,880,000	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
13	(1.14) ฝ่ายห้วยปิงพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอปกาสัย จังหวัดน่าน - [ 161736 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,000,000		
14	โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านน้อยห้วย บ้านน้อยห้วย ตำบลเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174983 ]	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานสกลนคร	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	56,912,900	56,064,120	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
15	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำข้ามลำห้วย กม.0+300 ถึง กม.0+330 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง (หินขุด) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174964 ]	สำนักงานชลประทานที่ 6		ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,319,745		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
16	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโรงเรียนบ้านไธเส อ.นื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175034 ]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	644,000	637,700	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
17	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยาปี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175554 ]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,800,000	9,800,000	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
18	อาคารทดน้ำคลองขุดนานปาเสม็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175553 ]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	7,522,000	7,522,000	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
19	ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสายที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175555 ]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,900,000	9,900,000	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
20	ปรับปรุงท่อลอดคันคลองปาเสม็ดฝั่งขวา กม.5+050,7+800 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175556 ]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,667,000	4,667,000	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
21	ซ่อมเสริมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย 1 ขวา (เกาะสะท้อน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175557 ]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,600,000	5,600,000	รายการโอนเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	จัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
216	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศปรับปรุงคลองชุมชนพร้อมอาคารประกอบ ช่วงปากคลองฉันทน์ถึงจุดบรรจบคลองนาคราช โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ชุดออกคลองฉันทน์น้ำท่วมคลองชุมพร) ตำบลวังไผ่,บ้านนา,ตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175283 ]	สำนักงานชลประทานที่ 14		ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	495,500		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
217	ซ่อมแซมเขตรอกคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1R-MC (ด้วยแรงคน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธารโนค-กระแสน้ำ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175189 ]	สำนักงานชลประทานที่ 16		ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	165,000		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
218	ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ปตร.หารอ่างทอง (โครงการพัฒนาอุโมงค์น้ำย่อยพุด) โครงการชลประทานพิบูลย์ ตำบลคอนประจักษ์ อำเภอปากพะยูนี่ จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175190 ]	สำนักงานชลประทานที่ 16		ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,988,126		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
219	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งบุรีคุณ จังหวัดสตูล (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 173226 ]	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	7,000,000		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
220	ก่อสร้างระบบโทรมาตรเหนือเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 173260 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา		ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,493,400		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
221	(1.3) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [ 163073 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	5,000,000	5,000,000	
222	(19) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร - [ 163158 ]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	220,000,000	191,728,091	
223	(31) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ - [ 167342 ]			ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	33,000,000		
224	(32) ค่าปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการชลประทาน - [ 167343 ]			ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	16,000,000		
225	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงา อำเภอวัง จังหวัดลำปาง (หน่วยงานและอาคารประกอบ) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175318 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	977,100	977,100	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
226	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อย 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านฮ้อย อำเภอวัง จังหวัดลำปาง (ระบบชลประทานและอาคารประกอบ) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175319 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	933,800	933,800	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
227	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (หน่วยงานและอาคารประกอบ) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175320 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	739,700	739,700	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
228	ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (หน่วยงานและอาคารประกอบ) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175327 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,432,400	1,432,400	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
229	ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (หน่วยงานและอาคารประกอบ) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175329 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	973,400	973,400	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
230	ค่าซื้อที่ดิน ค่าถมดิน ค่ารั้อยในการจัดหาที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการฝ่ายราชโกล (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175314 ]	สำนักงานชลประทานที่ 6		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	731,360		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
231	แก้มลิงบ้านซากา จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175295 ]	สำนักงานชลประทานที่ 8		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	4,756,864		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
232	แก้มลิงหนองควายตาย จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175296 ]	สำนักงานชลประทานที่ 8		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	8,827,093		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
233	ค่าซื้อที่ดิน ค่าถมดิน ค่ารั้อยในการจัดหาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษโครงการฝ่ายราชโกล (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175312 ]	สำนักงานชลประทานที่ 8		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,064,640		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
234	ค่าซื้อที่ดิน ค่าถมดิน ค่ารั้อยในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุรินทร์โครงการฝ่ายราชโกล (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175313 ]	สำนักงานชลประทานที่ 8		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	7,897,873		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
235	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมันปลา จังหวัดปราจีนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175305 ]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	25,610,500	25,143,300	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
236	แก้มลิงทุ่งป่ายู จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [ 174686 ]	สำนักงานชลประทานที่ 14		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	19,667,300		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
237	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศโครงการพระราชดำริค่ายพระราม 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175323 ]	สำนักงานชลประทานที่ 14		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	143,300		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
238	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศโครงการพระราชดำริค่ายพระราม 6 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175324 ]	สำนักงานชลประทานที่ 14	ส่วนวิศวกรรม สขบ.14	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	131,800		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
239	แก้มลิงบ้านกือเต ปริมาณเก็บกักน้ำ 52,800 ลบ.ม. จังหวัดยะลา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175315 ]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	9,938,000	9,843,000	รายการโอนเปลี่ยนแปลง
240	ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5.46 กม. และอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [ 174690 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 6	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	80,000,000		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
241	(5) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [ 167272 ]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	20,000,000	18,500,000	
