



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๙๘๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)

พ.ม. 1054A

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

-ทราบ

โยธิน ผอ.จวน., ผอ.ร.ทค., ทน.๑-๙ มอ.

และ ผมท.มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณจำนวน 5 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 96,462.72 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 15,571.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.14 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 13,271 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 598 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.50 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1,538 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.59 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 10,006 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75.40 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,019 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.68 และยกเลิก จำนวน 110 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.83 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 77,494.48 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 10,841.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.99 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 6,961.06 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,559.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.40 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 70,533.42 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 9,281.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.16 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 10,065 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.11 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1,105 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.98 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 8,840 รายการ คิดเป็นร้อยละ 87.83 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.03 และยกเลิก จำนวน 106 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.05 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้น

2. งบเงินกู้เบิกเหลิ้มปี พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 2,542.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.17 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 9,467.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.83 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,015 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 727 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.62 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 286 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.18 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.20 คือ ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

3. งบกลาง พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 4,896.45 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 2,127.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.45 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,087 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.55 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 353 รายการ คิดเป็นร้อยละ 32.48 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 726 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.79 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.18 คือ ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำบ้านหนองขาม โครงการชลประทานสุพรรณบุรี และซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำบ้านจิกรากข้า โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เนื่องจากเมื่อตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายพบว่ามูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 1,026.97 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 0.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,012 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 586 รายการ คิดเป็นร้อยละ 57.90 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 422 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.70 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.40

5. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 1,035.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 59.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.74 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 92 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.09 คือ ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โคกกะเทียม ระยะที่ 1 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.43 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 86 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.48



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดทำโดย
ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565



รายละเอียดข้อมูล

1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566

2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566


2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

3 งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566





รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	96,462.71	15,571.00	16.14	13,271	598	1,538	10,006	1,019	ยกเลิก 110 รายการ
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (กรมบัญชีกลาง)	77,494.48	10,841.36	13.99	10,065	11	1,105	8,840		
1.1 งบรายจ่ายประจำ	6,961.06	1,559.55	22.40						
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	70,533.42	9,281.80	13.16	10,065	11	1,105	8,840	3	ยกเลิก 106 รายการ
2. งบเงินกู้ยืมเบิกเหลือปี พ.ศ. 2563	12,009.81	2,542.45	21.17	1,015			727	286	ยกเลิก 2 รายการ
3. งบกลาง พ.ศ. 2565	4,896.45	2,127.50	43.45	1,087		6	353	726	
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	3,872.34	1,539.88		1,036		6	318	710	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565	1,126.19	1,034.34	91.84	620			19	599	ยกเลิก 2 รายการ
- จัดหารถปั้นจั่นลอยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกปรับไปตามกฎหมาย	97.92	97.92	100.00	1				1	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566	1,137.66	390.78	34.35	407			297	110	
- โครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาคูทกภัยและภัยแล้ง	663.88			3		3			
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพิ่มเติม	190.14	16.84	8.86	4		2	2		
- โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง	656.55			1		1			
3.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565	1,024.11	587.62	57.38	51			35	16	
4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565	1,026.97	0.23	0.02	1,012	586	422		4	
5. จัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565	1,035.00	59.46	5.74	92	1	5	86		



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

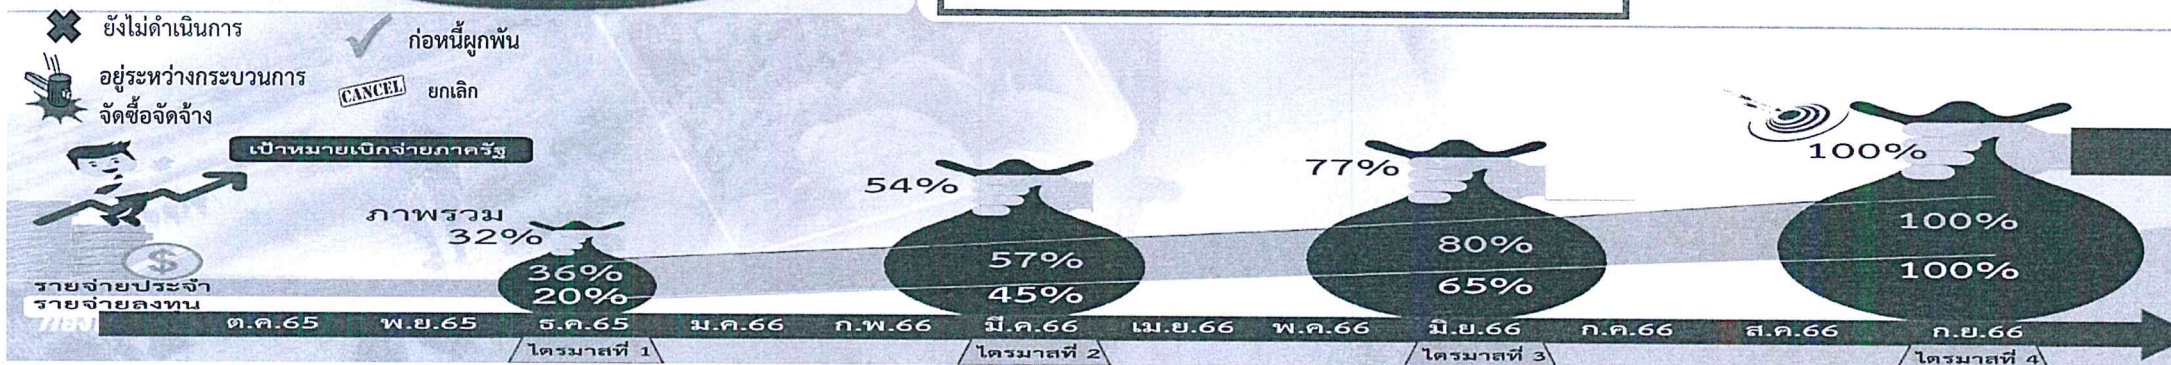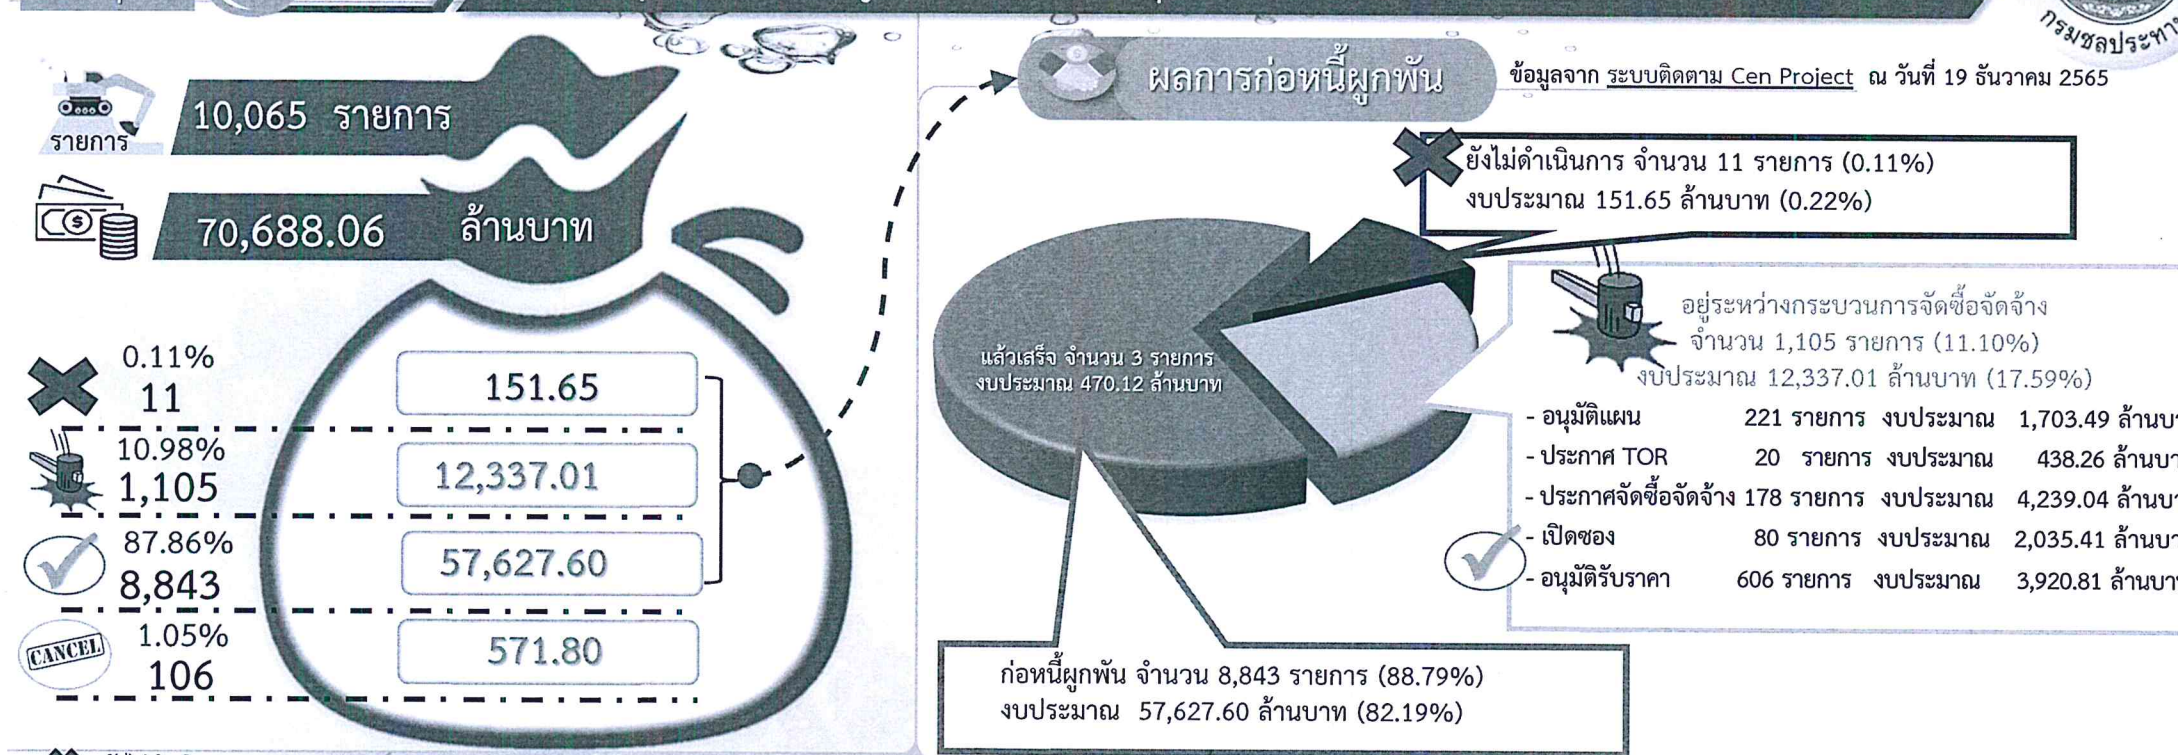

สรุปผลการก่อกำหนดแผน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง


- ส่วนกลาง

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 19 ธ.ค. 65

หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวม

การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการภายในวันที่ 14 ต.ค. 2565

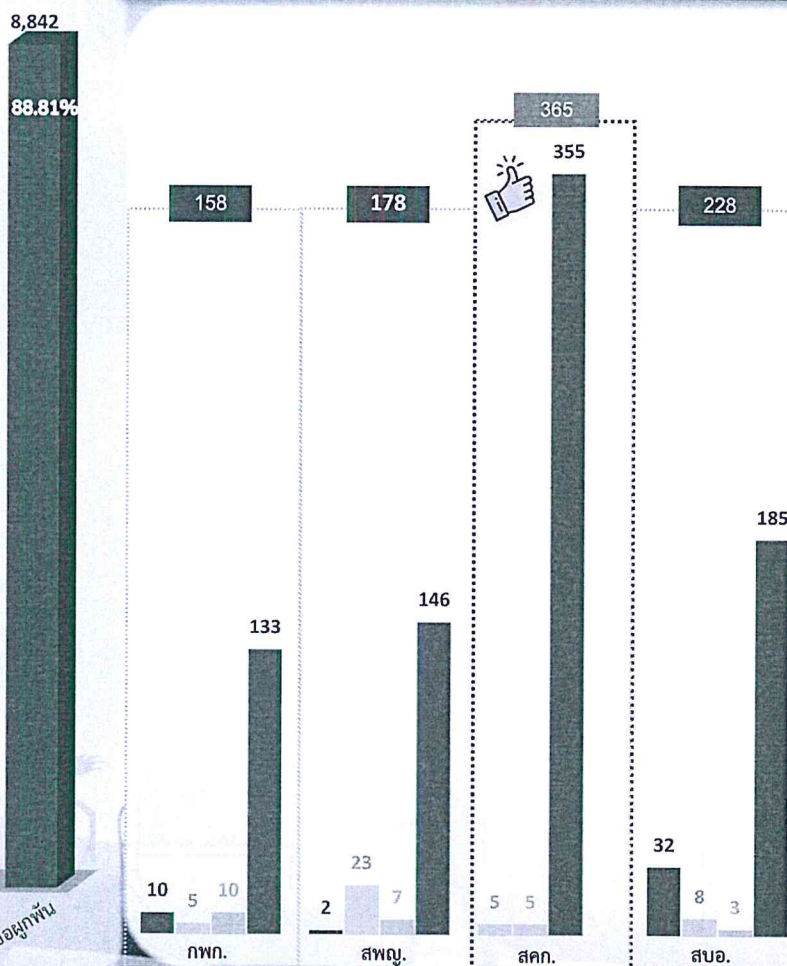

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,956	69,887.26	250	2,244.40	178	4,239.03	686	5,956.22	8,842	57,447.6
กพท.	158	13,162.81	10	326.05	5	440.22	10	1,267.56	133	11,128.9
สทท.	178	11,144.59	2	57.33	23	2,207.28	7	403.65	146	8,476.3
สคท.	365	1,428.24			5	48.48	5	143.68	355	1,236.08
สบอ.	228	706.59	32	102.01	8	145.19	3	35.24	185	424.15
สบก.	32	598.70			2	10.00	10	84.87	20	503.83
สจต.	49	272.55					8	37.21	41	235.34
สสท.	4	99.97					3	50.89	1	49.08
สสธ.	39	513.24			1	6.22	12	95.03	26	411.99
สอธ.	13	331.04			5	74.00	1	10.00	7	247.04
ศทส.	1	3.00	1	3.00						
สมค.	48	5,538.62							48	5,538.62




หมายเหตุ

ไม่รวมรายการ จำนวน 109 รายการ งบประมาณ 800.80 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 106 รายการ งบประมาณ 571.80 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท



■ ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TC
 ■ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ■ เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา
 ■ ทำข้อผูกพัน



ดำเนินการ
ประกาศ TOR
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดซองถึง
อนุมัติรับราคา
ทำข้อผูกพัน

250
178
686
8,842

2.51%
1.79%
6.89%
88.81%

สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 19 ธ.ค. 66

- ส่วนภูมิภาค

หน่วย : ล้านบาท


สำนัก/กอง	จำนวนรายการ ทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึง ประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึง อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน		สำนัก/กอง	จำนวนรายการ ทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึง ประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึง อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ				จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	418	1,522.48	2	3.90	5	5.50	12	49.51	399	1,463.57	สขป. 10	608	1,032.68	51	147.29	3	21.92	47	156.09	507	707.38
สขป. 2	403	1,292.27	2	1.11	4	7.50	24	70.20	373	1,213.46	สขป. 11	580	1,573.54	17	74.14	14	215.58	91	194.76	458	1,089.06
สขป. 3	360	2,212.09	5	66.60	4	8.79	14	22.08	337	2,114.62	สขป. 12	674	1,469.89	44	107.61	6	25.10	94	324.51	530	1,012.66
สขป. 4	534	1,571.89	5	87.49	2	157.03	13	40.31	514	1,287.07	สขป. 13	611	1,321.28	7	339.77	2	20.50	10	9.45	592	951.56
สขป. 5	494	2,660.15	1	0.42	3	18.00	10	59.34	480	2,582.39	สขป. 14	355	2,960.75	1	40.00	17	212.77	49	513.02	288	2,194.96
สขป. 6	500	2,834.39	4	61.27	2	16.00	15	108.75	479	2,648.38	สขป. 15	500	1,215.76	9	41.70	7	89.45	50	369.40	434	715.21
สขป. 7	654	5,051.26	5	182.50			13	48.01	636	4,820.75	สขป. 16	519	3,210.46	13	236.48	11	431.55	59	1,130.50	436	1,411.93
สขป. 8	625	3,421.90	6	155.75	6	35.10	13	117.95	600	3,113.10	สขป. 17	265	1,082.67	4	63.00	2	2.15	55	406.93	204	610.59
สขป. 9	741	1,654.44	29	146.99	41	40.71	58	207.28	613	1,259.46											ยังไม่ดำเนินการถึง

ไม่รวมรายการ จำนวน 109 รายการ งบประมาณ 800.80 ล้านบาท ดังนี้

- ยกเลิก จำนวน 106 รายการ งบประมาณ 571.80 ล้านบาท

- รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

หมายเหตุ

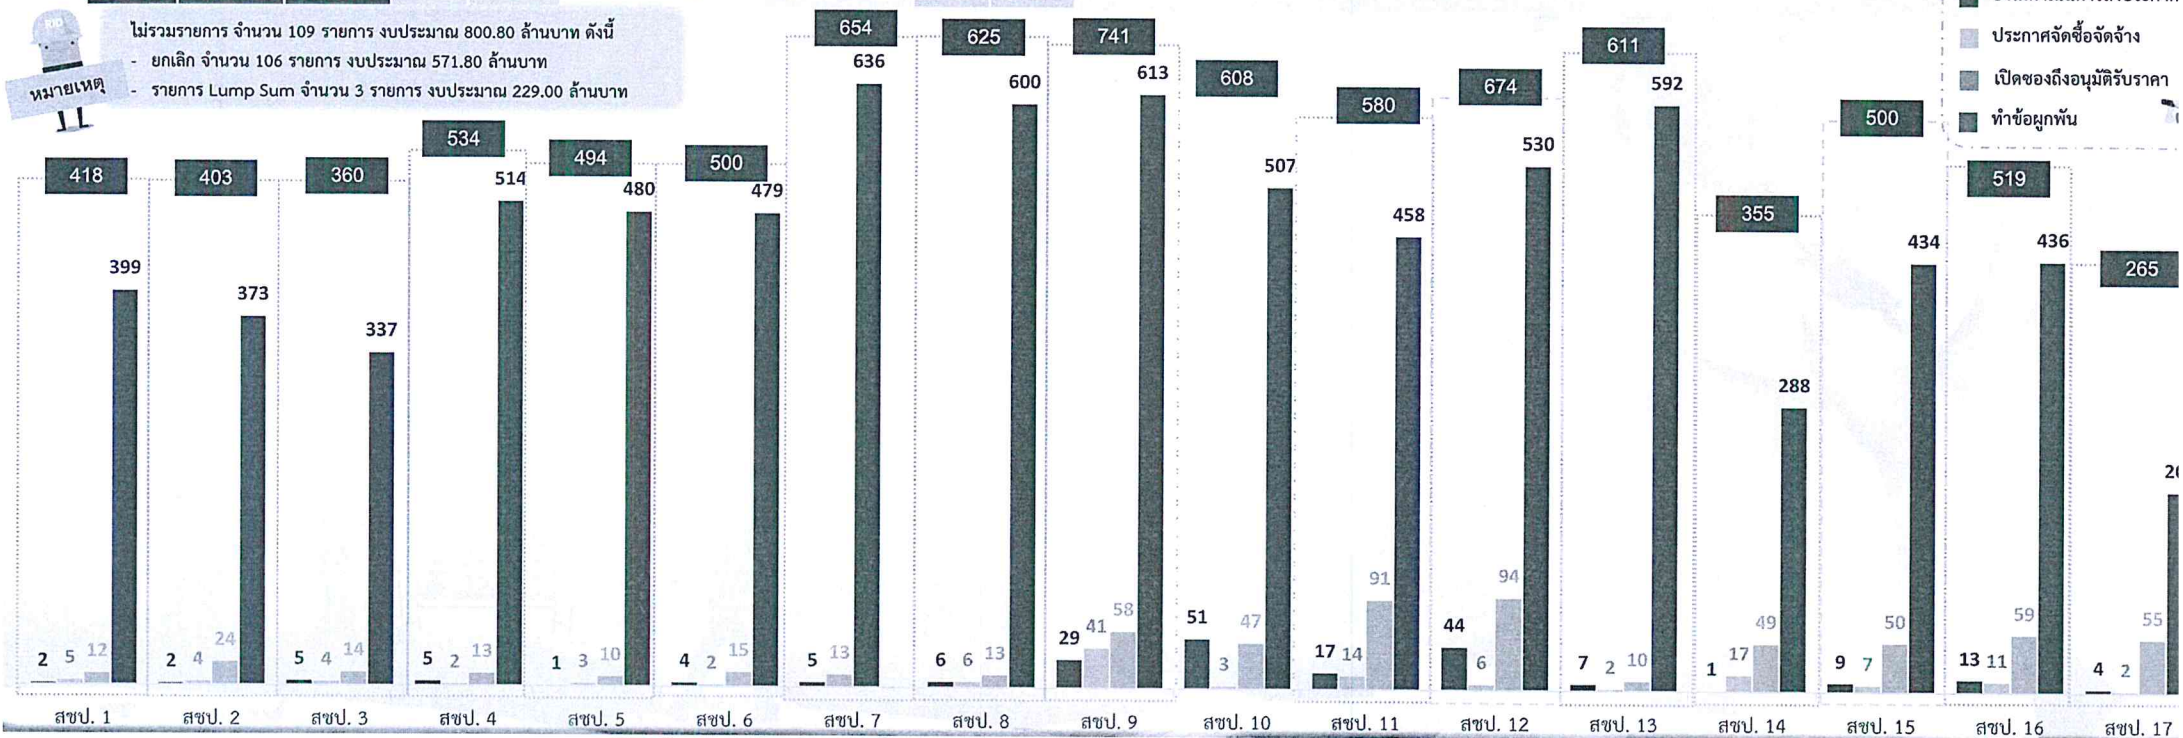

2.3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

สำนัก/กอง	งบประมาณ พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อผูกพัน							
					จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
											0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100 %
รวม	70,116.25	9,144.68	13.04	9,959	11	151.65	1,105	12,337.01	8,843	57,627.60	6,923	803	444	422	248	3
สขป. 1	1,522.48	312.51	20.53	418			19	58.91	399	1,463.57	202	111	49	24	13	
สขป. 2	1,292.27	147.03	11.38	403			30	78.81	373	1,213.46	346	15	7	5		
สขป. 3	2,212.09	133.37	6.03	360			23	97.47	337	2,114.62	285	13	16	19	4	
สขป. 4	1,571.89	152.85	9.72	534			20	284.82	514	1,287.07	477	21	10	5	1	
สขป. 5	2,660.15	268.09	10.08	494			14	77.76	480	2,582.39	405	39	24	7	5	
สขป. 6	2,834.39	339.32	11.97	500			21	186.01	479	2,648.38	234	58	73	83	31	
สขป. 7	5,051.26	1,178.07	23.32	654			18	230.51	636	4,820.75	271	97	53	137	78	
สขป. 8	3,421.90	359.98	10.52	625			25	308.80	600	3,113.10	403	95	51	36	15	
สขป. 9	1,654.44	245.58	14.84	741			128	394.98	613	1,259.46	433	96	47	25	12	
สขป. 10	1,044.83	67.14	6.43	609	4	40.65	97	284.66	508	719.53	487	7	3	7	4	
สขป. 11	1,573.54	72.72	4.62	580	3	24.00	119	460.47	458	1,089.06	414	17	22	3	2	
สขป. 12	1,469.89	111.60	7.59	674			144	457.23	530	1,012.66	442	44	12	22	10	
สขป. 13	1,321.28	128.61	9.73	611			19	369.72	592	951.56	537	38	7	4	6	
สขป. 14	2,960.75	174.27	5.89	355			67	765.79	288	2,194.96	216	39	9	11	13	
สขป. 15	1,215.76	46.35	3.81	500			66	500.55	434	715.21	426	4			4	
สขป. 16	3,210.46	44.85	1.40	519			83	1,798.53	436	1,411.93	360	23	24	11	18	
สขป. 17	1,082.67	21.78	2.01	265			61	472.07	204	610.59	190	7	4		3	
กพท.	13,162.81	1,212.04	9.21	158	1	35.00	24	1,998.83	133	11,128.98	129	1	1		1	1
สพญ.	11,144.59	1,473.02	13.22	178			32	2,668.26	146	8,476.32	132	6	2	2	4	
สขอ.	706.59	28.65	4.05	228			43	282.44	185	424.15	126	43	6	6	4	
สคก.	1,416.09	198.35	14.01	364			10	192.16	354	1,223.93	291	21	20	11	11	
สสร.	513.24	29.56	5.76	39			13	101.25	26	411.99	25			1		
สขก.	598.70	64.67	10.80	32			12	94.87	20	503.83	20					
สอธ.	331.04	40.27		13			6	84.00	7	247.04	7					
สจค.	272.55	18.64	6.84	49			8	37.21	41	235.34	34	2	2		3	
สลก.	99.97	2.59	2.59	4			3	50.89	1	49.08	1					
สมค.	5,538.62	2,262.63	40.85	48					48	5,538.62	29	6	2	3	6	2
ศทส.	3.00	0.00		1	1	3.00										
Lump Sum	229.00	10.14	4.43	3	2	49.00			1	180.00	1					

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 106 รายการ งบประมาณ 571.80 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบกลาง เป็นต้น

2.4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

สำนัก/กอง	งบประมาณ พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน รายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อมูลพัน							
					จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
											0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100 %
รวม	70,116.25	9,144.68	13.04	9,959	11	151.65	1,105	12,337.01	8,843	57,627.60	6,923	803	444	422	248	3
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจาก จังหวัดอุดรดิตถ์	1,198.71	36.58	3.05	17			4	614.54	13	584.16	11		1	1		
โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,568.35	582.74	16.33	18			4	1,053.50	14	2,514.85	11	3				
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	21,654.39	2,405.53	11.11	440	1	35.00	44	2,767.03	395	18,852.36	373	16	3	1	1	1
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	461.01	44.01	9.55	9					9	461.01	9					
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	452.70	0.38	0.08	14			9	142.47	5	310.23	5					
โครงการประดูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	194.72	19.38	9.95	3			1	2.74	2	191.98	2					
โครงการประดูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	164.65	1.63		4					4	164.65	4					
โครงการประดูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	500.57	13.51	2.70	10					10	500.57	9		1			
โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	139.89	0.58	0.41	8			3	77.33	5	62.56	5					
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10,034.99	423.01	4.22	518	4	48.00	104	2,618.84	410	7,368.15	362	37	5	2	4	
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	7,026.34	473.00	6.73	151			26	1,020.77	125	6,005.57	122	3				
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	939.92	26.53	2.82	15			1	218.36	14	721.56	12	2				
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ จังหวัดเชียงใหม่	813.25	203.75	25.05	17			3	281.15	14	532.10	14					
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,142.20	253.66	11.84	712			48	560.91	664	1,581.29	499	53	31	36	45	
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	16,765.77	3,553.00	21.19	7,466	5	65.65	773	2,469.24	6,688	14,230.88	5,158	649	366	345	168	2
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	30.84	0.13	0.44	3					3	30.84	3					
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโหล จังหวัดระยอง	503.83	0.50		4			1	190.00	3	313.83	3					
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	259.83	23.75	9.14	8			1	1.00	7	258.83	7					
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยา	141.00	96.95	68.76	7					7	141.00	6				1	
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	610.75	14.32	2.34	6					6	610.75	6					
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	264.18	26.54	10.05	3			1	6.75	2	257.43	2					
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	752.43	583.58	77.56	2					2	752.43	1					1
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	535.84	188.56	35.19	10			3	74.65	7	461.19	5	1			1	
ผลผลิตการจัดหารางงานชลประทาน	960.11	173.06	18.02	514	1	3.00	79	237.73	434	719.38	294	39	37	37	27	


หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 106 รายการ งบประมาณ 571.80 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบกลาง เป็นต้น



2.5

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

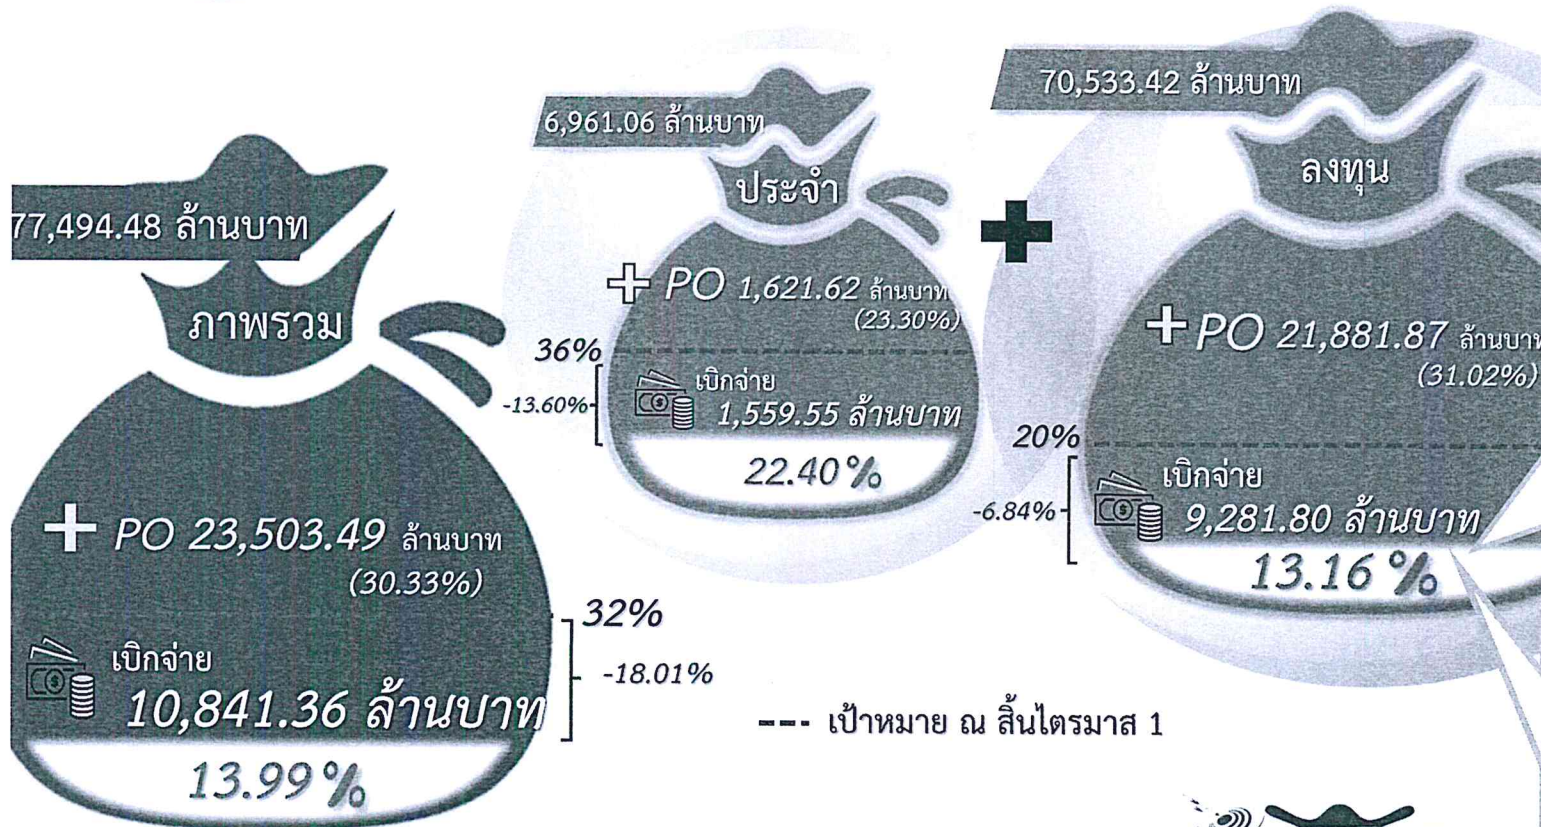

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

- ผูกพันเดิม จำนวนทั้งสิ้น 101 รายการ งบประมาณ 9,961.94 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,097.48 ล้านบาท (21.05%) โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ (1.98%) งบประมาณ 145.14 ล้านบาท (1.46%) และทำข้อผูกพันแล้ว จำนวน 99 รายการ (98.02%) งบประมาณ 9,816.7 ล้านบาท (98.54%)
- ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 31 รายการ งบประมาณ 3,139.63 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 9,933 รายการ งบประมาณ 57,431.85 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,184.32 ล้านบาท (12.51%) โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ (0.11%) งบประมาณ 151.65 ล้านบาท (0.26%) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1,072 รายการ (10.79%) งบประมาณ 9,052.24 ล้านบาท (15.76%) ทำข้อผูกพันแล้ว จำนวน 8,744 รายการ (88.03%) งบประมาณ 47,656.16 ล้านบาท (82.98%) และยกเลิก จำนวน 106 รายการ (1.07%) งบประมาณ 571.80 ล้านบาท (1.00%)

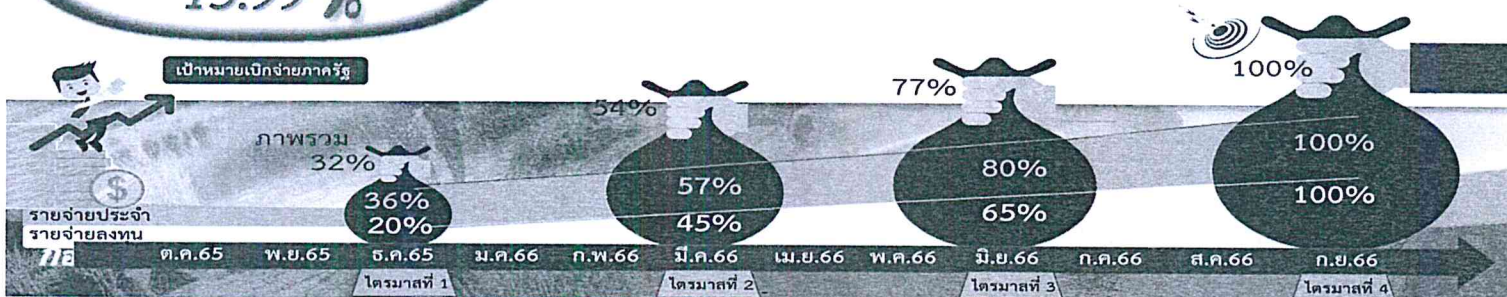

2.6

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

77,494.48 ล้านบาท

ภาพรวม



เบิกจ่าย

10,841.36 ล้านบาท

13.99%

ร้อยละ

เป้าหมายภาพรวม ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

เป้าหมาย 100.00%

100

80

60

40

20

0

เป้าหมาย 32.00%

เป้าหมาย 54.00%

เป้าหมาย 77.00%

- ต่ำกว่าเป้าหมายกรม ร้อยละ 18.01
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (61 - 65) ร้อยละ 1.96

	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
➡ เป้าหมายกรม ปี 66	10.67	21.34	32.00	39.33	46.66	54.00	61.67	69.34	77.00	84.67	92.34	100.00
➡ ผลปี 66 (77,494.48)	3.07	9.55	13.99									
➡ ผลปี 65 (77,143.43)2	2.45	7.97	16.49	21.25	28.37	38.31	43.27	51.57	61.30	66.15	73.38	84.09
▲ ผลปี 64 (74,106.98)2	0.66	4.91	12.24	16.05	22.61	34.76	39.61	48.38	59.48	64.67	68.91	83.67
■ ผลปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	7.84	9.23	16.56	25.26	34.54	47.70	54.68	66.97	82.54
■ ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	83.17
■ ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
■ เฉลี่ย 5 ปี (61-65)	1.65	5.83	12.03	16.13	21.59	32.12	37.48	45.64	56.44	62.03	69.92	82.97

2.7

สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

ร้อยละ

เป้าหมายงบรายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

100

80

60

40

20

0

เป้าหมายรัฐบาล 100.00%

เป้าหมาย 65.00%

เป้าหมาย 45.00%

เป้าหมาย 20.00%

- ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ 6.84
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (61 - 65) ร้อยละ 2.68

70,533.42 ล้านบาท

ลงทุน

เบิกจ่าย

9,281.80 ล้านบาท

13.16%


	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายกรม ปี 65	6.67	13.34	20.00	28.33	36.66	45.00	51.67	58.34	65.00	76.67	88.34	100.00
ผลปี 66 (70,682.86)	2.68	8.95	13.16									
ผลปี 65 (70,135.62)	1.94	7.11	15.67	20.09	27.12	37.20	41.86	50.22	60.17	64.59	71.8	82.46
ผลปี 64 (66,423.87)	0.003	3.81	10.97	14.29	20.79	33.39	37.9	46.78	58.21	63.11	66.85	82.02
ผลปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	4.77	5.36	12.51	21.31	30.59	44.54	51.34	64.24	80.61
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
ผลปี 61 (47,566.20)	1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
เฉลี่ย 5 ปี (61 - 65)	0.99	4.59	10.48	14.02	19.17	29.96	35.01	43.08	54.40	59.53	67.46	80.93

2.8

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

ร้อยละ

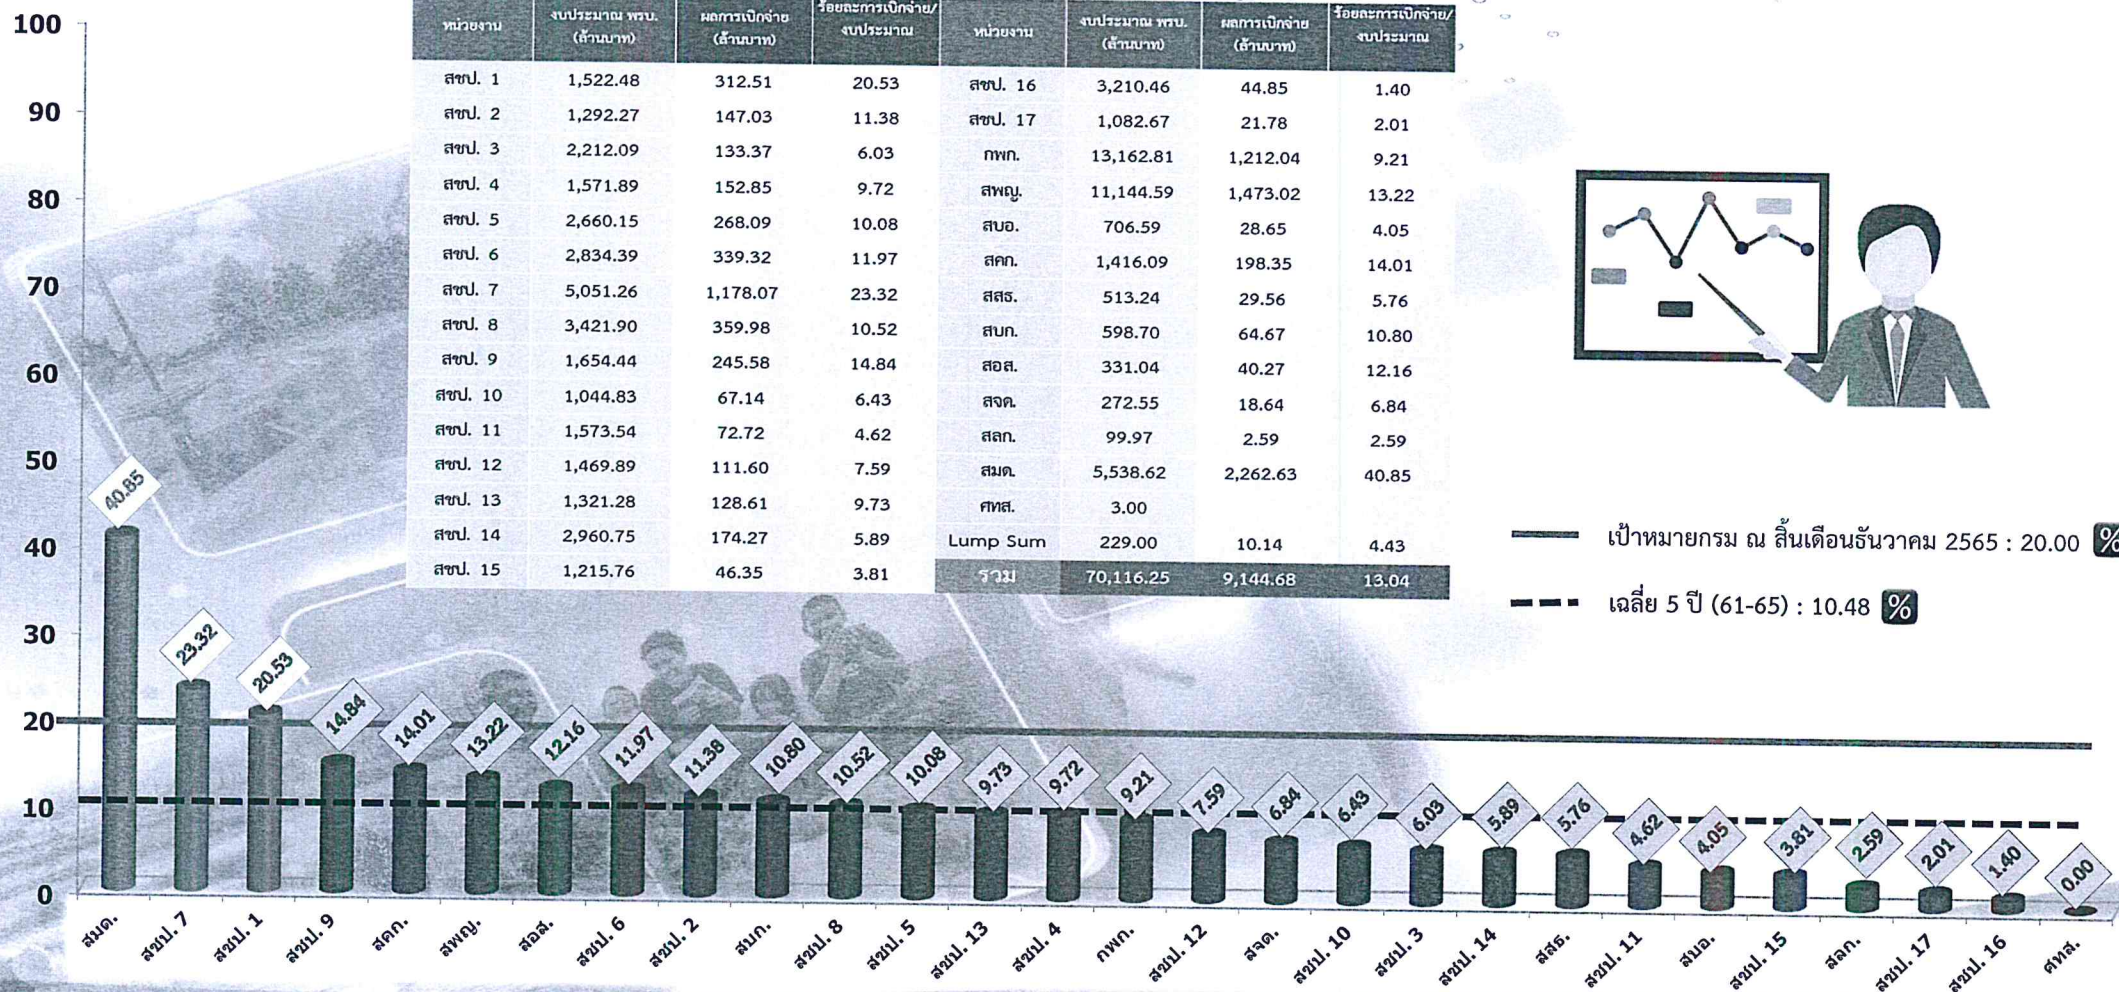

ยกเลิก จำนวน 106 รายการ งบประมาณ 571.80 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบกลาง เป็นต้น

- ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายรัฐบาล
- ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

กองแผนงาน

2.9

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)							
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	93,061.91	24,948.25	26.81	75,648.63	7,581.88	10.02	16.79
2	กระทรวงคมนาคม	168,733.61	13,859.25	8.21	161,600.49	15,279.95	9.46	-1.25
3	กระทรวงมหาดไทย	81,018.43	5,631.83	6.95	75,933.84	5,925.17	7.80	-0.85
	ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมชลประทาน	70,533.42	9,281.80	13.16	70,224.74	7,284.60	10.37	2.79
2	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,439.94	57.60	4.00	1,279.24	17.87	1.40	2.60
3	กรมพัฒนาที่ดิน	1,988.23	52.63	2.65	1,957.74	67.46	3.45	-0.80
	ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)							
1	กรมโยธาธิการและผังเมือง	33,310.31	5,129.12	15.40	29,841.22	5,005.75	16.77	-1.37
2	กรมชลประทาน	70,533.42	9,281.80	13.16	70,224.74	7,284.60	10.37	2.79
3	กรมทางหลวง	113,451.08	11,761.41	10.37	108,004.83	13,601.22	12.59	-2.22
4	กรมทางหลวงชนบท	45,583.25	1,366.93	3.00	44,326.09	1,191.17	2.69	0.31

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 16.80%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (48 หน่วยงาน) เฉลี่ย 15.16%

[illegible]

ប៊ិ
100



การดำเนินงาน


มีมติ คร.ม./คำสั่งนายก อบม.ตั้งงบกลาง 65

รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,087 รายการ

งบประมาณ 4,896.45 ล้านบาท

เบิก 2,127.50 ล้านบาท 43.45%

ผลการดำเนินงาน



ตัวชี้วัดของโครงการ



มติ ครม.
29 มี.ค. 65

คำสั่งนายก
4 ส.ค. 65
ครุภัณฑ์

มติ ครม.
9 ส.ค. 65

มติ ครม.
6 ก.ย. 65
ครุภัณฑ์

มติ ครม.
6 ก.ย. 65

มติ ครม.
27 ก.ย. 65
ครุภัณฑ์

กปร.
ปี 2565

620 รายการ
1,126.19 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,034.34 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 91.84

- แล้วเสร็จ 599 รายการ
 - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 19 รายการ
 - ยกเลิก 2 รายการ
- 95.74%

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

1 รายการ
97.92 ล้านบาท

เบิกจ่าย 97.92 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100

- แล้วเสร็จ
- 100%

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

407 รายการ
1,137.66 ล้านบาท

เบิกจ่าย 390.78 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 34.35

- แล้วเสร็จ 110 รายการ
 - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 297 รายการ
- 45.73%

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

3 รายการ
663.88 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

- จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 รายการ
- %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

4 รายการ
190.14 ล้านบาท

เบิกจ่าย 16.84 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 8.86

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 รายการ
 - จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 รายการ
- 4.23%

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

1 รายการ
656.55 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

- จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ
- %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

51 รายการ
1,024.11 ล้านบาท

เบิกจ่าย 587.62 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 57.3

- แล้วเสร็จ 16 รายการ
 - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 35 รายการ
- 49.13%

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม. /- ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่ /1,635,272 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน /120,785 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

ดำเนินการจัดหารถปั่นจั่น เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จัดหารถปั่นจั่นอย่าง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกปรับไปตามกฎหมาย

พื้นที่รับประโยชน์ 588,388 ไร่ /146,285 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 69,180 ครัวเรือน /17,909 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566

ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความจำเป็นใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

พื้นที่รับประโยชน์ 197,576 ไร่ /- ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 5,315 ครัวเรือน /- ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพิ่มเติม

ดำเนินการจัดหาเครื่องสูบน้ำสำหรับการป้องกันความเสียหาย และสนับสนุนบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำได้ทันเหตุการณ์ และมีเครื่องสูบน้ำพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามที่มีหน่วยงานร้องขอสนับสนุน

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว

ดำเนินงานก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565)

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



งบประมาณ 1,026.97 ล้านบาท
(งบจัดสรร 73.63 ล้านบาท)
เบิกจ่าย 0.23 ล้านบาท 0.02 %

ผลการดำเนินงาน : 1,012 รายการ



แล้วเสร็จ


4 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 422 รายการ


ยังไม่ดำเนินการ 586 รายการ

งานกองทุน จัดรูปที่ดิน

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

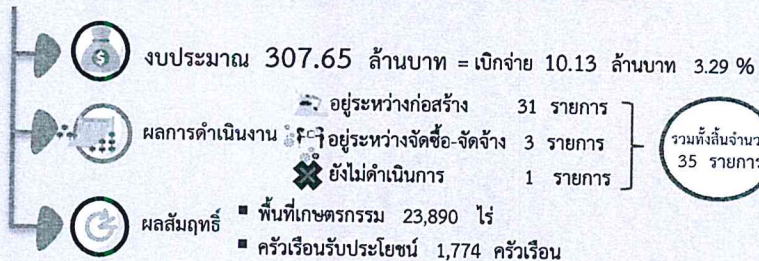

จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร



ภาพรวม



งบประมาณ
1,035.00 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 59.46 ล้านบาท 5.74 %



ผลการดำเนินงาน : 92 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 86 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 5 รายการ
ยังไม่ดำเนินการ 1 รายการ

