



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘, ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๘๒/๒๕๖๖ วันที่ ๓/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จากระบบติดตาม Cen Project)

๖๒๑๑๙๔

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน จำนวน ๔๖ รายการ งบประมาณ ๘๔๓.๐๕๘๒ ล้านบาท ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗๙ รายการ งบประมาณ ๑,๗๕๕.๔๔๓๒ ล้านบาท เปิดซอง จำนวน ๕๒ รายการ งบประมาณ ๒,๗๓๕.๕๒๒๘ ล้านบาท อนุมัติรับราคา จำนวน ๑๓๑ รายการ งบประมาณ ๑,๕๙๑.๑๙๓๙ ล้านบาท ทำข้อผูกพัน จำนวน ๙,๖๓๙ รายการ งบประมาณ ๖๒,๗๐๐.๑๖๙๔ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๑๑๕ รายการ งบประมาณ ๘๓๓.๖๗๕๔ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานงานปีเดียวต้องก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ จากการตรวจสอบ พบว่า ยังมีรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๒๘๐ รายการ งบประมาณ ๔,๑๙๒.๔๔๔๐ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประเภทซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีสำนัก/กองที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันมากที่สุด ๓ ลำดับ คือ

- ๑) สขป. ๙ จำนวน ๓๐ รายการ งบประมาณ ๑๖๔.๕๑๕๐ ล้านบาท
- ๒) สขป. ๑๗ จำนวน ๒๘ รายการ งบประมาณ ๑๘๘.๘๕๐๓ ล้านบาท
- ๓) สขป. ๑๑ จำนวน ๒๗ รายการ งบประมาณ ๓๗๙.๒๘๙๓ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

- ทราบ

เรียน ผอ.สชช., ผอ.ร.ทช., ทน.๑-๙ มอ.

11๖๖ มท.มอ.

ผู้ว่าราชการจังหวัด  
อ.ม.

(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

- ๘ ก.พ. ๒๕๖๖

(นายโรจนวิวัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.



รายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน

อ.ม.  
๖/๒

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่เกิดหนี้ผูกพัน - ส่วนกลาง

ข้อมูลจากระบบ Gen Project ณ วันที่ 6 ก.พ. 2566  
หน่วย : ล้านบาท



การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มินต์ให้ รายการรายงานเป็นตัวเลขต่อหน้าผู้ทบทวนในไตรมาสที่ 1

ภาพรวม

รายการที่ยังไม่เกิดหนี้ผูกพัน 308 รายการ :  
งบประมาณ 6,925.22 ล้านบาท

ยังไม่เกิดหนี้การที่อนุมัติแผน  
ประเภท TOR ที่ประเภท  
จัดซื้อจัดจ้าง  
เปิดซอง  
อนุมัติราคา

ลำดับ/กอง	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่เกิดหนี้การที่อนุมัติแผน		ประเภท TOR ที่ประเภทจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง	อนุมัติราคา		จำนวน	งบประมาณ	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณ			
รวม	9,947	69,625.39	46	843.06	79	1,755.44	52	2,735.52	131	1,591.19	9,639	62,700.17
กพร.	158	13,162.81	4	25.91	3	374.00	5	470.47	2	194.56	144	12,097.88
กพว.	176	10,927.46	2	210.45	8	150.96	4	1,595.75	2	279.75	160	8,690.55
สกก.	373	1,470.02	1	30.00	1	5.00	8	141.34	4	43.20	366	1,314.77
กบง.	228	706.59	6	47.44	5	33.00	5	40.00	1	15.87	209	469.61
กบจ.	32	598.70	3	212.55	1	212.55	2	212.55	1	3.60	46	266.23
สกค.	49	272.55	1	3.00	1	6.22	3	50.89	3	50.89	1	49.08
สกค.	5	102.97	1	3.00	1	6.22	4	19.00	4	31.99	34	475.03
สกค.	39	513.24	1	3.00	1	6.22	4	19.00	4	31.99	8	257.04
สกค.	13	331.04	1	3.00	1	6.22	4	19.00	4	31.99	8	257.04
กบง.	48	5,538.62	1	3.00	1	6.22	4	19.00	4	31.99	48	5,538.62

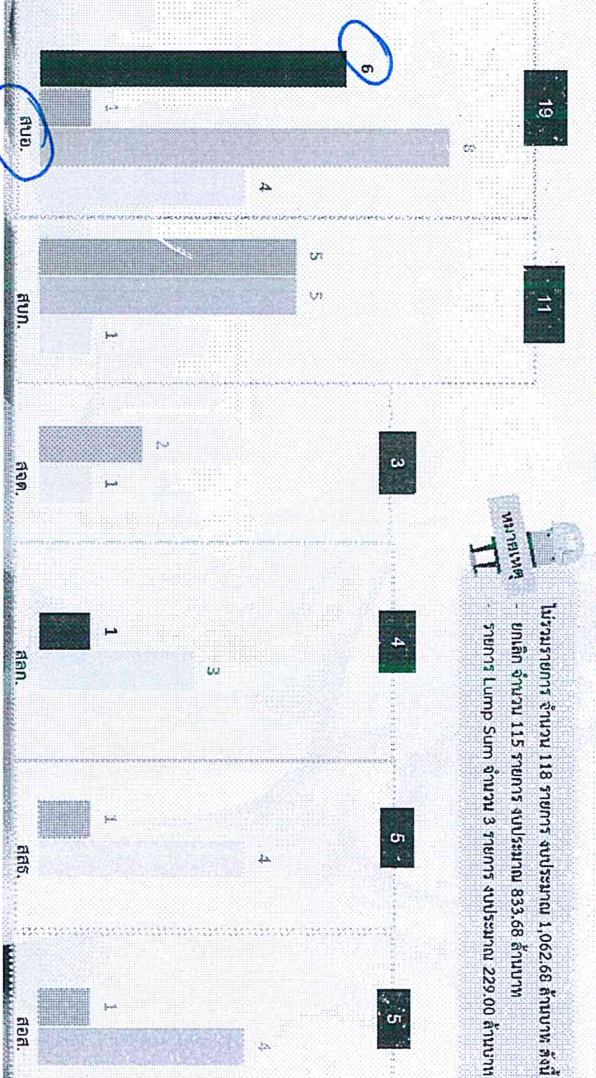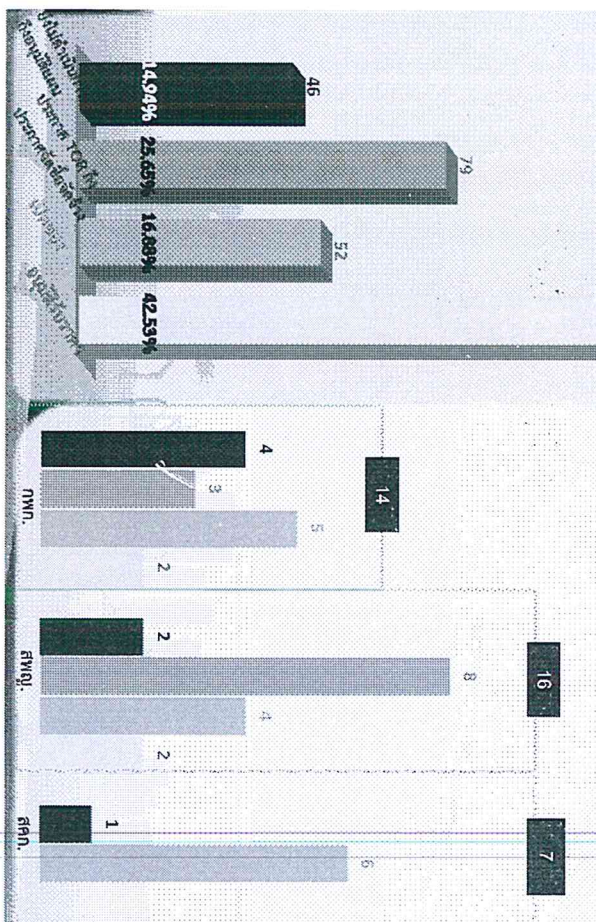

ไตรมาสแรก จำนวน 118 รายการ งบประมาณ 1,062.66 ล้านบาท ซึ่งมี  
ยกเลิก จำนวน 115 รายการ งบประมาณ 833.68 ล้านบาท  
รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

# รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน - ส่วนภูมิภาค

รูป ๕ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 308 รายการ

คำขออนุมัติ/รายการที่	จำนวนรายการที่	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันถึงบัญชีเงิน		งบประมาณ TOB ถึงงบประมาณ TOB		งบประมาณ TOB ถึงงบประมาณ TOB		งบประมาณ TOB ถึงงบประมาณ TOB		งบประมาณ TOB ถึงงบประมาณ TOB		งบประมาณ TOB ถึงงบประมาณ TOB		งบประมาณ TOB ถึงงบประมาณ TOB		งบประมาณ TOB ถึงงบประมาณ TOB		งบประมาณ TOB ถึงงบประมาณ TOB			
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สพป. 1	416	1,499.48*																				
สพป. 2	403	1,292.27																				
สพป. 3	359	2,211.74																				
สพป. 4	532	1,567.27	1	2.66	3	46.57	4	221.91	1	4.00	6	28.48	350	2,136.69	671	1,468.39	2	84.79	8	30.83	661	1,352.77
สพป. 5	494	2,660.15																				
สพป. 6	500	2,834.39																				
สพป. 7	659	5,051.26																				
สพป. 8	624	3,421.34	4	80.75	5	182.50	1	50.00	4	5.62	4	9.88	645	4,863.14	617	3,330.72	1	45.00	2	85.00	14	88.42
สพป. 9	740	1,654.40	2	29.03	12	43.13	6	51.90	10	40.46	710	1,489.89	285	1,082.67	6	65.15	4	17.51	18	116.19	237	883.82

รูป ๖ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 308 รายการ



โครงการราชการ จำนวน 118 รายการ งบประมาณ 1,062.68 ล้านบาท  
 ยกเลิก จำนวน 115 รายการ งบประมาณ 833.68 ล้านบาท  
 รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท



