



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘, ๒๒๕๖

ที่ กพง ๐๖/๓๓/๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จากระบบติดตาม Cen Project) 211364

เรียน อช. สำนักฯ เรียง รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันจำนวน ๒๗๐ รายการ งบประมาณ ๖,๕๑๘.๘๗๒๑ ล้านบาท (ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน จำนวน ๔๓ รายการ งบประมาณ ๘๓๓.๔๘๘๒ ล้านบาท ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗๙ รายการ งบประมาณ ๑,๖๘๗.๓๗๓๒ ล้านบาท เปิดซอง จำนวน ๔๒ รายการ งบประมาณ ๒,๔๖๒.๔๙๒๘ ล้านบาท อนุมัติรับราคา จำนวน ๑๐๖ รายการ งบประมาณ ๑,๕๓๕.๕๑๗๙ ล้านบาท) ทำข้อผูกพัน จำนวน ๙,๖๗๓ รายการ งบประมาณ ๖๓,๐๙๗.๖๗๗๔ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๑๑๙ รายการ งบประมาณ ๘๔๒.๕๑๓๔ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานงานปีเดียวต้องก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ จากการตรวจสอบ พบว่า ปัจจุบันมีสำนัก/กองที่ก่อนนี้ผูกพันรายงานงานปีเดียวแล้วเสร็จทุกรายการ จำนวน ๓ สำนัก คือ สมต. สอส. และ สขป. ๕ นอกจากนี้ยังมีรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๒๔๒ รายการ งบประมาณ ๓,๗๓๖.๐๙๘๐ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประเภทซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีสำนัก/กองที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันมากที่สุด ๓ ลำดับ คือ

- ๑) สขป. ๙ จำนวน ๒๗ รายการ งบประมาณ ๑๕๓.๓๘๕๐ ล้านบาท
- ๒) สขป. ๑๕ จำนวน ๒๔ รายการ งบประมาณ ๑๔๖.๙๕๓๗ ล้านบาท
- ๓) สขป. ๑๑ จำนวน ๒๓ รายการ งบประมาณ ๒๘๖.๔๓๙๓ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

- ทราบ

เรียน นอ.ส่วน, นอ.กท., กท. ๑-๙ นอ.

11๒1 นพท.นอ.

11๒1 นพท.นอ.

อ.

(นายเชนทร์ สมบูรณ์)

ผ.ส. นอ.

๑๕ กพ. ๒๕๖๖

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.



รายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน

อ.


รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน - ส่วนกลาง

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 13 ก.พ. 2566

หน่วย : ล้านบาท


ลำดับ/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	จำนวนรายการ (ส่วนบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประเภท TOR ที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		อนุมัติรับราคา		ทำสัญญา	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,943	69,616.55	43	833.49	79	1,687.37	42	2,462.49	106	1,535.52
กทท.	158	13,162.81	4	25.91	3	374.00	5	470.47	2	194.56
สพด.	176	10,927.46	2	210.45	8	1,509.96	4	1,595.75	1	220.00
สคก.	373	1,470.02	1	30.00	1	5.00	6	125.25	4	90.45
สพอ.	228	706.59	5	47.24	10	73.00	6	93.41	1	15.87
สพท.	32	598.70	1	3.00	1	6.22	2	2.72	1	3.60
สจต.	49	272.55							2	50.20
สคส.	5	102.97			1	55.00	4	19.00	4	31.99
สธส.	39	513.24								
สอธ.	13	331.04								
สผด.	48	5,538.62								

การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ รายการงานปีเดียวต้องก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1




ภาพรวม

รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 270 รายการ งบประมาณ 6,518.87 ล้านบาท

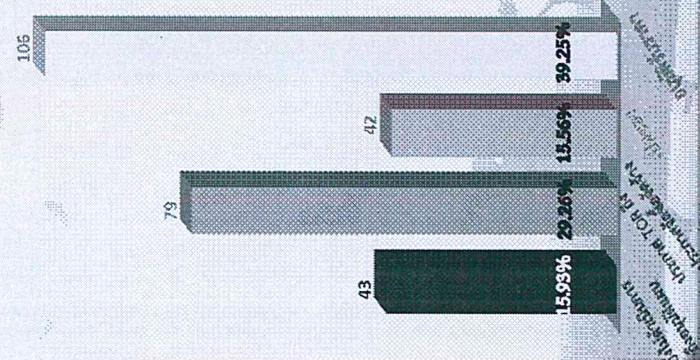

ไม่รวมรายการ จำนวน 122 รายการ งบประมาณ 1,071.51 ล้านบาท ดังนี้
 หมายเหตุ ยกเลิก จำนวน 119 รายการ งบประมาณ 842.51 ล้านบาท
 รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

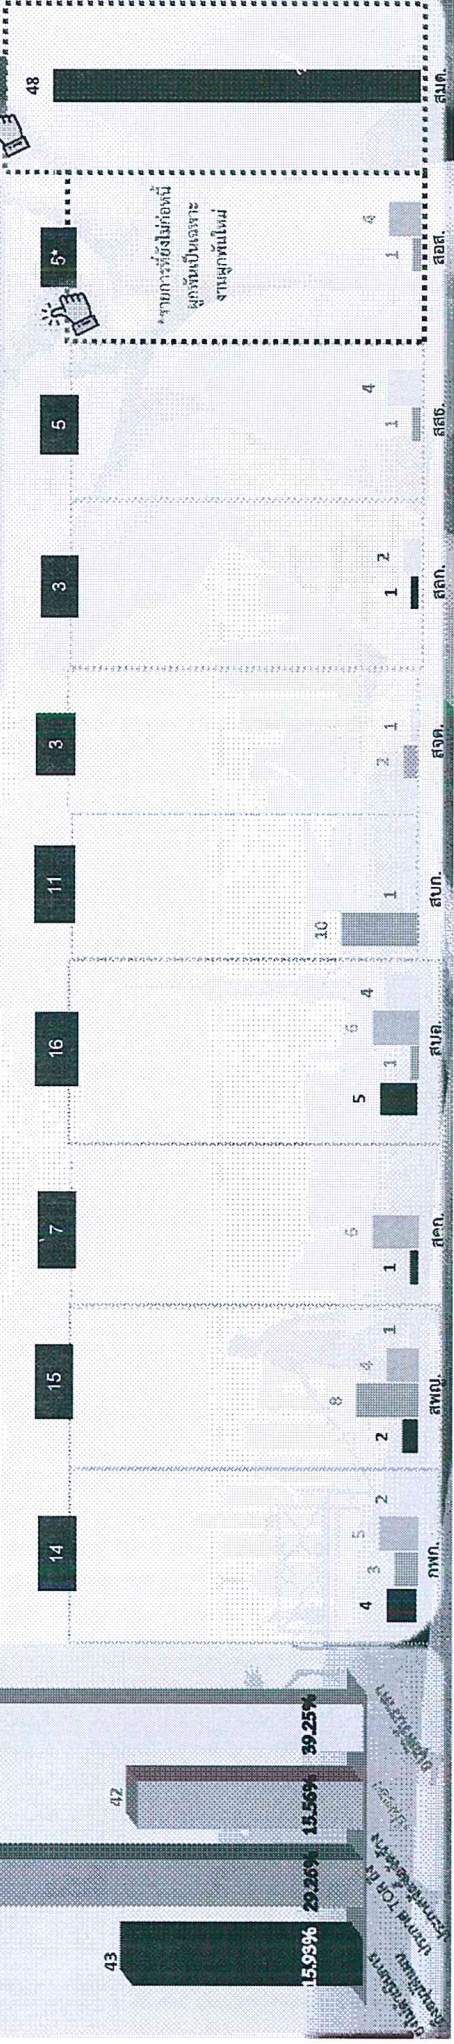

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

- ส่วนภูมิภาค

ลำดับ/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	ยังไม่ดำเนินการตั้งงบประมาณ		ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		อนุมัติราคา		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 270 รายการ		ทำสัญญา		โอนงบ		โอนงบ		โอนงบ		โอนงบ		โอนงบ	
		จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)
สขป. 1	416	1,499.48								15	51.65	2	11.00	1	0.65	3	50.01	587	919.37				
สขป. 2	403	1,292.27								4	24.04	5	194.90	2	34.90	12	32.60	556	1,286.45				
สขป. 3	359	2,211.74			3	46.57						2	84.79			4	7.83	665	1,375.77				
สขป. 4	532	1,567.27	1	2.66	4	227.91				3	313.77					1	20.00	607	987.51				
สขป. 5	494	2,660.15										5	78.10	1	0.93	12	96.00	335	2,781.40				
สขป. 6	500	2,834.39								1	15.00	10	44.15	13	87.80	10	456.00	476	1,068.81				
สขป. 7	653	5,050.92			5	182.50						1	45.00			10	456.00	506	2,657.96				
สขป. 8	623	3,419.84	4	80.75								6	65.15	4	17.51	12	96.81	241	896.20				
สขป. 9	740	1,654.40	2	29.03	12	43.13	6	51.90															
รวม																							


ข้อมูลจากระบบ Gen-Project ณ วันที่ 13 ก.พ. 2566



ยังไม่ดำเนินการตั้งงบประมาณ 484 รายการ

ยังไม่ดำเนินการตั้งงบผูกพัน
ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดซอง
อนุมัติราคา

ไม่รวมรายการ จำนวน 122 รายการ งบประมาณ 1,071.51 ล้านบาท ดังนี้
- ยกเลิก จำนวน 119 รายการ งบประมาณ 842.51 ล้านบาท
- รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

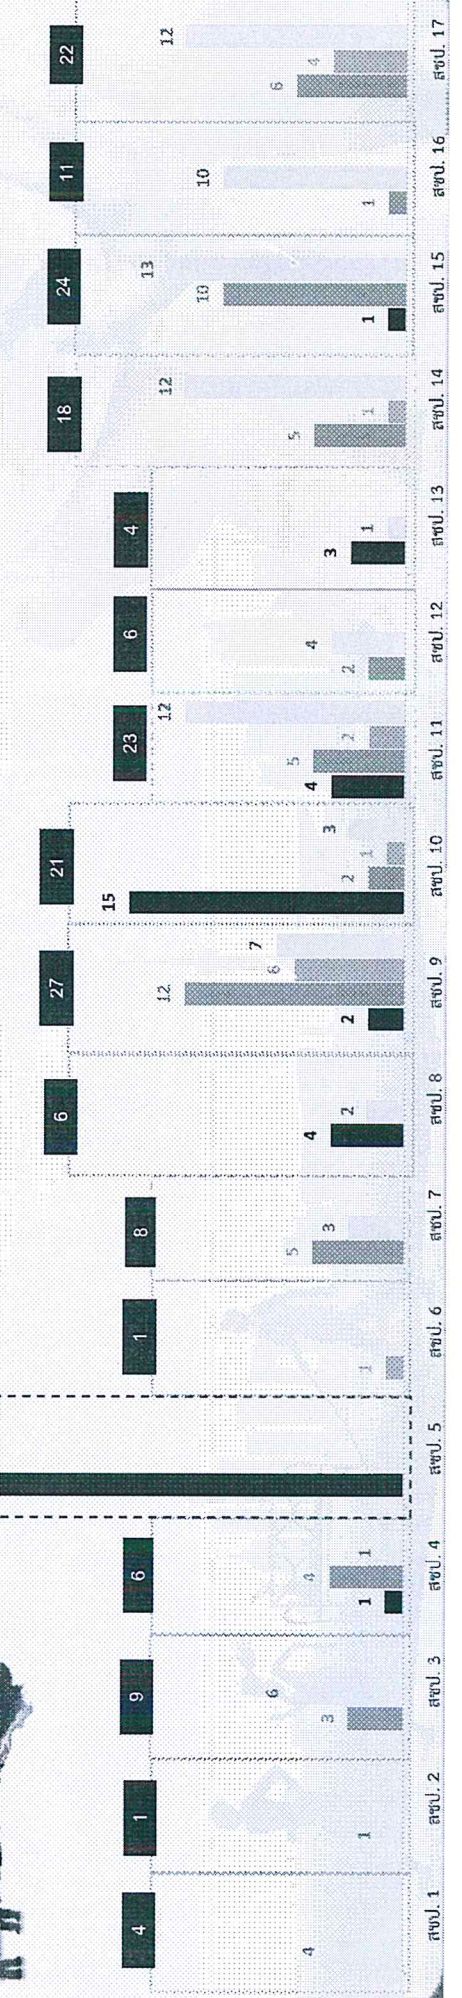

สรุปงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะรายการเป็นตัวเลข (ข้อมูลการระบบ Cen Project ณ วันที่ 13 ก.พ. 66)

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	รวมทั้งสิ้น		รวมที่ยังไม่อนุมัติ (1+2+3+4)		ประเภท TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2)		เบ็ดเตล็ด (3)		อนุมัติราคา (4)		ค่าใช้จ่ายอื่น		ยกเลิก	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,933	57,586.4944	242	3,736.0980	64	833.4882	32	612.2753	103	1,167.8413	9,571	52,996.0101	117	625.3863
สพจ. 1	420	1,523.5631	4	2.5000					4	2.5000	412	1,496.9831	4	24.0800
สพจ. 2	407	1,312.4044	1	2.5000					1	2.5000	402	1,289.7731	4	20.1313
สพจ. 3	361	2,213.6922	9	75.0539	3		46.5726		6	28.4813	350	2,136.6883	2	1.9500
สพจ. 4	533	1,505.1419	5	171.6870	3	2.6620	165.0250		1	4.0000	526	1,332.7049	2	0.7500
สพจ. 5	497	2,663.9058									493	2,568.9058	4	95.0000
สพจ. 6	503	2,849.7194	1	50.0000				1	50.0000		499	2,784.3894	3	15.3300
สพจ. 7	657	5,073.9619	8	187.7770	5		182.5000		3	5.2770	645	4,863.1435	4	23.0414
สพจ. 8	627	3,429.3430	6	90.4500	4	80.7500			2	9.7000	617	3,329.3930	4	9.5000
สพจ. 9	757	1,675.4746	27	153.3850	2	29.0254	43.1276		7	29.3320	712	1,461.5264	18	60.5632
สพจ. 10	610	1,035.1346	21	113.3112	15	51.0482	11.0000		3	50.0130	587	919.3734	2	2.4500
สพจ. 11	582	1,575.1374	23	286.4393	4	24.0360	194.9000		2	34.9000	556	1,286.4481	3	2.2500
สพจ. 12	682	1,499.5903	6	92.6227	2		84.7930		4	7.8297	665	1,375.7676	11	31.2000
สพจ. 13	612	1,321.7805	4	333.7700	3	313.7700			1	20.0000	607	987.5105	1	0.5000
สพจ. 14	360	3,058.4332	18	175.0388	5		78.1000		1	0.9346	335	2,781.4044	7	101.9900
สพจ. 15	511	1,257.7963	24	146.9537	1	15.0000	44.1500		13	87.8037	476	1,068.8111	11	42.0315
สพจ. 16	531	3,244.8938	11	501.0000			45.0000		10	456.0000	506	2,657.9608	14	85.9330
สพจ. 17	273	1,124.8545	22	179.4703	6		65.1490		12	96.8113	241	896.1973	10	49.1869
กทท.	122	9,071.0918	8	355.4614	4	25.9050			3	235.0000	113	8,715.1844	1	0.4460
สพญ.	129	3,093.7526	10	361.4050	2	210.4490	150.9560				116	2,694.6263	3	37.7213
สทท.	374	1,479.9010	7	155.2504	1	30.0000			6	125.2504	366	1,314.7706	1	9.8800
สทอ.	234	711.8701	16	236.1029	5	47.2426	5.0000		4	90.4500	212	470.4859	6	5.2813
สทป.	5	249.2714	1	15.8714					1	15.8714	4	233.4000		
สทจ.	49	272.5495	3	6.3200					1	3.6000	46	266.2295		
สทค.	3	6.2090	2	5.5200	1	3.0000			2	2.7200				
สทธ.	39	513.2350	5	38.2080					1	2.5200	1	0.6890		
สทอ.	2	50.0000					6.2200		4	31.9880	34	475.0270		
สทค.	50	5,544.7871									2	50.0000		
Lump Sum	3	229.0000									48	5,538.6167	2	6.1704
