



ส่วนที่สี่

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘, ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๑๐๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จากระบบติดตาม Cen Project) ๖211614

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันจำนวน ๒๑๕ รายการ งบประมาณ ๕,๘๕๑.๐๐๖๑ ล้านบาท (ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน จำนวน ๓๕ รายการ งบประมาณ ๕๓๘.๑๗๙๙ ล้านบาท ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗๐ รายการ งบประมาณ ๑,๔๙๓.๗๑๑๒ ล้านบาท เปิดซอง จำนวน ๓๓ รายการ งบประมาณ ๒,๔๔๐.๓๘๓๒ ล้านบาท อนุมัติรับราคา จำนวน ๗๗ รายการ งบประมาณ ๑,๓๗๘.๗๓๑๘ ล้านบาท) ทำข้อผูกพัน จำนวน ๙,๗๒๕ รายการ งบประมาณ ๖๓,๗๖๓.๔๑๓๔ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๑๒๒ รายการ งบประมาณ ๘๔๔.๖๔๓๔ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานงานปีเดียวต่อก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ จากการตรวจสอบ พบว่า ปัจจุบันมีสำนัก/กองที่ก่อนนี้ผูกพันรายงานงานปีเดียวแล้วเสร็จทุกรายการ จำนวน ๔ สำนัก คือ สมด. สอส. สขป.๒ และ สขป. ๕ นอกจากนี้ ยังมีรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑๘๘ รายการ งบประมาณ ๓,๑๖๘.๒๓๒๐ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประเภทซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีสำนัก/กองที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันมากที่สุด ๓ ลำดับ คือ

- ๑) สขป. ๑๕ จำนวน ๒๓ รายการ งบประมาณ ๑๓๘.๙๕๓๗ ล้านบาท
- ๒) สขป. ๙ จำนวน ๒๑ รายการ งบประมาณ ๑๔๖.๕๓๙๕ ล้านบาท
- ๓) สขป. ๑๐ จำนวน ๑๙ รายการ งบประมาณ ๑๐๙.๘๑๑๒ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

- (ทราบ

เรียน นอ.สน., นอ.ทต., ทน. ๑-พ.มอ.
11 ก.พ. ๖๖

เพื่อโปรดทราบ

(นายสมคิด สะเกาคำ)

ผอ.ท.บอ. รักษาราชการแทน ผส.บอ.

21 ก.พ. 2566

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.



รายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน

- ส่วนกลาง

การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ **รายการงานปีเดียวต้องก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1**



ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 215 รายการ

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน		
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
รวม	9,940	69,614.42	35	538.18	70	1,493.71	33	2,440.38	77	1,378.73	9,725	63,763.41	
กพก.	158	13,162.81	3	24.09	2	214.00	4	457.47	2	232.56	147	12,234.70	
สพญ.	176	10,927.46			5	128.76	4	1,595.75	1	220.00	166	8,982.95	
สคก.	373	1,470.02					6	125.25			367	1,344.77	
สบอ.	228	706.59	2	46.70	1	5.00	5	87.84	3	58.03	217	509.02	
สบก.	32	598.70				10	73.00			1	15.87	21	509.83
สจด.	49	272.55					1	1.00	2	5.32	46	266.23	
สลก.	5	102.97	1	3.00					2	50.20	2	49.77	
สสร.	39	513.24				1	6.22			3	22.17	35	484.85
สอส.	13	331.04				1	55.00	4	19.00			8	257.04
สมต.	48	5,538.62									48	5,538.62	





ภาพรวม

รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 215 รายการ งบประมาณ 5,851.01 ล้านบาท

- ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน
- ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดซอง
- อนุมัติรับราคา



ไม่รวมรายการ จำนวน 125 รายการ งบประมาณ 1,073.64 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 122 รายการ งบประมาณ 844.64 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

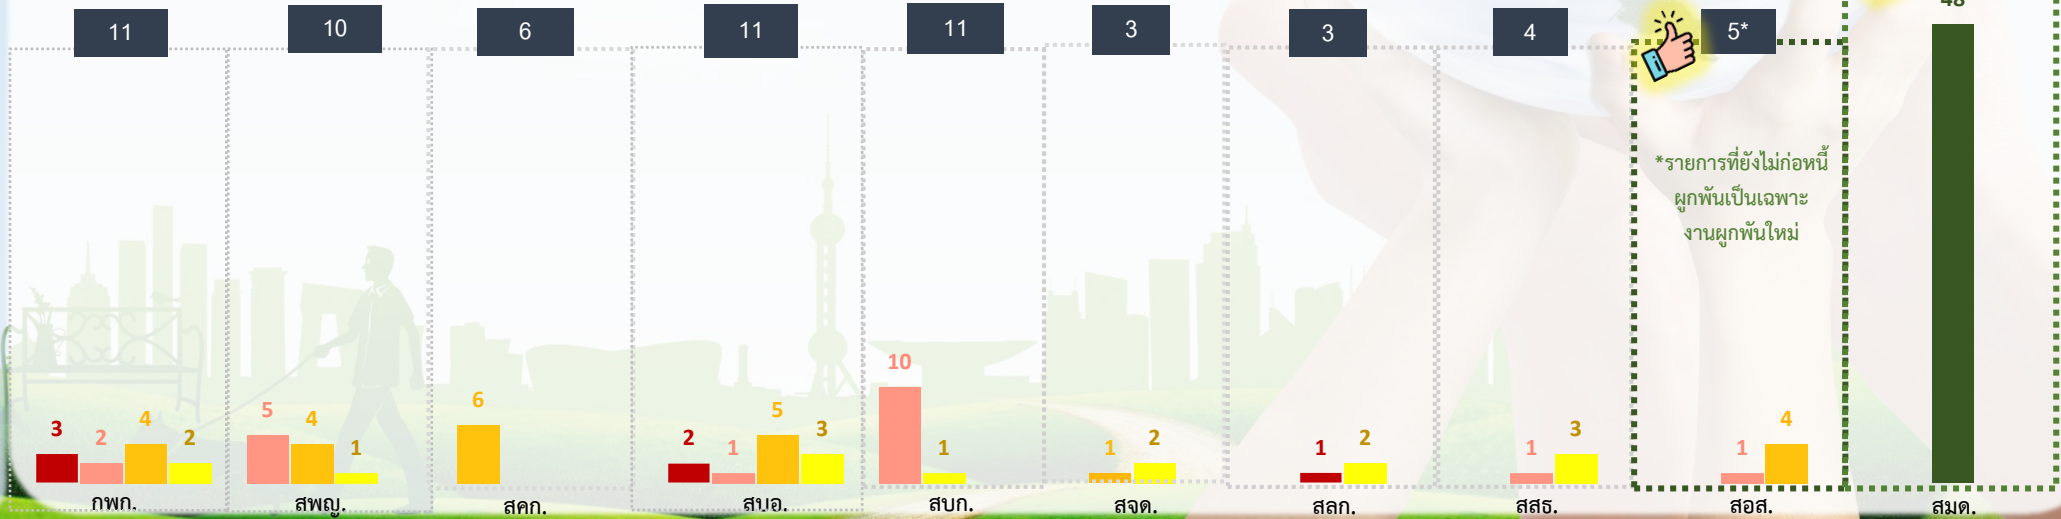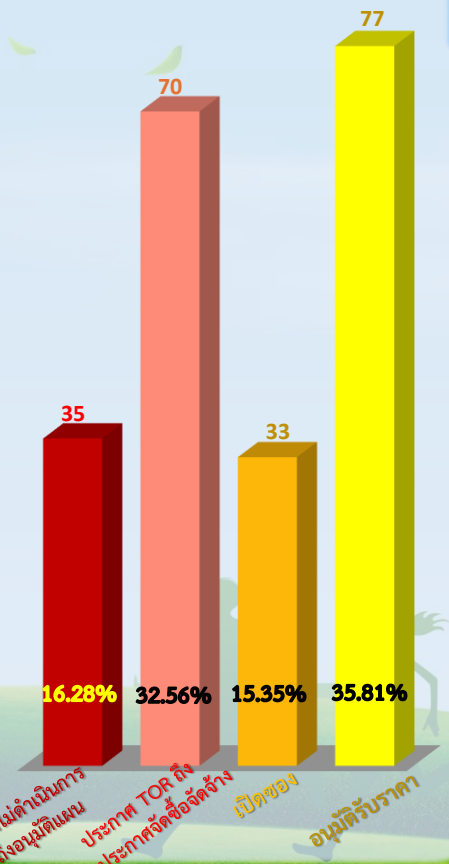

*รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันเป็นเฉพาะงานผูกพันใหม่

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

- ส่วนภูมิภาค

หน่วย : ล้านบาท

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 215 รายการ

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 215 รายการ

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	416	1,499.48							4	2.50	412	1,496.98
สขป. 2	403	1,292.27									403	1,292.27
สขป. 3	359	2,211.74			3	46.57			5	24.48	351	2,140.69
สขป. 4	532	1,567.27	1	2.66	4	227.91			1	4.00	526	1,332.70
สขป. 5	494	2,660.15									494	2,660.15
สขป. 6	500	2,834.39					1	50.00			499	2,784.39
สขป. 7	653	5,050.92			5	182.50					648	4,868.42
สขป. 8	623	3,419.84	4	80.75					1	3.70	618	3,335.39
สขป. 9	740	1,654.40	3	1.52	12	70.77	2	47.00	4	27.25	719	1,507.86

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 10	608	1,032.68	13	26.65	2	11.00	2	24.65	2	47.51	589	922.87
สขป. 11	576	1,570.76	4	24.04	5	194.90	1	26.40	3	2.54	563	1,322.88
สขป. 12	671	1,468.39			1	83.29	1	1.50	2	5.93	667	1,377.67
สขป. 13	611	1,321.28	3	313.77					1	20.00	607	987.51
สขป. 14	353	2,956.44			2	48.50			10	73.65	341	2,834.29
สขป. 15	500	1,215.76	1	15.00	9	36.15			13	87.80	477	1,076.81
สขป. 16	517	3,158.96			1	45.00			7	407.50	509	2,706.46
สขป. 17	263	1,075.67			6	65.15	2	4.53	10	67.73	245	938.26

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 20 ก.พ. 2566

